

**DOCUMENTO 02**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EMENDA PIX: 202341180001**

**PARLAMENTAR: MARCO BERTAIOLLI**

**PLANO DE AÇÃO: 09032023-038371 / 2023**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**EMENDA PIX: 202341180001**  
**PARLAMENTAR: MARCO BERTAIOLLI**  
**PLANO DE AÇÃO: 09032023-038371 / 2023**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PIX  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JÃO AURICCHIO  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
**CNPJ:** 46.643.482/0001-07  
**ENDEREÇO e CEP:** PRAÇA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, 180 - CENTRO, CEP: 12.250-000  
**RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO:** EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO  
**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 1.551.700,00

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>	
03/10/2023	RS 1.538.775,00
12/12/2023	RS 12.925,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>RS 32.521,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RS 1.584.221,68</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>RS 0,00</b>

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de R\$ 1.551.700,00 (um milhão quinhentos e cinquenta e um mil e setecentos reais), mais rendimentos financeiros no valor de R\$ 32.521,68 (trinta e dois mil quinhentos e vinte um reais e sessenta e oito centavos).

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
14/12/2023	NF: 486	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS 43.130,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>RS 43.130,72</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>RS 1.541.090,96</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>RS 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>RS 1.541.090,96</b>

Declaro, na qualidade de responsável pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)**


<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO / CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>
235/2023	26/10/2023	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DR. JOÃO AURICCHIO	TOMADA DE PREÇOS N: 08/2023	FEDERAL	R\$ 2.326.081,35

**LOCAL E DATA:** MONTEIRO LOBATO, 11 DE JUNHO DE 2025.

**RESPONSÁVEL:** EDMAR JOSÉ DE ARAUJO - PREFEITO MUNICIPAL

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>486</b>																									
		Data e Hora de Emissão <b>14/12/2023 13:36:08</b>																									
		Código de Verificação * <b>BHBC-5BQM</b>																									
		Série <b>NE</b>																									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																											
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>																											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																											
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>																											
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>																											
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>																											
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>																											
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>																											
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 14/12/2023, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>																											
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 1ª Medição Período: 10/11/2023 a 12/12/2023 Valor: R\$45.400,76  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">Valor do Serviço</th> <th style="width: 12.5%;">Deduções</th> <th style="width: 12.5%;">Desconto Incond.</th> <th style="width: 12.5%;">Base de Cálculo</th> <th style="width: 12.5%;">Alíquota (%)</th> <th style="width: 12.5%;">Valor do ISS (R\$)</th> <th style="width: 12.5%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 45.400,76</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 45.400,76</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">2.270,04</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		R\$ 45.400,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.400,76	5,00	2.270,04		Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																						
R\$ 45.400,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.400,76	5,00	2.270,04																						
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00																					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 45.400,76</b>																											
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 43.130,72</b>																											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																											
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO																											

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

  
~~LUZ BORDADO MEIRELES GOMES~~  
CREA-SP 5071119/01  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

14.12.23



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE OBRAS



**MEMORANDO 23173/2023**

**A/C: Secretaria de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

**Ref.: Pagamento da 1ª Medição – UPA**

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio deste o pagamento referente a nota fiscal em ANEXO, no valor de R\$45.400,76, referente a TOMADA DE PREÇO N° 008/2023.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 14 de dezembro de 2023.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 507119121  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Luiz Rodolfo Meirelles Gomes**  
**Secretário de Obras**



## ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



# PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**DATA:** 12/12/2023

**RELATÓRIO Nº:**  
01/2023

**CONTRATO:** 097/2023

**CONFERIDO:**

Fiscal do contrato

**AUTOR:**

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

**CREA:** SP-5062695430

DATA: 12/12/2023	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO</b>	FOLHA: 2 / 4
---------------------	--	--------------

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães,20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato - SP

## 2. FOTOS



Foto 1: Correção da placa de obra.

<b>Autor:</b>  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
---	---

DATA:  
12/12/2023

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3 / 4

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO

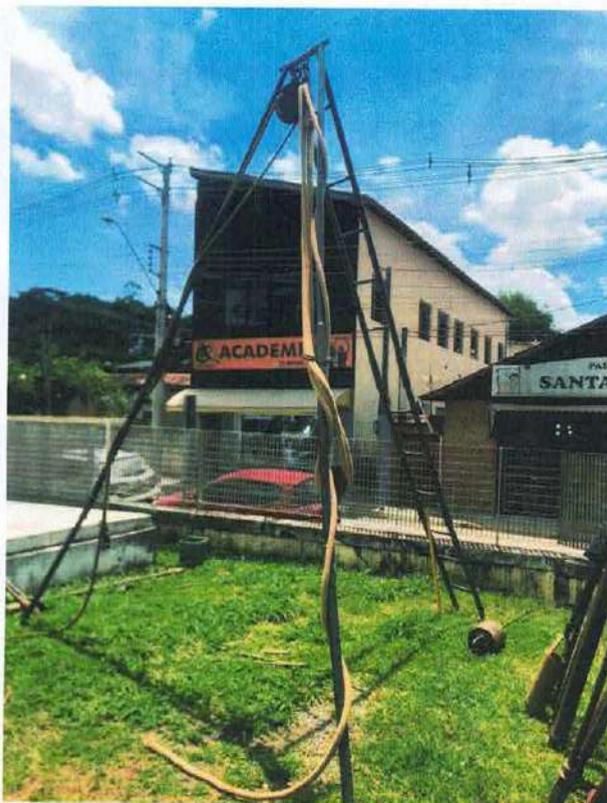


Foto 2.: Sondagem



Foto 3.: Perfuração da sondagem

Autor:

Luis Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
12/12/2023

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 4

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO



Foto 4.: Instalação de banheiro químico no canteiro de obra

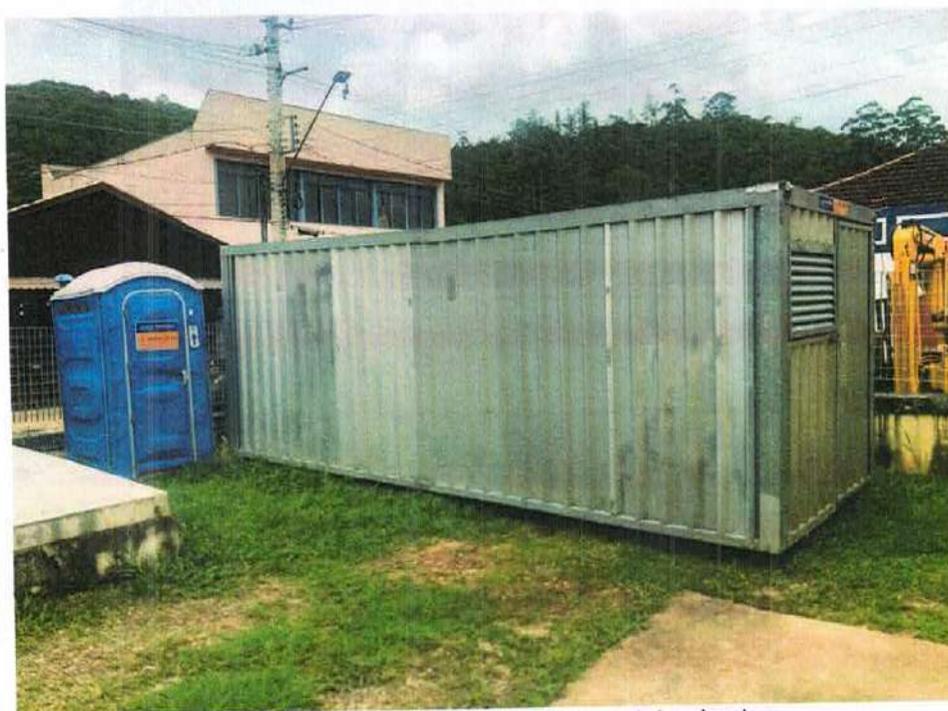


Foto 5. :Instalação de container no canteiro de obra.

Autor:

Luis Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



# ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO								1ª MEDIÇÃO - 28/11/2023			
BDI = 25%				DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA							
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
1	01	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO			S/ BDI	C/ BDI					
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTEÚOS E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15		-	0,00%	5.254,15
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72	0,50	3.355,36	50,00%	3.355,36
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36	3,00	7.930,68	50,00%	7.930,68
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70	5,00	9.693,85	50,00%	9.693,85
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84	6,00	4.993,92	50,00%	4.993,92
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38	3,00	2.772,69	50,00%	2.772,69
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68	1,00	1.177,68	100,00%	-
1.8	01.21.110	SONDAAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70	90,00	8.453,70	100,00%	-
							72.378,53		38.377,88		34.000,65
2	02	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA									
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82	1,00	783,98	11,11%	6.271,84
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10	1,00	1.153,90	11,11%	9.231,20
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65	-	-	0,00%	6.478,65
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80	-	-	0,00%	7.704,80
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46	-	-	0,00%	976,46
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00	6,00	5.085,00	100,00%	-
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20	-	-	0,00%	1.734,20



10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	m²	800,50	66,27	82,83	66.305,41	-	0,00%	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	m²	812,00	80,93	101,16	82.141,92	-	0,00%	82.141,92
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00	-	0,00%	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	0,00%	10.034,63
						171.490,96		-		-
<b>11</b>	<b>15</b>	<b>ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO</b>								
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27	-	0,00%	46.132,27
						46.132,27		-		-
<b>12</b>	<b>16</b>	<b>TELHAMENTO</b>								
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20	-	0,00%	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37	-	0,00%	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57	-	0,00%	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	-	0,00%	15.392,09
						66.411,23		-		-
<b>13</b>	<b>17</b>	<b>REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL</b>								
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	m²	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00	-	0,00%	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m²	18,40	508,35	635,43	11.691,91	-	0,00%	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	-	0,00%	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	-	0,00%	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38	-	0,00%	25.060,38
						122.001,29		-		-
<b>14</b>	<b>18</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO</b>								
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	-	0,00%	79.178,37
14.2	18.06.182	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	-	0,00%	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	-	0,00%	13.291,44

14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67	-	0,00%	64.441,67
							158.645,82			
15	19	<b>REVESTIMENTO EM PEDRA</b>								
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	146,10	118,12	147,65	21.571,66	-	0,00%	21.571,66
							21.571,66			
16	21	<b>REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO</b>								
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00	-	0,00%	34.167,00
16.2	21.10.061	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	-	0,00%	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	m	34,50	19,15	23,93	825,58	-	0,00%	825,58
							39.926,96			
17	22	<b>FORRO, BRISE E FACHADA</b>								
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	-	0,00%	61.870,06
							61.870,06			
18	23	<b>ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA</b>								
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	-	0,00%	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	-	0,00%	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	-	0,00%	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	-	0,00%	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	-	0,00%	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58	-	0,00%	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	-	0,00%	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80	-	0,00%	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40	-	0,00%	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	un	16,90	44,29	55,36	935,58	-	0,00%	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	m	16,90	8,82	8,52	143,98	-	0,00%	143,98
							82.326,65			
19	24	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO</b>								
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47	-	0,00%	26.314,47

19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95	-	0,00%	1.343,95	
							27.658,42				
<b>20</b>	<b>25</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO</b>									
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76	-	0,00%	34.238,76	
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69	-	0,00%	26.089,69	
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36	-	0,00%	2.814,36	
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68	-	0,00%	20.791,68	
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16	-	0,00%	12.536,16	
							96.470,65				
<b>21</b>	<b>26</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>									
21.	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	m²	1,50	420,84	526,05	789,07	-	0,00%	789,07	
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49	-	0,00%	1.985,49	
							2.774,56				
<b>22</b>	<b>27</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>									
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52	-	0,00%	19.658,52	
							19.658,52				
<b>23</b>	<b>28</b>	<b>FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>									
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32	-	0,00%	1.231,32	
							1.231,32				
<b>24</b>	<b>30</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>									
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62	-	0,00%	1.306,62	
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	un	7,00	95,90	119,87	839,09	-	0,00%	839,09	
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18	-	0,00%	2.203,18	
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91	-	0,00%	2.471,91	
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05	-	0,00%	2.170,05	
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62	-	0,00%	6.815,62	
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	2,00	170,78	213,47	426,94	-	0,00%	426,94	
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55	-	0,00%	4.789,55	
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40	-	0,00%	7.453,40	

24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85	-	0,00%	5.304,85
							<b>33.781,21</b>			
<b>25</b>	<b>32</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA</b>								
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01	-	0,00%	9.013,01
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46	-	0,00%	2.012,46
							<b>11.025,47</b>			
<b>26</b>	<b>33</b>	<b>PINTURA</b>								
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47	-	0,00%	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63	-	0,00%	54.458,63
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09	-	0,00%	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21	-	0,00%	2.624,21
							<b>106.390,40</b>			
<b>27</b>	<b>34</b>	<b>PAISAGISMO E FECHAMENTOS</b>								
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	m³	4,55	149,63	187,03	850,98	-	0,00%	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	m²	42,26	1,31	1,63	68,88	-	0,00%	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	68,70	10,88	13,60	934,32	-	0,00%	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32	-	0,00%	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	un	15,00	28,53	36,91	553,65	-	0,00%	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	un	2,00	29,95	37,43	74,86	-	0,00%	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	un	2,00	89,11	111,38	222,76	-	0,00%	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	un	13,00	41,88	52,35	680,55	-	0,00%	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60	-	0,00%	26.613,60
							<b>31.353,92</b>			
<b>28</b>	<b>37</b>	<b>QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>								
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	un	1,00	500,24	625,30	625,30	-	0,00%	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68	-	0,00%	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50	-	0,00%	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92	-	0,00%	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64	-	0,00%	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60	-	0,00%	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10	-	0,00%	1.112,10

28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84	-	0,00%	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60	-	0,00%	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20	-	0,00%	2.800,20
							<b>32.083,38</b>			
<b>29</b>	<b>38</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA</b>								
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60	-	0,00%	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40	-	0,00%	3.209,40
							<b>18.566,00</b>			
<b>30</b>	<b>38</b>	<b>CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>								
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	-	0,00%	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60	-	0,00%	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	-	0,00%	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	-	0,00%	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	m	10,00	28,39	35,48	354,80	-	0,00%	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	-	0,00%	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20	-	0,00%	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	-	0,00%	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00	-	0,00%	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	-	0,00%	9.095,40
							<b>50.884,50</b>			
<b>31</b>	<b>40</b>	<b>DISTRIBUICAO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>								
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90	-	0,00%	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	cj	6,00	22,60	28,25	169,50	-	0,00%	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30	-	0,00%	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	20,00	21,59	26,98	539,60	-	0,00%	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	cj	6,00	28,12	35,15	210,90	-	0,00%	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58	-	0,00%	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	cj	4,00	25,45	31,81	127,24	-	0,00%	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82	-	0,00%	1.615,82
							<b>6.837,84</b>			
<b>32</b>	<b>41</b>	<b>ILUMINACAO</b>								
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	-	0,00%	1.521,69

32.2	41.10.430	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98	-	0,00%	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LMW - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04	-	0,00%	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	-	0,00%	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	-	0,00%	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60	-	0,00%	16.053,60
					52.126,72			-		-
<b>33</b>	<b>43</b>	<b>APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.</b>								
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60	-	0,00%	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	un	2,00	182,07	227,58	455,16	-	0,00%	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	un	1,00	359,17	448,96	448,96	-	0,00%	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43	-	0,00%	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	-	0,00%	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92	-	0,00%	40.780,92
					80.125,17			-		-
<b>34</b>	<b>44</b>	<b>APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS</b>								
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85	-	0,00%	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	-	0,00%	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	un	6,00	99,71	124,63	747,78	-	0,00%	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25	-	0,00%	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80	-	0,00%	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un	10,00	69,91	87,38	873,80	-	0,00%	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16	-	0,00%	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	0,00%	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	-	0,00%	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	0,00%	1.874,21

34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	-	0,00%	1.512,60
							23.594,07			-
<b>35</b>	<b>46</b>	<b>TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.</b>								
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180,00	22,26	27,82	5.007,80	-	0,00%	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	-	0,00%	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	26,52	33,15	397,80	-	0,00%	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	-	0,00%	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	-	0,00%	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	88,85	111,06	666,36	-	0,00%	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4', INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	-	0,00%	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00	-	0,00%	8.484,00
							37.030,14			-
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>								
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2'	un	4,00	106,87	133,58	534,32	-	0,00%	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2'	un	4,00	190,80	238,50	954,00	-	0,00%	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	-	0,00%	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	un	6,00	76,81	95,76	574,56	-	0,00%	574,56
							3.665,44			-
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>								
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	-	0,00%	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1'	un	3,00	95,12	118,90	356,70	-	0,00%	356,70
							9.706,26			-
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>								
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16	-	0,00%	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20	-	0,00%	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	un	2,00	354,29	442,86	885,72	-	0,00%	885,72

38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4'	un	10,00	12,94	16,17	161,70
						9.458,78	
<b>39</b>	<b>54</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>					
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98
39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ.E EM AREIA	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
						84.402,89	
<b>TOTAL</b>				<b>2.326.081,38</b>			

	-	0,00%	161,70
	-		-
	-	0,00%	1.967,35
	-	0,00%	16.746,49
	-	0,00%	12.355,98
	-	0,00%	53.333,07
	-		-

<b>TOTAL GERAL 1ª MEDIÇÃO</b>	<b>45.400,76</b>
<b>% MEDIDO</b>	<b>1,95%</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>45.400,76</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>	<b>2.280.680,62</b>

Monteiro Lobato, 12 de dezembro de 2023

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4442 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 327 DATA: 14/12/2023 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA 230852/23 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 18/12/2023

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 14.563.488/0001-70 CÓDIGO: 10786  
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES GUARATINGUETA

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido <b>43.130,72</b> Desconto <b>2.270,04</b>
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00 Recursos Ordinarios		
800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND		
000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên		

GL **SOMA** **45.400,76**


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
283.577,96	45.400,76	45.400,76	238.177,20

**VALOR A SER PAGO R\$** **45.400,76**  
 quarenta e cinco mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN-PRINCIPAL	2.270,04	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>2.270,04</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/12/2023 

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA \_\_\_\_\_ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM \_\_\_\_\_ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA \_\_\_\_\_ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora DATA \_\_\_\_\_ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06791

DATA: 19/12/2023 **VENCI 18/12/2023** PAGTO: 19/12/2023

Credor..: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 1078

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade..: GUARATINGUETA

CEP:

**Discriminação..:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **45.400,76**

(quarenta e cinco mil e quatrocentos reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 45.400,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4442	/ 1	GL 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 45.400,76	RR\$ 0,00	RR\$ 2.270,04	RR\$ 43.130,72
TOTAL . . . . .					RR\$ 45.400,76	RR\$ 0,00	RR\$ 2.270,04	RR\$ 43.130,72

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 43.130,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 43.130,72
TOTAL. . . . .			RR\$ 43.130,72

Despesa paga em 19/12/2023 Com os recursos acima discriminados

  
AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.22  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1  
=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA  
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT  
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70  
VALOR: R\$ 43.130,72  
DEBITO EM: 19/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EDC.0F5.BDA.185.101

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:34:54

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023	03/10/2023	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.137.659.000.000	1.538.775,00 C	
03/10/2023	03/10/2023	0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	1.538.775,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:37:01

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2023	APLICAÇÃO	1.538.775,00			1.284.984,125486	1,197505066	1.284.984,125486
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.549.624,03			1.284.984,125486		1.284.984,125486

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.538.775,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.849,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.849,03
SALDO ATUAL =	1.549.624,03

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:35:00

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:37:11

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.549.624,03			1.284.984,125486		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.560.639,05			1.284.984,125486		1.284.984,125486

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.549.624,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.015,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.015,02
SALDO ATUAL =	1.560.639,05

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:35:05

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023	12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.865.145.000.000	12.925,00 C	
12/12/2023	12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.925,00 D	0,00 C
19/12/2023	19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	43.130,72 D	
19/12/2023	19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.130,72 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:37:22

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.560.639,05				1.284.984,125486		
12/12/2023	APLICAÇÃO	12.925,00				10.612,348485	1,217920804	1.295.596,473971
19/12/2023	RESGATE	43.130,72				35.353,019449	1,220001026	1.260.243,454522
	Aplicação 03/10/2023	43.130,72				35.353,019449		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.541.090,96				1.260.243,454522		1.260.243,454522

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.560.639,05
APLICAÇÕES (+)	12.925,00
RESGATES (-)	43.130,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.657,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.657,63
SALDO ATUAL =	1.541.090,96

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**EMENDA PIX: 202341180001**  
**PARLAMENTAR: MARCO BERTAIOLLI**  
**PLANO DE AÇÃO: 09032023-038371 / 2023**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PIX

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JÃO AURICCHIO

**EXERCÍCIO:** 2024

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

**CNPJ:** 46.643.482/0001-07

**ENDEREÇO e CEP:** PRAÇA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, 180 - CENTRO, CEP: 12.250-000

**RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO:** EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 0,00

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>RS 1.541.090,96</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>	
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>RS 96.733,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RS 1.637.824,13</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>RS 0,00</b>

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de R\$0,00, mais saldo do exercicio anterior no valor de R\$ 1.541.090,96 (um milhão quinhentos e quarenta e um mil, noventa reais e noventa e seis centavos), mais rendimentos financeiros no valor de R\$ 96.733,17 (noventa e seis mil setecentos e trinta e três reais e dezessete centavos).

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
06/02/2024	NF: 499	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS 35.938,53
15/03/2024	NF: 508	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS 3.875,76
17/04/2024	NF: 517	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS 17.826,84
14/05/2024	NF: 528	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS 172.562,96
06/06/2024	NF: 536	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS 7.973,11
06/06/2024	NF: 535	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS 48.127,05

05/07/2024	NF: 540	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 91.029,59
08/08/2024	NF: 550	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 87.518,74
12/09/2024	NF: 559	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 154.343,51
24/10/2024	NF: 566	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 84.786,14
21/11/2024	NF: 569	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 185.956,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 889.938,50</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>R\$ 747.885,63</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>R\$ 747.885,63</b>

Declaro, na qualidade de responsável pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)**

<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO / CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>
235/2023	26/10/2023	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DR. JOÃO AURICCHIO	TOMADA DE PREÇOS N: 08/2023	FEDERAL	R\$ 2.326.081,35

**LOCAL E DATA:** MONTEIRO LOBATO, 11 DE JUNHO DE 2025.

**RESPONSÁVEL:** EDMAR JOSÉ DE ARAUJO - PREFEITO MUNICIPAL

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota		499		
			Data e Hora de Emissão		06/02/2024 11:18:47		
			Código de Verificação *		9382-AKEM		
			Série		NE		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA   - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>							
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>							
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>							
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>							
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>							
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/02/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>							
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 2ª Medição Período: 02/01/2024 a 31/01/2024 Valor: R\$35.938,53  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1							
Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
R\$ 35.938,53		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.938,53	5,00	1.796,93	
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.938,53</b>							
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 34.141,60</b>							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
<b>- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b>							

\*A autenticidade desta Nota Fiscal dev erá ser confirmada no site da Prefeitura.

  
LUIZ RODOLFO MERELES GOMES  
CREA-SP 507/119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

16.02.24



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**



**MEMORANDO 24025/2024**

**A/C: Setor de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

Ref. Pagamento da 2ª Medição do Contrato nº230852/2023

Prezada,

A Secretaria de Obras, vem por meio deste o pagamento referente a nota fiscal em ANEXO, no valor de R\$35.938,53 de acordo com o Contrato nº 230852/2023

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 15 de fevereiro de 2024

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Secretário de Obras**  
**LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES**  
Engenheiro Civil – CREA-SP 5071119131



**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI**

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UP-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP						
	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
				S/ BDI		C/ BDI	
<b>1</b>							
<b>01</b>							
<b>SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO</b>							
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTEÚDOS E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²		un	1,00	4.203,32	5.254,15
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA		un	1,00	5.368,58	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1		un	6,00	2.114,85	2.843,55
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1		un	10,00	1.551,02	1.938,77
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1		un	12,00	665,86	832,32
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1		un	6,00	739,39	924,23
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM		tx	1,00	942,15	1.177,68
1.8	01.21.110	SONDAAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)		m	90,00	75,15	93,93
						<b>72.378,53</b>	
<b>2</b>							
<b>02</b>							
<b>INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA</b>							
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB		un.mês	9,00	627,19	783,98
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²		un.mês	9,00	923,12	1.153,90
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²		un.mês	9,00	575,88	719,85
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO		m²	80,00	77,05	96,31
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO		m.mês	40,50	19,29	24,11
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA		m²	6,00	678,00	847,50
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM		m²	260,00	5,34	6,57
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO		m²	428,00	12,06	15,07
						<b>45.889,99</b>	
<b>3</b>							
<b>06</b>							
<b>SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>							
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1"2" CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M		m³	10,00	39,47	49,33
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL AFILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO		m³	10,00	12,27	15,33
						<b>646,60</b>	
<b>4</b>							
<b>08</b>							
<b>ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM</b>							
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO		m².mês	1.568,00	5,86	7,32
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO		m²	783,00	10,01	12,51
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA		m²	16,20	102,53	128,16
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÉXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KNM E TRANSVERSAL DE 9KNM		m²	81,00	12,93	16,16

1ª MEDIÇÃO - 28/11/2023			
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
	-	0,00%	5.254,15
0,50	3.355,36	50,00%	3.355,36
3,00	7.930,68	50,00%	7.930,68
5,00	9.693,85	50,00%	9.693,85
6,00	4.993,92	50,00%	4.993,92
3,00	2.772,69	50,00%	2.772,69
1,00	1.177,68	100,00%	-
90,00	8.453,70	100,00%	-
	<b>38.377,88</b>		<b>34.000,65</b>
<b>2ª MEDIÇÃO - 31/01/2024</b>			
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
1,00	5.254,15	100,00%	-
0,50	3.355,36	50,00%	-
3,00	7.930,68	50,00%	-
5,00	9.693,85	50,00%	-
6,00	4.993,92	50,00%	-
3,00	2.772,69	50,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	<b>34.000,65</b>		<b>-</b>

*[Handwritten signature and initials]*

4.5	08.06.040	BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	m	10,00	21,02	26,27	282,70	-	0,00%	262,70	-	0,00%	262,70
								24.906,30	-	24.906,30	-	-	24.906,30
<b>5</b>	<b>09</b>	<b>FORMA</b>											
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	480,74	141,41	178,76	84.975,60	-	0,00%	84.975,60	-	0,00%	84.975,60
								84.975,60	-	84.975,60	-	-	84.975,60
<b>6</b>	<b>10</b>	<b>ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL</b>											
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08	-	0,00%	161.326,08	-	0,00%	161.326,08
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47	-	0,00%	28.553,47	-	0,00%	28.553,47
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28	-	0,00%	75.641,28	-	0,00%	75.641,28
								266.520,83	-	266.520,83	-	-	266.520,83
<b>7</b>	<b>11</b>	<b>CONCRETO, MASSA E LASTRO</b>											
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBAMENTO	m³	62,70	374,13	467,68	29.322,28	-	0,00%	29.322,28	-	0,00%	29.322,28
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBAMENTO	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73	-	0,00%	67.130,73	-	0,00%	67.130,73
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB	m²	200,94	80,77	100,96	20.286,90	-	0,00%	20.286,90	-	0,00%	20.286,90
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m²	39,19	125,27	156,58	6.136,37	-	0,00%	6.136,37	-	0,00%	6.136,37
								122.876,28	-	122.876,28	-	-	122.876,28
<b>8</b>	<b>12</b>	<b>FUNDAÇÃO PROFUNDA</b>											
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38	-	0,00%	1.894,38	-	0,00%	1.894,38
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50	-	0,00%	30.388,50	-	0,00%	30.388,50
								32.282,88	-	32.282,88	-	-	32.282,88
<b>9</b>	<b>13</b>	<b>LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS</b>											
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77	-	0,00%	67.836,77	-	0,00%	67.836,77
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04	-	0,00%	99.585,04	-	0,00%	99.585,04
								167.421,81	-	-	-	-	167.421,81
<b>10</b>	<b>14</b>	<b>ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR</b>											
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	m³	800,50	66,27	82,83	66.305,41	-	0,00%	66.305,41	-	0,00%	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	m³	812,00	80,93	101,16	82.141,92	-	0,00%	82.141,92	-	0,00%	82.141,92
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA, PARA VÃO DE PORTA	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00	-	0,00%	13.009,00	-	0,00%	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	0,00%	10.034,63	-	0,00%	10.034,63
								171.490,96	-	-	-	-	171.490,96
<b>11</b>	<b>15</b>	<b>ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO</b>											
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	m²	355,52	103,81	129,75	46.132,27	-	0,00%	46.132,27	-	0,00%	46.132,27
								46.132,27	-	-	-	-	46.132,27
<b>12</b>	<b>16</b>	<b>TELHAMENTO</b>											
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20	-	0,00%	26.942,20	-	0,00%	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37	-	0,00%	12.842,37	-	0,00%	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57	-	0,00%	11.234,57	-	0,00%	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M.	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	-	0,00%	15.392,09	-	0,00%	15.392,09
								66.411,23	-	-	-	-	66.411,23
<b>13</b>	<b>17</b>	<b>REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL</b>											
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	m²	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00	-	0,00%	2.947,00	-	0,00%	2.947,00

13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m²	18.40	508,35	835,43	11.691,91	-	0,00%	11.691,91	-	0,00%	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	-	0,00%	19.737,00	-	0,00%	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	-	0,00%	62.565,00	-	0,00%	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCCO	m²	2.288,82	8,78	10,95	25.060,38	-	0,00%	25.060,38	-	0,00%	25.060,38
				<b>122.001,29</b>				-	-	-	-	-	122.001,29
<b>14</b>	<b>18</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>											
14.1	18.05.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	-	0,00%	79.178,37	-	0,00%	79.178,37
14.2	18.05.182	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	-	0,00%	1.734,34	-	0,00%	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	-	0,00%	13.291,44	-	0,00%	13.291,44
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	936,38	55,06	68,92	64.441,67	-	0,00%	64.441,67	-	0,00%	64.441,67
				<b>158.645,82</b>				-	-	-	-	-	158.645,82
<b>15</b>	<b>19</b>	<b>REVESTIMENTO EM PEDRA</b>											
15.1	19.01.052	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	146,10	118,12	147,85	21.571,66	-	0,00%	21.571,66	-	0,00%	21.571,66
				<b>21.571,66</b>				-	-	-	-	-	21.571,66
<b>16</b>	<b>21</b>	<b>REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO</b>											
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00	-	0,00%	34.167,00	-	0,00%	34.167,00
16.2	21.10.051	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	-	0,00%	4.934,38	-	0,00%	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	m	34,50	19,15	23,93	825,58	-	0,00%	825,58	-	0,00%	825,58
				<b>39.926,96</b>				-	-	-	-	-	39.926,96
<b>17</b>	<b>22</b>	<b>FORRO, BRISE E FACHADA</b>											
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	-	0,00%	61.870,06	-	0,00%	61.870,06
				<b>61.870,06</b>				-	-	-	-	-	61.870,06
<b>18</b>	<b>23</b>	<b>ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA</b>											
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	-	0,00%	9.271,38	-	0,00%	9.271,38
18.2	23.04.500	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	-	0,00%	10.400,46	-	0,00%	10.400,46
18.3	23.04.510	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	-	0,00%	29.745,07	-	0,00%	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	-	0,00%	5.016,90	-	0,00%	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	-	0,00%	150,50	-	0,00%	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	m²	3,78	390,50	488,25	1.845,58	-	0,00%	1.845,58	-	0,00%	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	-	0,00%	3.714,00	-	0,00%	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80	-	0,00%	5.803,80	-	0,00%	5.803,80

18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40	-	0,00%	15.299,40	-	0,00%	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	un	16,90	44,29	55,36	935,58	-	0,00%	935,58	-	0,00%	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	m	16,90	6,82	8,52	143,98	-	0,00%	143,98	-	0,00%	143,98
							<b>82.326,85</b>						82.326,65
<b>19</b>	<b>24</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO</b>											
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47	-	0,00%	26.314,47	-	0,00%	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95	-	0,00%	1.343,95	-	0,00%	1.343,95
							<b>27.658,42</b>						27.658,42
<b>20</b>	<b>26</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO</b>											
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76	-	0,00%	34.238,76	-	0,00%	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69	-	0,00%	26.089,69	-	0,00%	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36	-	0,00%	2.814,36	-	0,00%	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68	-	0,00%	20.791,68	-	0,00%	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16	-	0,00%	12.536,16	-	0,00%	12.536,16
							<b>96.470,85</b>						96.470,65
<b>21</b>	<b>26</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>											
21.	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	m²	1,50	420,84	526,05	789,07	-	0,00%	789,07	-	0,00%	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49	-	0,00%	1.985,49	-	0,00%	1.985,49
							<b>2.774,56</b>						2.774,56
<b>22</b>	<b>27</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>											
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	m	126,00	124,82	158,02	19.658,52	-	0,00%	19.658,52	-	0,00%	19.658,52
							<b>19.658,52</b>						19.658,52
<b>23</b>	<b>28</b>	<b>FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>											
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32	-	0,00%	1.231,32	-	0,00%	1.231,32
							<b>1.231,32</b>						1.231,32
<b>24</b>	<b>30</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>											
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62	-	0,00%	1.306,62	-	0,00%	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	un	7,00	95,90	119,87	839,09	-	0,00%	839,09	-	0,00%	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18	-	0,00%	2.203,18	-	0,00%	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91	-	0,00%	2.471,91	-	0,00%	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05	-	0,00%	2.170,05	-	0,00%	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62	-	0,00%	6.815,62	-	0,00%	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	2,00	170,78	213,47	426,94	-	0,00%	426,94	-	0,00%	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55	-	0,00%	4.789,55	-	0,00%	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40	-	0,00%	7.453,40	-	0,00%	7.453,40
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85	-	0,00%	5.304,85	-	0,00%	5.304,85
							<b>33.781,21</b>						33.781,21
<b>25</b>	<b>32</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA</b>											
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01	-	0,00%	9.013,01	-	0,00%	9.013,01



30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	m	10,00	28,39	35,48	354,80	-	0,00%	354,80	-	0,00%	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	-	0,00%	1.532,00	-	0,00%	1.532,00
30.7	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX, DE 16 MM², ISOL 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20	-	0,00%	4.219,20	-	0,00%	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX, DE 25 MM², ISOL 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	-	0,00%	3.787,50	-	0,00%	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX, DE 35 MM², ISOL 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00	-	0,00%	4.452,00	-	0,00%	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX, DE 50 MM², ISOL 0,8/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	-	0,00%	9.095,40	-	0,00%	9.095,40
							<b>50.884,50</b>						<b>50.884,50</b>
<b>31</b>	<b>40</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>											
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	un	6,00	135,72	199,65	1.017,90	-	0,00%	1.017,90	-	0,00%	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	cj	6,00	22,60	28,25	169,50	-	0,00%	169,50	-	0,00%	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30	-	0,00%	2.058,30	-	0,00%	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	20,00	21,59	26,98	539,60	-	0,00%	539,60	-	0,00%	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	cj	6,00	28,12	35,15	210,90	-	0,00%	210,90	-	0,00%	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58	-	0,00%	1.098,58	-	0,00%	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	cj	4,00	25,45	31,81	127,24	-	0,00%	127,24	-	0,00%	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82	-	0,00%	1.615,82	-	0,00%	1.615,82
							<b>6.837,84</b>						<b>6.837,84</b>
<b>32</b>	<b>41</b>	<b>ILUMINACAO</b>											
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	-	0,00%	1.521,69	-	0,00%	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98	-	0,00%	4.834,98	-	0,00%	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	un	8,00	1.062,71	1.385,88	10.927,04	-	0,00%	10.927,04	-	0,00%	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	-	0,00%	7.874,05	-	0,00%	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	-	0,00%	10.915,36	-	0,00%	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. O., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60	-	0,00%	16.053,60	-	0,00%	16.053,60
							<b>52.128,72</b>						<b>52.128,72</b>
<b>33</b>	<b>43</b>	<b>APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.</b>											
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60	-	0,00%	2.265,60	-	0,00%	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	un	2,00	182,07	227,58	455,16	-	0,00%	455,16	-	0,00%	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190MP/H	un	1,00	359,17	448,96	448,96	-	0,00%	448,96	-	0,00%	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43	-	0,00%	23.096,43	-	0,00%	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	-	0,00%	13.078,10	-	0,00%	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92	-	0,00%	40.780,92	-	0,00%	40.780,92
							<b>80.125,17</b>						<b>80.125,17</b>
<b>34</b>	<b>44</b>	<b>APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS</b>											
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85	-	0,00%	1.373,85	-	0,00%	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	-	0,00%	2.164,08	-	0,00%	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	un	6,00	99,71	124,83	747,78	-	0,00%	747,78	-	0,00%	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25	-	0,00%	2.273,25	-	0,00%	2.273,25

34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTOA, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80	-	0,00%	10.278,80	-	0,00%	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un	10,00	69,91	87,38	873,80	-	0,00%	873,80	-	0,00%	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	16,00	56,21	70,25	1.124,16	-	0,00%	1.124,16	-	0,00%	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	0,00%	172,92	-	0,00%	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	-	0,00%	1.198,62	-	0,00%	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	0,00%	1.874,21	-	0,00%	1.874,21
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	-	0,00%	1.512,60	-	0,00%	1.512,60
						<b>23.594,07</b>							<b>23.594,07</b>
<b>35</b>	<b>46</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.</b>											
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180,00	22,28	27,82	5.007,60	-	0,00%	5.007,60	-	0,00%	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	-	0,00%	7.522,50	-	0,00%	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	26,52	33,15	397,80	-	0,00%	397,80	-	0,00%	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	-	0,00%	2.551,80	-	0,00%	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	-	0,00%	7.933,20	-	0,00%	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	88,85	111,06	666,36	-	0,00%	666,36	-	0,00%	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	-	0,00%	4.466,88	-	0,00%	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00	-	0,00%	8.484,00	-	0,00%	8.484,00
						<b>37.030,14</b>							<b>37.030,14</b>
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>											
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	un	4,00	106,87	133,58	534,32	-	0,00%	534,32	-	0,00%	534,32
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	un	4,00	190,80	238,50	954,00	-	0,00%	954,00	-	0,00%	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	-	0,00%	1.602,56	-	0,00%	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	6,00	76,61	95,76	574,56	-	0,00%	574,56	-	0,00%	574,56
						<b>3.665,44</b>							<b>3.665,44</b>
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>											
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	-	0,00%	9.349,56	-	0,00%	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	un	3,00	95,12	118,90	356,70	-	0,00%	356,70	-	0,00%	356,70
						<b>9.706,26</b>							<b>9.706,26</b>
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>											
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	un	25,00	82,53	103,16	2.682,16	-	0,00%	2.682,16	-	0,00%	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20	-	0,00%	5.729,20	-	0,00%	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	un	2,00	354,29	442,86	885,72	-	0,00%	885,72	-	0,00%	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	un	10,00	12,94	16,17	161,70	-	0,00%	161,70	-	0,00%	161,70

							9.458,78	
39	54	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO						
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35	
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49	
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98	
39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07	
							84.402,89	
<b>TOTAL</b>							<b>2.326.081,38</b>	

-	-	-	-
-	0,00%	1.967,35	
-	0,00%	16.746,49	
-	0,00%	12.355,98	
-	0,00%	53.333,07	
-	-	-	

-	-	-	9.458,78
-	0,00%	1.967,35	
-	0,00%	16.746,49	
-	0,00%	12.355,98	
-	0,00%	53.333,07	
-	-	-	84.402,89

TOTAL GERAL 1ª MEDIÇÃO 45.400,76

TOTAL GERAL 2ª MEDIÇÃO 35.938,53

% MEDIDO 1,95%

% MEDIDO 1,55%

ACUMULADO 45.400,76


ACUMULADO 81.339,29

SALDO REMANESCENTE 2.280.680,62

SALDO REMANESCENTE 2.199.341,33

Monteiro Lobato, 31 de janeiro de 2024

  
 Luis Gustavo de Barros  
 Responsável Técnico  
 CREA 5062695430





ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE  
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP



PREFEITURA DE  
**MONTEIRO  
LOBATO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**DATA:** 31/01/2024

**RELATÓRIO Nº:**  
01/2023

**CONFERIDO:**

Fiscal do contrato

**AUTOR:**

**CONTRATO:** 097/2023

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

DATA: 31/01/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL  RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO	FOLHA: 2 / 3
---------------------	--	--------------

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães,20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1.: Instalação de banheiro químico no canteiro de obra

<b>Autor:</b>  Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
---	---

DATA: 31/01/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2ª MEDIÇÃO</b>	FOLHA: 3 / 3
---------------------	--	--------------



Foto 2. :Instalação de container no canteiro de obra.

Todos os projetos foram encaminhados via e-mail para análise e aprovação.

<b>Autor:</b>  <b>Luis Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
--	---



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	31/01/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	APROVAÇÃO DE PROJETO			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

ENGENHEIRO  
Luís Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CREA: 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL  
LUIZ RODRIGO MEIRELES GOMES  
CREA-SP 50711/9134  
SEC. MUNIC. DE OBRAS



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 30/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CREA: E062895400


\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	29/01/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	APROVAÇÃO DE PROJETO			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO**  
Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
C.R.C.A. 2262309400

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO FISCAL**



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 26/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO**  
Guilherme Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CREA: 206200/100

\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO FISCAL**



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 25/01/2024

**CONDIÇÕES CLIMÁTICAS**

<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CREA 0082054400

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 24/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO  
Luís Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CRB 1.80220/9170

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 23/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**


1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 2.132.636/DF

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL





### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	22/01/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO**  
Luís Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CREA: 206250/1-0

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO FISCAL**



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 19/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CND 10102261100

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 18/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

Luís Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CR. 12.345.678/90

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 17/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CRM 000260470

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	16/01/2024		
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo	
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo	
<b>Observações:</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>			
1	APROVAÇÃO DE PROJETO		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
<b>Observações:</b>			

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

Luís Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CRB 0102205130

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 15/01/2024


<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO**  
Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro CIVIL  
CREA: 036284-9/33

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO FISCAL**



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 12/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO**  
Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 000000000000

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO FISCAL**



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	11/01/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	APROVAÇÃO DE PROJETO			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

ENGENHEIRO  
Luís Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CRB 0000000000

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 10/01/2024

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**


  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

Luís Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 000000000

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 09/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 000000-1/00

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 08/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO**  
Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 123456789

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO FISCAL**



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 06/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO**  
Julia Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 0000000000

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO FISCAL**



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 05/01/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

ENGENHEIRO

Luís Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CRE 120098/DF

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 04/01/2024

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO**  
Luís Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CREA nº 120001-0/0000-00

  
\_\_\_\_\_  
**ENGENHEIRO FISCAL**



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	03/01/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	APROVAÇÃO DE PROJETO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**


\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

*Luís Gustavo de Barros*  
Engenheiro Civil  
C.R.C. 0158894/20

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**  
**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:39 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **0172.C993.7901.002F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24011041711-74  
Data e hora da emissão 26/01/2024 15:06:13  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 53373962

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 26/01/2024 15:09:00

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

**CNPJ:** 14.563.488/0001-70

**CERTIDÃO EMITIDA** em 26/01/2024, às 16:02:09

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**Data do processamento dos dados:** 22/01/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **s0rOFmbzZdhqYj0**.



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 6162392/2024

Expedição: 26/01/2024, às 15:43:13

Validade: 24/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



1 8 4 8 8 5 1 4 1 4 m V h S p A V H

## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

### Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Abrangência: Jurisdição de São Paulo - Capital


Certidão nº 60361 / 2024

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 25/01/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da



1 8 4 8 8 5 1 4 1 4 m V h S p A V H

Certidão;

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 8043526**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 25/01/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ADM FABRICAÇÃO**, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de janeiro de 2024.

**PEDIDO Nº: 0072549873**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/0000060092

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão **emitida em**: 26/01/2024, às 15:45:40 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **C6AA71EC2CCC5414**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.563.488/0001-70  
**Razão Social:** A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI  
**Endereço:** ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/01/2024 a 25/02/2024

**Certificação Número:** 2024012701092960637622

Informação obtida em 02/02/2024 15:59:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/00000600142

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão **emitida em:** 26/01/2024, às 15:47:02 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **B03BE93CF53EB99C**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Serviço de Dívida Ativa  
Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 1228/2023  
Processo nº 136213/2023

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

**CERTIFICA-SE** ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

# Assinatura Digital

O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/08/2001.



**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00861

DATA: 19/02/2024 VENCI 19/02/2024 PAGTO: 19/02/2024

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786  
Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES  
Cidade...: GUARATINGUETA CEP:

**Discriminação...:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **35.938,53**

(trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 35.938,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4442	/ 1	EX 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 35.938,53	RR\$ 0,00	RR\$ 1.796,93	RR\$ 34.141,60
TOTAL . . . . .					RR\$ 35.938,53	RR\$ 0,00	RR\$ 1.796,93	RR\$ 34.141,60

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 34.141,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 34.141,60
TOTAL. . .			RR\$ 34.141,60

Despesa paga em 19/02/2024 Com os recursos acima discriminados

AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4442 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 8002	DATA: 16/02/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/02/2024
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido <b>34.141,60</b> Desconto <b>1.796,93</b>
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00 Recursos Ordinários		
800 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL. IND		
000 TRANSF. UNIÃO DEC. EMENDA PARL. IND-Convên		
<b>EX</b>	<b>SOMA</b>	<b>35.938,53</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
238.177,20	35.938,53	35.938,53	202.238,67

VALOR A SER PAGO R\$

**35.938,53**

trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

8	1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.796,93
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>			<b>1.796,93</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/02/2024

*flaurença*

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

DATA Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora

DATA Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:  
CNPJ/CPF:



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.07  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 34.141,60

DEBITO EM: 19/02/2024

=====

DOCUMENTO: 021901

AUTENTICACAO SISBB: C.EB3.23F.980.4C0.090

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:31  
673906739 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2024
NR. DOCUMENTO	556.739.000.000.087
VALOR TOTAL	1.796,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.0AC.8B6.86B.26F.2CC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE668486 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>508</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>15/03/2024 09:44:01</b>			
			Código de Verificação * <b>9P5X-ZB3I</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BREL I</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turlsmo@monteirolobato.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 15/03/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 3ª Medição Período: 01/02/2024 a 01/03/2024 Valor: R\$3.875,76  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço <b>R\$ 3.875,76</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.875,76</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>193,79</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.875,76</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.681,97</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**



**MEMORANDO 24058/2024**

**A/C: Setor de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

Ref. Pagamento da 2ª Medição do Contrato nº230852/2023

Prezada,

A Secretaria de Obras, vem por meio deste o pagamento referente a nota fiscal em ANEXO, no valor de R\$3.875,76 de acordo com o Contrato nº 23085/2023

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 18 de Março de 2024

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS  
**Secretário de Obras**  
**LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES**  
Engenheiro Civil – CREA-SP 5071119131

Data da consulta: 19/03/2024 16:26:19

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Reten ISS conforme destacado na

NF R\$ 193,79 (5%).

⑩



# ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
					S/ BDI	C/ BDI	
<b>1 01 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO</b>							
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA.	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.843,56	15.881,38
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,96	832,32	9.987,84
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM	lx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70
						<b>72.378,63</b>	
<b>2 02 INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un. mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un. mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un. mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m. mês	40,50	19,29	24,11	976,46
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96
						<b>45.869,99</b>	
<b>3 06 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>							
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1*2* CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	10,00	39,47	49,33	493,30
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APLIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30
						<b>646,60</b>	
<b>4 08 ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM</b>							
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³. mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³	783,00	10,01	12,51	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96

2ª MEDIÇÃO - 31/01/2024			
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
1,00	5.254,15	100,00%	-
0,50	3.355,36	50,00%	-
3,00	7.930,68	50,00%	-
5,00	9.693,85	50,00%	-
6,00	4.993,92	50,00%	-
3,00	2.772,59	50,00%	-
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	-
<b>34.000,65</b>			
1,00	783,98	11,11%	5.487,86
1,00	1.153,90	11,11%	8.077,30
-	-	0,00%	6.478,65
-	-	0,00%	7.704,80
-	-	0,00%	976,46
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	1.734,20
-	-	0,00%	6.449,96
<b>1.937,88</b>			<b>36.909,23</b>
-	-	0,00%	493,30
-	-	0,00%	153,30
-	-	0,00%	11.463,12
-	-	0,00%	9.795,33
-	-	0,00%	2.076,19
-	-	0,00%	1.308,96

3ª MEDIÇÃO - 01/02/2024 - 01/03/2024			
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	-
2,00	1.567,96	22,22%	3.919,90
2,00	2.307,80	22,22%	5.769,50
-	-	0,00%	6.478,65
-	-	0,00%	7.704,80
-	-	0,00%	976,46
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	1.734,20
-	-	0,00%	6.449,96
<b>3.875,76</b>			<b>33.033,47</b>
-	-	0,00%	493,30
-	-	0,00%	153,30
-	-	0,00%	11.463,12
-	-	0,00%	9.795,33
-	-	0,00%	2.076,19
-	-	0,00%	1.308,96

*(Handwritten signature/initials)*



13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m²	18,40	508,35	635,43	11.691,91	-	0,00%	11.691,91	-	0,00%	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	-	0,00%	19.737,00	-	0,00%	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	-	0,00%	62.565,00	-	0,00%	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38	-	0,00%	25.060,38	-	0,00%	25.060,38
							122.001,29	-		122.001,29	-		122.001,29
<b>14</b>	<b>18</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>											
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B1LA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	-	0,00%	79.178,37	-	0,00%	79.178,37
14.2	18.06.182	RODAPE EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B1LB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	-	0,00%	1.734,34	-	0,00%	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	-	0,00%	13.291,44	-	0,00%	13.291,44
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67	-	0,00%	64.441,67	-	0,00%	64.441,67
							158.645,82	-		158.645,82	-		158.645,82
<b>15</b>	<b>19</b>	<b>REVESTIMENTO EM PEDRA</b>											
15.1	19.01.052	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	146,10	118,12	147,85	21.571,66	-	0,00%	21.571,66	-	0,00%	21.571,66
							21.571,66	-		21.571,66	-		21.571,66
<b>16</b>	<b>21</b>	<b>REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO</b>											
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	153,03	178,82	223,27	34.167,00	-	0,00%	34.167,00	-	0,00%	34.167,00
16.2	21.10.051	RODAPE PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	-	0,00%	4.934,38	-	0,00%	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	m	34,50	19,15	23,93	825,58	-	0,00%	825,58	-	0,00%	825,58
							39.926,96	-		39.926,96	-		39.926,96
<b>17</b>	<b>22</b>	<b>FORRO, BRISE E FACHADA</b>											
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESURA DE 12,5MM, FIXO	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	-	0,00%	61.870,06	-	0,00%	61.870,06
							61.870,06	-		61.870,06	-		61.870,06
<b>18</b>	<b>23</b>	<b>ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA</b>											
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	-	0,00%	9.271,38	-	0,00%	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	-	0,00%	10.400,46	-	0,00%	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	17,00	1.399,77	1.749,71	28.745,07	-	0,00%	28.745,07	-	0,00%	28.745,07
18.4	23.08.030	FABR/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	-	0,00%	5.016,90	-	0,00%	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	-	0,00%	150,50	-	0,00%	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58	-	0,00%	1.845,58	-	0,00%	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	-	0,00%	3.714,00	-	0,00%	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	6,00	773,84	957,30	5.803,80	-	0,00%	5.803,80	-	0,00%	5.803,80

18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -180 X 210 CM	un	12,00	1.019,98	1.274,95	15.299,40	-	0,00%	15.299,40	-	0,00%	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	un	16,90	44,29	55,36	935,58	-	0,00%	935,58	-	0,00%	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	m	16,90	6,82	8,52	143,98	-	0,00%	143,98	-	0,00%	143,98
							<b>82.326,65</b>			<b>82.326,65</b>			<b>82.326,65</b>
<b>19</b>	<b>24</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO</b>											
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	29,75	707,82	884,52	26.314,47	-	0,00%	26.314,47	-	0,00%	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95	-	0,00%	1.343,95	-	0,00%	1.343,95
							<b>27.658,42</b>			<b>27.658,42</b>			<b>27.658,42</b>
<b>20</b>	<b>25</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO</b>											
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76	-	0,00%	34.238,76	-	0,00%	34.238,76
20.2	25.01.080	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69	-	0,00%	26.089,69	-	0,00%	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36	-	0,00%	2.814,36	-	0,00%	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68	-	0,00%	20.791,68	-	0,00%	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16	-	0,00%	12.536,16	-	0,00%	12.536,16
							<b>96.470,65</b>			<b>96.470,65</b>			<b>96.470,65</b>
<b>21</b>	<b>26</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>											
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	m²	1,50	420,84	526,05	789,07	-	0,00%	789,07	-	0,00%	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49	-	0,00%	1.985,49	-	0,00%	1.985,49
							<b>2.774,56</b>			<b>2.774,56</b>			<b>2.774,56</b>
<b>22</b>	<b>27</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>											
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52	-	0,00%	19.658,52	-	0,00%	19.658,52
							<b>19.658,52</b>			<b>19.658,52</b>			<b>19.658,52</b>
<b>23</b>	<b>28</b>	<b>FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>											
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO AÇIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32	-	0,00%	1.231,32	-	0,00%	1.231,32
							<b>1.231,32</b>			<b>1.231,32</b>			<b>1.231,32</b>
<b>24</b>	<b>30</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>											
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62	-	0,00%	1.306,62	-	0,00%	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	un	7,00	95,90	119,87	839,09	-	0,00%	839,09	-	0,00%	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18	-	0,00%	2.203,18	-	0,00%	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91	-	0,00%	2.471,91	-	0,00%	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05	-	0,00%	2.170,05	-	0,00%	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62	-	0,00%	6.815,62	-	0,00%	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	2,00	170,78	213,47	426,94	-	0,00%	426,94	-	0,00%	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55	-	0,00%	4.789,55	-	0,00%	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	un	5,00	1.192,55	1.490,98	7.453,40	-	0,00%	7.453,40	-	0,00%	7.453,40
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85	-	0,00%	5.304,85	-	0,00%	5.304,85
							<b>33.781,21</b>			<b>33.781,21</b>			<b>33.781,21</b>
<b>25</b>	<b>32</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA</b>											
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01	-	0,00%	9.013,01	-	0,00%	9.013,01

25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,48	-	0,00%	2.012,46	-	0,00%	2.012,46
								11.025,47	-	11.025,47	-	11.025,47	
<b>26</b>	<b>33</b>	<b>PINTURA</b>											
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47	-	0,00%	21.315,47	-	0,00%	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63	-	0,00%	54.458,63	-	0,00%	54.458,63
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09	-	0,00%	27.992,09	-	0,00%	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21	-	0,00%	2.624,21	-	0,00%	2.624,21
								106.390,40	-	106.390,40	-	106.390,40	
<b>27</b>	<b>34</b>	<b>PAISAGISMO E FECHAMENTOS</b>											
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	m³	4,55	149,63	187,03	850,98	-	0,00%	850,98	-	0,00%	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	m²	42,26	1,31	1,63	68,88	-	0,00%	68,88	-	0,00%	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	68,70	10,88	13,60	934,32	-	0,00%	934,32	-	0,00%	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALEA - H= 0,60 A 0,80 M	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32	-	0,00%	1.354,32	-	0,00%	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	un	15,00	29,53	36,91	553,65	-	0,00%	553,65	-	0,00%	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	un	2,00	29,95	37,43	74,86	-	0,00%	74,86	-	0,00%	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	un	2,00	89,11	111,38	222,76	-	0,00%	222,76	-	0,00%	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	un	13,00	41,88	52,35	680,55	-	0,00%	680,55	-	0,00%	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60	-	0,00%	26.613,60	-	0,00%	26.613,60
								31.363,92	-	31.363,92	-	31.363,92	
<b>28</b>	<b>37</b>	<b>QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>											
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	un	1,00	500,24	625,30	625,30	-	0,00%	625,30	-	0,00%	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68	-	0,00%	5.055,68	-	0,00%	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50	-	0,00%	1.172,50	-	0,00%	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92	-	0,00%	2.875,92	-	0,00%	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64	-	0,00%	1.294,64	-	0,00%	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60	-	0,00%	3.885,60	-	0,00%	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10	-	0,00%	1.112,10	-	0,00%	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84	-	0,00%	8.719,84	-	0,00%	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60	-	0,00%	4.541,60	-	0,00%	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/15V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20	-	0,00%	2.800,20	-	0,00%	2.800,20
								32.083,38	-	32.083,38	-	32.083,38	
<b>29</b>	<b>38</b>	<b>TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA</b>											
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60	-	0,00%	15.356,60	-	0,00%	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40	-	0,00%	3.209,40	-	0,00%	3.209,40
								18.566,00	-	18.566,00	-	18.566,00	
<b>30</b>	<b>39</b>	<b>CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>											
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	-	0,00%	17.262,00	-	0,00%	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60	-	0,00%	4.164,60	-	0,00%	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	-	0,00%	3.227,00	-	0,00%	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	-	0,00%	2.790,00	-	0,00%	2.790,00

30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	m	10,00	28,39	35,48	354,80	-	0,00%	354,80	-	0,00%	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-80, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	-	0,00%	1.532,00	-	0,00%	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX, DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20	-	0,00%	4.219,20	-	0,00%	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX, DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	-	0,00%	3.787,50	-	0,00%	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX, DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	120,00	29,88	37,10	4.452,00	-	0,00%	4.452,00	-	0,00%	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX, DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	-	0,00%	9.095,40	-	0,00%	9.095,40
							<b>50.884,50</b>			<b>50.884,50</b>			<b>50.884,50</b>
<b>31</b>	<b>40</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>											
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	un	8,00	135,72	169,65	1.017,90	-	0,00%	1.017,90	-	0,00%	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	cj	6,00	22,80	28,25	169,50	-	0,00%	169,50	-	0,00%	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30	-	0,00%	2.058,30	-	0,00%	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	20,00	21,59	26,98	539,60	-	0,00%	539,60	-	0,00%	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	cj	8,00	28,12	35,15	210,90	-	0,00%	210,90	-	0,00%	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58	-	0,00%	1.098,58	-	0,00%	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	cj	4,00	25,45	31,81	127,24	-	0,00%	127,24	-	0,00%	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82	-	0,00%	1.615,82	-	0,00%	1.615,82
							<b>6.837,84</b>			<b>6.837,84</b>			<b>6.837,84</b>
<b>32</b>	<b>41</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>											
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	-	0,00%	1.521,69	-	0,00%	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98	-	0,00%	4.834,98	-	0,00%	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04	-	0,00%	10.927,04	-	0,00%	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4600 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	-	0,00%	7.874,05	-	0,00%	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	-	0,00%	10.915,36	-	0,00%	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. O., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60	-	0,00%	16.053,60	-	0,00%	16.053,60
							<b>52.126,72</b>			<b>52.126,72</b>			<b>52.126,72</b>
<b>33</b>	<b>43</b>	<b>APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GAS.</b>											
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60	-	0,00%	2.265,60	-	0,00%	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	un	2,00	182,07	227,58	455,16	-	0,00%	455,16	-	0,00%	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	un	1,00	359,17	448,95	448,96	-	0,00%	448,96	-	0,00%	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43	-	0,00%	23.096,43	-	0,00%	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	-	0,00%	13.078,10	-	0,00%	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92	-	0,00%	40.780,92	-	0,00%	40.780,92
							<b>80.125,17</b>			<b>80.125,17</b>			<b>80.125,17</b>
<b>34</b>	<b>44</b>	<b>APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS</b>											
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85	-	0,00%	1.373,85	-	0,00%	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	-	0,00%	2.164,08	-	0,00%	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	un	6,00	99,71	124,63	747,78	-	0,00%	747,78	-	0,00%	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25	-	0,00%	2.273,25	-	0,00%	2.273,25

34.5	44.02.062	TAMPÃO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80	-	0,00%	10.278,80	-	0,00%	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un	10,00	69,91	87,38	873,80	-	0,00%	873,80	-	0,00%	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16	-	0,00%	1.124,16	-	0,00%	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	0,00%	172,92	-	0,00%	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	-	0,00%	1.198,62	-	0,00%	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	0,00%	1.874,21	-	0,00%	1.874,21
34.11	44.08.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	-	0,00%	1.512,60	-	0,00%	1.512,60
						<b>23.594,07</b>		-		<b>23.594,07</b>	-		<b>23.594,07</b>
<b>35</b>	<b>46</b>	<b>TUBULACAO E CONDUITORES PARA LIQUIDOS E GASES.</b>											
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60	-	0,00%	5.007,60	-	0,00%	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	-	0,00%	7.522,50	-	0,00%	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	26,52	33,15	397,80	-	0,00%	397,80	-	0,00%	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	-	0,00%	2.551,80	-	0,00%	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	-	0,00%	7.933,20	-	0,00%	7.933,20
35.6	46.08.008	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	88,85	111,06	666,36	-	0,00%	666,36	-	0,00%	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	-	0,00%	4.466,88	-	0,00%	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00	-	0,00%	8.484,00	-	0,00%	8.484,00
						<b>37.030,14</b>		-		<b>37.030,14</b>	-		<b>37.030,14</b>
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>											
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	un	4,00	106,87	133,58	534,32	-	0,00%	534,32	-	0,00%	534,32
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	un	4,00	190,80	238,50	954,00	-	0,00%	954,00	-	0,00%	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	-	0,00%	1.602,56	-	0,00%	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	6,00	78,81	95,78	574,56	-	0,00%	574,56	-	0,00%	574,56
						<b>3.665,44</b>		-		<b>3.665,44</b>	-		<b>3.665,44</b>
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>											
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	-	0,00%	9.349,56	-	0,00%	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	un	3,00	95,12	118,90	356,70	-	0,00%	356,70	-	0,00%	356,70
						<b>9.706,26</b>		-		<b>9.706,26</b>	-		<b>9.706,26</b>
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>											
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	un	26,00	82,53	103,15	2.682,16	-	0,00%	2.682,16	-	0,00%	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	un	20,00	229,17	288,46	5.729,20	-	0,00%	5.729,20	-	0,00%	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	un	2,00	354,29	442,86	885,72	-	0,00%	885,72	-	0,00%	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	un	10,00	12,94	16,17	161,70	-	0,00%	161,70	-	0,00%	161,70

							9.458,78	
39	84	PAVIMENTACAO E PASSEIO						
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35	
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49	
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m³	511,00	19,35	24,18	12.355,98	
39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07	
							84.402,89	
<b>TOTAL</b>							<b>2.326.081,38</b>	

			9.458,78
	-		
	-	0,00%	1.967,35
	-	0,00%	16.746,49
	-	0,00%	12.355,98
	-	0,00%	53.333,07
	-		84.402,89

			9.458,78
	-		
	-	0,00%	1.967,35
	-	0,00%	16.746,49
	-	0,00%	12.355,98
	-	0,00%	53.333,07
	-		84.402,89

TOTAL GERAL 2ª MEDIÇÃO	35.938,53
------------------------	-----------

TOTAL GERAL 3ª MEDIÇÃO	3.875,76
------------------------	----------

% MEDIDO	1,55%
----------	-------

% MEDIDO	0,17%
----------	-------

ACUMULADO	81.339,29
-----------	-----------

ACUMULADO	85.215,05
-----------	-----------

SALDO REMANESCENTE	2.199.341,33
--------------------	--------------

SALDO REMANESCENTE	2.114.126,28
--------------------	--------------

Monteiro Lobato, 13 de março de 2024

  
 Luis Gustavo de Barros  
 Responsável Técnico  
 CREA 5062695430

  
 LUIZ RODOLFO MEIRELES GOMES  
 CREA-SP 507175131  
 SEC. MUNIC. DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE  
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE  
**MONTEIRO  
LOBATO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**DATA:** 13/03/2024

**RELATÓRIO Nº:**  
03/2023

**CONTRATO:** 097/2023

**CONFERIDO:**  
Fiscal do contrato

**AUTOR:**  
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

**CREA:** SP-5062695430

DATA: 13/01/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>	FOLHA: 2 / 3
<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO</b>		

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães,20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1.: Instalação de banheiro químico no canteiro de obra

<b>Autor:</b>  Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
---	---

DATA:  
13/01/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 3

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3ª MEDIÇÃO**



Foto 2. :Instalação de container no canteiro de obra.

**Autor:**

  
**Luis Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

**Conferido:**

FISCAL DO CONTRATO



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**


  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				


\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**


\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo	
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo	

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/03/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 01/03/2023


<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	AGUARDANDO DEMOLIÇÃO DA ÁREA
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**  
**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:39 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **0172.C993.7901.002F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

### Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Abrangência: Jurisdição de São Paulo - Capital

Certidão n° 160567 / 2024

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 03/03/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do n° do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da



1 8 4 8 1 5 3 6 5 9 L p V z O S G r

Certidão;

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 9033629**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/03/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM**, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de março de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0073547518**





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles - Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 262/2024

Processo nº 139305/2024

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, "**C E R T I F I C A**" a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

**CERTIFICA-SE** ainda que "**NADA DEVE**", ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

## Assinatura Digital

O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/08/2001.



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

**CNPJ:** 14.563.488/0001-70

**CERTIDÃO EMITIDA** em 05/03/2024, às 16:46:00

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**Data do processamento dos dados:** 04/03/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **eJlx1PFymK40iS6**.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 14660952/2024

Expedição: 04/03/2024, às 11:02:06

Validade: 31/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24030094245-00

Data e hora da emissão 04/03/2024 10:54:30

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.563.488/0001-70  
**Razão Social:** A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI  
**Endereço:** ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/02/2024 a 15/03/2024

**Certificação Número:** 2024021510581164821811

Informação obtida em 04/03/2024 13:24:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 54523872

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 04/03/2024 10:58:48

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000001570558

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 04/03/2024, às 11:13:57 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança 7A86BE4553B896FE.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PIE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000001571121

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 04/03/2024, às 11:25:45 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivileleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **B34B1AFD7A711E17**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01698

DATA: 25/03/2024 VENCI 22/03/2024 PAGTO: 25/03/2024

Credor.: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade.: GUARATINGUETA

CEP:

**Discriminação..:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **3.875,76**

(três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \*


Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.875,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
4442	/ 2	EX	010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 3.875,76	RR\$ 0,00	RR\$ 193,79	RR\$ 3.681,97
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.875,76	RR\$ 0,00	RR\$ 193,79	RR\$ 3.681,97	

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 3.681,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9318		RR\$ 3.681,97
TOTAL. . . . .			RR\$ 3.681,97

Despesa paga em 25/03/2024 Com os recursos acima discriminados

  
AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4442 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>2</b>	FICHA: 8002	DATA: 19/03/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/03/2024
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido <b>3.681,97</b>
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00 Recursos Ordinarios		
800 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL. IND.		
000 TRANSF. UNIÃO DEC. EMENDA PARL. IND-Convên.		

EX	<b>SOMA</b>	<b>3.875,76</b>
----	-------------	-----------------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
238.177,20	39.814,29	3.875,76	198.362,91

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.875,76</b>
três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos *****	

DESCONTOS	
8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	193,79

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>193,79</b>
---------------------------	---------------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2024 

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA \_\_\_\_\_ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora	DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:58  
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2024  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.000.931  
VALOR TOTAL 3.681,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SP 353170 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 931-8  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO C.091.24D.12E.032.DA7

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:58  
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2024
NR. DOCUMENTO	556.739.000.000.087
VALOR TOTAL	196,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

NR. AUTENTICACAO	0.088.009.006.241.770
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE688468 EDMAR JOSE DE ARAUJO.



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.14  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SP 353170 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 931-8

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : SP 353170 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA  
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT  
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70  
VALOR: R\$ 3.681,97  
DEBITO EM: 21/03/2024

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 032101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.1EE.06E.1BE.0DC.FBC

Transação efetuada com sucesso por: JE688467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>517</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>17/04/2024 09:46:27</b>				
		Código de Verificação * <b>358G-0G8C</b>				
		Série <b>NE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 17/04/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 4ª Medição Período: 01/04/2024 a 10/04/2024 Valor: R\$17.826,84  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7963 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço <b>R\$ 17.826,84</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 17.826,84</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>891,34</b>	
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.826,84</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 16.935,50</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODRIGO MERELLES GOMES  
CNPJ Nº 07.719.137  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

25/04/24

Data da consulta: 25/04/2024 11:41:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

*Processos retidos de ISS conforme destacado*

*R\$ 895,34*

*Q*



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**



**MEMORANDO 24080/2024**

**A/C: Setor de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

Ref. Pagamento da 4ª Medição do Contrato nº230852/2023

Prezada,

A Secretaria de Obras, vem por meio deste solicitar o pagamento referente a nota fiscal em ANEXO, no valor de R\$17.826,84 de acordo com o Contrato nº 230852/2023.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 25 de abril de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Secretário de Obras**  
**LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES**  
Engenheiro Civil – CREA-SP 5071119131



**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI**

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO							
BDI = 25%				DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA			
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
					S/ BDI	C/ BDI	
1	01	<b>SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO</b>					
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70
					<b>72.378,53</b>		
2	02	<b>INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA</b>					
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11	978,46
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96

4º MEDIÇÃO - 10/04/2024			
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
1,00	783,98	11,11%	3.135,92
1,00	1.153,90	11,11%	4.615,60
	-	0,00%	6.478,65
80,00	7.704,80	100,00%	-
	-	0,00%	978,46
	-	0,00%	-
260,00	1.734,20	100,00%	-
428,00	6.449,96	100,00%	-

45.869,99								17.826,84			15.206,63	
<b>3</b>	<b>06</b>	<b>SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>										
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	10,00	39,47	49,33	493,30	-	0,00%	493,30		
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30	-	0,00%	153,30		
<b>646,60</b>												
<b>4</b>	<b>08</b>	<b>ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM</b>										
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³.mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12	-	0,00%	11.463,12		
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m²	783,00	10,01	12,51	9.795,33	-	0,00%	9.795,33		
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19	-	0,00%	2.076,19		
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÉXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96	-	0,00%	1.308,96		
4.5	08.06.040	BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	m	10,00	21,02	26,27	262,70	-	0,00%	262,70		
<b>24.906,30</b>												
<b>5</b>	<b>09</b>	<b>FORMA</b>										
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60	-	0,00%	84.975,60		
<b>84.975,60</b>												
<b>6</b>	<b>10</b>	<b>ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL</b>										
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08	-	0,00%	161.326,08		
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47	-	0,00%	28.553,47		
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	5.018,00	12,07	15,08	75.641,28	-	0,00%	75.641,28		
<b>265.520,83</b>												
<b>7</b>	<b>11</b>	<b>CONCRETO, MASSA E LASTRO</b>										
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28	-	0,00%	29.322,28		
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73	-	0,00%	67.130,73		
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90	-	0,00%	20.286,90		
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	39,19	125,27	156,58	6.136,37	-	0,00%	6.136,37		
<b>122.876,28</b>												
<b>8</b>	<b>12</b>	<b>FUNDACAO PROFUNDA</b>										
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38	-	0,00%	1.894,38		
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50	-	0,00%	30.388,50		
<b>32.282,88</b>												
<b>9</b>	<b>13</b>	<b>LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS</b>										
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIXADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77	-	0,00%	67.836,77		
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIXADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04	-	0,00%	99.585,04		
<b>167.421,81</b>												
<b>10</b>	<b>14</b>	<b>ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR</b>										

10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	m²	800,50	66,27	82,83	66.305,41	-	0,00%	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	m²	812,00	80,93	101,16	82.141,92	-	0,00%	82.141,92
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00	-	0,00%	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	0,00%	10.034,63
							<b>171.490,96</b>	-		<b>171.490,96</b>
<b>11</b>	<b>15</b>	<b>ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO</b>								
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13.01 A 18.00 M	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27	-	0,00%	46.132,27
							<b>46.132,27</b>	-		<b>46.132,27</b>
<b>12</b>	<b>16</b>	<b>TELHAMENTO</b>								
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20	-	0,00%	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37	-	0,00%	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57	-	0,00%	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	-	0,00%	15.392,09
							<b>66.411,23</b>	-		<b>66.411,23</b>
<b>13</b>	<b>17</b>	<b>REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL</b>								
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	m³	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00	-	0,00%	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m³	18,40	508,35	635,43	11.691,91	-	0,00%	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	-	0,00%	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	-	0,00%	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38	-	0,00%	25.060,38
							<b>122.001,29</b>	-		<b>122.001,29</b>
<b>14</b>	<b>18</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO</b>								
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	-	0,00%	79.178,37
14.2	18.06.182	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	-	0,00%	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	-	0,00%	13.291,44

14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67	-	0,00%	64.441,67
							158.645,82			158.645,82
<b>15</b>	<b>19</b>	<b>REVESTIMENTO EM PEDRA</b>								
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	146,10	118,12	147,65	21.571,66	-	0,00%	21.571,66
							21.571,66			21.571,66
<b>16</b>	<b>21</b>	<b>REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO</b>								
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00	-	0,00%	34.167,00
16.2	21.10.061	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	-	0,00%	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	m	34,50	19,15	23,93	825,58	-	0,00%	825,58
							39.926,96			39.926,96
<b>17</b>	<b>22</b>	<b>FORRO, BRISE E FACHADA</b>								
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	-	0,00%	61.870,06
							61.870,06			61.870,06
<b>18</b>	<b>23</b>	<b>ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA</b>								
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	-	0,00%	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	-	0,00%	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	-	0,00%	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	-	0,00%	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	-	0,00%	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58	-	0,00%	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	-	0,00%	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80	-	0,00%	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40	-	0,00%	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	un	16,90	44,29	55,36	935,58	-	0,00%	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	m	16,90	6,82	8,52	143,98	-	0,00%	143,98
							82.326,65			82.326,65
<b>19</b>	<b>24</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO</b>								
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47	-	0,00%	26.314,47

19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95	-	0,00%	1.343,95
							<b>27.658,42</b>			27.658,42
<b>20</b>	<b>25</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO</b>								
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76	-	0,00%	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69	-	0,00%	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36	-	0,00%	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68	-	0,00%	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16	-	0,00%	12.536,16
							<b>96.470,65</b>			96.470,65
<b>21</b>	<b>26</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>								
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	m²	1,50	420,84	526,05	789,07	-	0,00%	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49	-	0,00%	1.985,49
							<b>2.774,56</b>			2.774,56
<b>22</b>	<b>27</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>								
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52	-	0,00%	19.658,52
							<b>19.658,52</b>			19.658,52
<b>23</b>	<b>28</b>	<b>FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>								
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 80 KG ATÉ 80 KG	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32	-	0,00%	1.231,32
							<b>1.231,32</b>			1.231,32
<b>24</b>	<b>30</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>								
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2'	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62	-	0,00%	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 500 MM	un	7,00	95,90	119,87	839,09	-	0,00%	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 MM	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18	-	0,00%	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 X 800 MM	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91	-	0,00%	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05	-	0,00%	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62	-	0,00%	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	2,00	170,78	213,47	426,94	-	0,00%	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X 450 MM	un	5,00	786,33	957,91	4.789,55	-	0,00%	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40	-	0,00%	7.453,40

24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85	-	0,00%	5.304,85
							33.781,21	-	-	33.781,21
<b>25</b>	<b>32</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA</b>								
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01	-	0,00%	9.013,01
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46	-	0,00%	2.012,46
							11.025,47	-	-	11.025,47
<b>26</b>	<b>33</b>	<b>PINTURA</b>								
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47	-	0,00%	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63	-	0,00%	54.458,63
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09	-	0,00%	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21	-	0,00%	2.624,21
							106.390,40	-	-	106.390,40
<b>27</b>	<b>34</b>	<b>PAISAGISMO E FECHAMENTOS</b>								
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	m³	4,55	149,53	187,03	850,98	-	0,00%	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	m²	42,26	1,31	1,63	68,88	-	0,00%	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	68,70	10,88	13,60	934,32	-	0,00%	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32	-	0,00%	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	un	15,00	29,53	36,91	553,65	-	0,00%	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	un	2,00	29,95	37,43	74,86	-	0,00%	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	un	2,00	89,11	111,38	222,76	-	0,00%	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	un	13,00	41,88	52,35	680,55	-	0,00%	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60	-	0,00%	26.613,60
							31.353,92	-	-	31.353,92
<b>28</b>	<b>37</b>	<b>QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>								
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	un	1,00	500,24	625,30	625,30	-	0,00%	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68	-	0,00%	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50	-	0,00%	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92	-	0,00%	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64	-	0,00%	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60	-	0,00%	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10	-	0,00%	1.112,10

28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSIVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSIVEIS	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84	-	0,00%	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60	-	0,00%	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20	-	0,00%	2.800,20
							<b>32.083,38</b>			<b>32.083,38</b>
<b>29</b>	<b>38</b>	<b>TUBULACAO E CONDUCTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA</b>								
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORÇADO, DN 25 MM	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60	-	0,00%	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORÇADO, DN 32 MM	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40	-	0,00%	3.209,40
							<b>18.566,00</b>			<b>18.566,00</b>
<b>30</b>	<b>39</b>	<b>CONDUCTOR E ENFIAÇAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>								
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2.5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	-	0,00%	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60	-	0,00%	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	-	0,00%	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	-	0,00%	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	m	10,00	28,39	35,48	354,80	-	0,00%	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	-	0,00%	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20	-	0,00%	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	-	0,00%	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00	-	0,00%	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	-	0,00%	9.095,40
							<b>50.884,50</b>			<b>50.884,50</b>
<b>31</b>	<b>40</b>	<b>DISTRIBUICAO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>								
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90	-	0,00%	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	cj	6,00	22,60	28,25	169,50	-	0,00%	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30	-	0,00%	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	20,00	21,59	26,98	539,60	-	0,00%	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	cj	6,00	28,12	35,15	210,90	-	0,00%	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58	-	0,00%	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	cj	4,00	25,45	31,81	127,24	-	0,00%	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82	-	0,00%	1.615,82
							<b>6.837,84</b>			<b>6.837,84</b>
<b>32</b>	<b>41</b>	<b>ILUMINACAO</b>								
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	-	0,00%	1.521,69

32.2	41.10.430	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98	-	0,00%	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04	-	0,00%	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	-	0,00%	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	-	0,00%	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	un	60,00	214,05	267,58	16.053,60	-	0,00%	16.053,60
							<b>52.126,72</b>			<b>52.126,72</b>
<b>33</b>	<b>43</b>	<b>APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.</b>								
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60	-	0,00%	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	un	2,00	182,07	227,58	455,16	-	0,00%	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	un	1,00	359,17	448,96	448,96	-	0,00%	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43	-	0,00%	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	-	0,00%	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92	-	0,00%	40.780,92
							<b>80.125,17</b>			<b>80.125,17</b>
<b>34</b>	<b>44</b>	<b>APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS</b>								
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85	-	0,00%	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	-	0,00%	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	un	6,00	99,71	124,63	747,78	-	0,00%	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25	-	0,00%	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80	-	0,00%	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un	10,00	69,91	87,38	873,80	-	0,00%	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16	-	0,00%	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	0,00%	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	-	0,00%	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	0,00%	1.874,21

34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	-	0,00%	1.512,60
							<b>23.594,07</b>			<b>23.594,07</b>
<b>35</b>	<b>46</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.</b>								
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60	-	0,00%	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	-	0,00%	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	26,52	33,15	397,80	-	0,00%	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	-	0,00%	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	-	0,00%	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	88,85	111,06	666,36	-	0,00%	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	-	0,00%	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	58,56	70,70	8.484,00	-	0,00%	8.484,00
							<b>37.030,14</b>			<b>37.030,14</b>
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>								
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	un	4,00	106,87	133,58	534,32	-	0,00%	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	un	4,00	190,80	238,50	954,00	-	0,00%	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	-	0,00%	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	6,00	76,61	95,76	574,56	-	0,00%	574,56
							<b>3.665,44</b>			<b>3.665,44</b>
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>								
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	-	0,00%	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	un	3,00	95,12	118,90	356,70	-	0,00%	356,70
							<b>9.706,26</b>			<b>9.706,26</b>
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>								
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16	-	0,00%	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	un	20,00	229,17	288,46	5.729,20	-	0,00%	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	un	2,00	354,29	442,86	885,72	-	0,00%	885,72

38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4'	un	10,00	12,94	16,17	161,70
						<b>9.458,78</b>	
<b>39</b>	<b>54</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>					
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98
39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ.E EM AREIA	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
						<b>84.402,89</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>2.326.081,38</b>	

	-	0,00%	161,70
	-		9.458,78
	-	0,00%	1.967,35
	-	0,00%	16.746,49
	-	0,00%	12.355,98
	-	0,00%	53.333,07
	-		84.402,89

<b>TOTAL GERAL 4ª MEDIÇÃO</b>	<b>17.826,84</b>
<b>% MEDIDO</b>	<b>0,77%</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>103.041,89</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>	<b>2.011.084,39</b>

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2024

  
 Luis Gustavo de Barros  
 Responsável Técnico  
 CREA 5062695430

  
 LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
 CREA-SP 50717951  
 SEC. MUNIC. DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE  
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE  
**MONTEIRO  
LOBATO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 17/04/2024

RELATÓRIO Nº:  
04/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

DATA: 17/04/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,          BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA          PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO</b>	<b>FOLHA: 2 / 5</b>
---------------------	--	---------------------

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.


### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães,20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1.: Instalação de banheiro químico no canteiro de obra

<b>Autor:</b>   <b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>   <b>FISCAL DO CONTRATO</b>
---	---

DATA:  
17/04/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 5

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO**



Foto 2. :Instalação de container no canteiro de obra.



Foto 3. :Instalação de tapume na obra.

**Autor:**

  
**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

**Conferido:**

FISCAL DO CONTRATO



DATA:  
17/04/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO



Foto 4.: Instalação de tapume na obra.




Foto 5.: Locação da obra – Estacas e gabarito.

Autor:

  
**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



DATA:  
17/04/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4ª MEDIÇÃO



Foto 6.: Execução do gabarito.

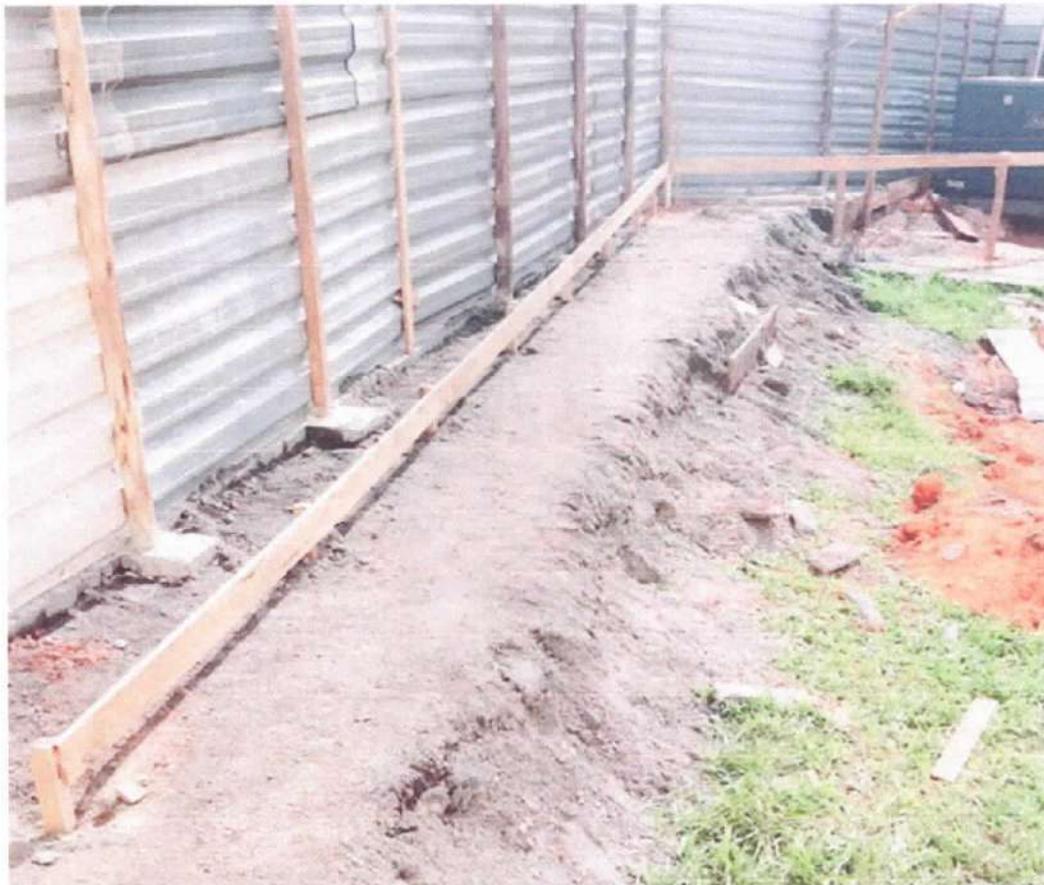



Foto 7.: Execução do gabarito.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO  




### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 12/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	MONTAGEM DE GABARITO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

LUIZ RODOLFO MEIRELES GOMES  
CREA-SP 50711/19131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS  
  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 11/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	RETIRADA DE TAPUME EXISTENTE
2	INSTALAÇÃO DE TAPUME NOVO COM TELHA DE ZINCO
3	REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE BLOQUETE
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 10/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	DEMOLIÇÃO DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE
2	REMOÇÃO DE ENTULHO
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 09/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	DEMOLIÇÃO DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 08/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	COLOCAÇÃO DE LONA NO TALUDE
2	DEMOLIÇÃO DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	05/04/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

<b>Observações:</b>	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	EXECUÇÃO DA TOPOGRAFIA PARA MARCAÇÃO DO GABARITO
2	EXECUÇÃO DA TOPOGRAFIA PARA MARCAÇÃO DO MURO DE ARRIMO
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

<b>Observações:</b>

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 04/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM PARA FIXAÇÃO DE PONTALETES DE EUCALIPTO
2	INSTALAÇÃO DE TELHA DE ZINCO PARA FECHAMENTO DO TAPUME
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 03/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE TAPUME EXISTENTE
2	PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM PARA FIXAÇÃO DE PONTALETES DE EUCALIPTO
3	INSTALAÇÃO DE TELHA DE ZINCO PARA FECHAMENTO DO TAPUME
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 02/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	INSTALAÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL
2	FIXAÇÃO DE TELHAS COMO TAPUME NAS GRADES
3	CONCRETAGEM DE SAPATA (PARA FIXAÇÃO DO PILAR DE FERRO DO PORTÃO SOCIAL)
4	INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 01/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA BALDRAME
2	SOLDAGEM DO TRILHO DO PORTÃO
3	CONCRETAGEM DO BALDRAME PARA FIXAÇÃO DO TRILHO DO PORTÃO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040119299-59  
Data e hora da emissão 02/04/2024 09:32:13  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/00002212222

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 02/04/2024, às 09:41:01 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **308B17BFC9CC73A6**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO - Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE - Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.563.488/0001-70  
**Razão Social:** A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI  
**Endereço:** ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/03/2024 a 22/04/2024

**Certificação Número:** 2024032401042476318855

Informação obtida em 27/03/2024 10:46:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 22008826/2024

Expedição: 02/04/2024, às 09:37:15

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

### Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Abrangência: Jurisdição de São Paulo - Capital

Certidão n° 241068 / 2024

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 01/04/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do n° do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da



Certidão;  
c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;  
d. Certidão emitida gratuitamente.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**  
**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:39 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **0172.C993.7901.002F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000002212821

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 02/04/2024, às 09:49:07 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **0BD69943F851B5C5**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNI n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





02/04/2024

0074273456

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 9739530**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/04/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM**, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão. (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de abril de 2024.

**PEDIDO Nº:** 0074273456





**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

**CERTIDÃO EMITIDA em 02/04/2024, às 10:37:04**

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**Data do processamento dos dados: 01/04/2024**

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **2m6Zt7gp0SaC5G7**.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 55539626

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/04/2024 09:28:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02428

DATA: 30/04/2024 **VENCI 06/05/2024** PAGTO: 30/04/2024

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA

CEP:

**Discriminação...:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **17.826,84**

(dezessete mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*


Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 17.826,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
4442	/ 3	EX 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 17.826,84	RR\$ 0,00	RR\$ 891,34	RR\$ 16.935,50
TOTAL . . . . .					RR\$ 17.826,84	RR\$ 0,00	RR\$ 891,34	RR\$ 16.935,50

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 16.935,50**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE    /    /   

  
EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		<b>RR\$ 16.935,50</b>
TOTAL. . . . .			RR\$ 16.935,50

Despesa paga em 30/04/2024 Com os recursos acima discriminados

  
AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

   /    /    Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

4442 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>3</b>	FICHA:	8002	DATA:	25/04/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	--------	------	-------	------------	----------------

LICITAÇÃO:	OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	06/05/2024
------------	-------------	-----------	------------	-------------	------------

NOME:	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO:	10786
ENDEREÇO:	R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido
800 TRANSF UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND		<b>16.935,50</b>
000 TRANSF UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên		Desconto
		<b>891,34</b>


EX	<b>SOMA</b>	<b>17.826,84</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
238.177,20	57.641,13	17.826,84	180.536,07

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>17.826,84</b>
dezesete mil, oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos *****	

DESCONTOS		
8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	891,34	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>891,34</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/04/2024 

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:
_____ DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora	_____ DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.42  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA,AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$

16.935,50

DEBITO EM: 30/04/2024

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB:

5.3CE.B05.F6A.306.BE2

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:14:12  
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	556.739.000.000.087
VALOR TOTAL	891,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

NR.AUTENTICACAO	1.218.406.E4F.CEC.41E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE668486 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota <b>528</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>14/05/2024 09:00:02</b>			
		Código de Verificação * <b>ITXH-EBDM</b>			
		Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>					
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>					
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>					
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>					
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 14/05/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>					
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 5ª Medição Período: 11/04/2024 a 10/05/2024 Valor: R\$172.562,96  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1					
Valor do Serviço <b>R\$ 172.562,96</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 172.562,96</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>8.628,15</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>
					Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 172.562,96</b>					
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 163.934,81</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO					

\*A autenticidade desta Nota Fiscal dev ora ser confirmada no sito da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MEIRELES GOMES  
CREA-SP 507119/31  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

15.05.24

Data da consulta: 14/05/2024 16:19:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

4068-1

Reten 5% ISS = R\$ 8.628,15

Ⓜ



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**



**MEMORANDO 24093/2024**

**A/C: Setor de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

Ref. Pagamento da 5ª Medição do Contrato nº230852/2023

Prezada,

A Secretaria de Obras, vem por meio deste solicitar o pagamento referente a nota fiscal em ANEXO, no valor de R\$172.562,96 de acordo com o Contrato nº 230852/2023.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 14 de maio de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Secretário de Obras**  
**LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES**  
Engenheiro Civil – CREA-SP 5071119131



# ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
					S/ BDI	C/ BDI	
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>SERVICO TÉCNICO ESPECIALIZADO</b>					
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	lx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70
						<b>72.378,53</b>	
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA</b>					
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	280,00	5,34	6,67	1.734,20
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96

## 5ª MEDIÇÃO - 09/05/2024

QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
1,00	783,98	11,11%	2.351,94
1,00	1.153,90	11,11%	3.461,70
	-	0,00%	6.478,65
	-	0,00%	-
	-	0,00%	976,46
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-

							<b>45.869,99</b>	
<b>3</b>	<b>06</b>	<b>SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>						
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1*1/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	10,00	39,47	49,33	493,30	
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30	
							<b>646,60</b>	
<b>4</b>	<b>08</b>	<b>ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM</b>						
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³.mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12	
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m²	783,00	10,01	12,51	9.795,33	
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19	
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96	
4.5	08.06.040	BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	m	10,00	21,02	28,27	262,70	
							<b>24.906,30</b>	
<b>5</b>	<b>09</b>	<b>FORMA</b>						
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60	
							<b>84.975,60</b>	
<b>6</b>	<b>10</b>	<b>ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL</b>						
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08	
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47	
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28	
							<b>265.520,83</b>	
<b>7</b>	<b>11</b>	<b>CONCRETO, MASSA E LASTRO</b>						
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28	
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73	
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90	
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	39,19	125,27	158,58	6.136,37	
							<b>122.876,28</b>	
<b>8</b>	<b>12</b>	<b>FUNDAÇÃO PROFUNDA</b>						
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	lx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38	
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50	
							<b>32.282,88</b>	
<b>9</b>	<b>13</b>	<b>LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS</b>						
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77	
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04	
							<b>167.421,81</b>	
<b>10</b>	<b>14</b>	<b>ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR</b>						

	<b>1.937,88</b>		<b>13.268,75</b>
10,00	493,30	100,00%	-
10,00	153,30	100,00%	-
	<b>646,60</b>		
-	-	0,00%	11.463,12
-	-	0,00%	9.795,33
-	-	0,00%	2.076,19
-	-	0,00%	1.308,96
-	-	0,00%	262,70
-	-	0,00%	-
-	-	0,00%	84.975,60
-	-	0,00%	-
9.222,10	107.621,91	66,71%	53.704,17
649,21	8.939,62	31,31%	19.613,85
-	-	0,00%	75.641,28
	<b>116.561,53</b>		<b>148.959,30</b>
-	-	0,00%	29.322,28
52,60	25.543,09	38,05%	41.587,64
52,60	5.310,50	26,18%	14.976,41
-	-	0,00%	6.136,37
	<b>30.853,58</b>	<b>25,11%</b>	<b>92.022,70</b>
1,00	1.894,38	100,00%	-
42,00	2.836,26	9,33%	27.552,24
	<b>4.730,64</b>	<b>14,65%</b>	<b>27.552,24</b>
-	-	0,00%	67.836,77
-	-	0,00%	99.585,04
-	-	0,00%	-

10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	m²	800,50	56,27	82,83	66.305,41	-	0,00%	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	m²	812,00	80,93	101,16	82.141,92	-	0,00%	82.141,92
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00	-	0,00%	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	0,00%	10.034,63
						171.490,96		-	0,00%	-
<b>11</b>	<b>15</b>	<b>ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO</b>								
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27	-	0,00%	46.132,27
						46.132,27		-	0,00%	-
<b>12</b>	<b>16</b>	<b>TELHAMENTO</b>								
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20	-	0,00%	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37	-	0,00%	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57	-	0,00%	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	-	0,00%	15.392,09
						66.411,23		-	0,00%	-
<b>13</b>	<b>17</b>	<b>REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL</b>								
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	m³	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00	-	0,00%	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m³	18,40	508,35	635,43	11.691,91	-	0,00%	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	-	0,00%	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	-	0,00%	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38	-	0,00%	25.060,38
						122.001,29		-	0,00%	-
<b>14</b>	<b>18</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>								
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	-	0,00%	79.178,37
14.2	18.06.162	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	-	0,00%	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	-	0,00%	13.291,44

14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67	-	0,00%	64.441,67	
							158.645,82		-	0,00%	-
16	19	<b>REVESTIMENTO EM PEDRA</b>									
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	146,10	118,12	147,65	21.571,66	-	0,00%	21.571,66	
							21.571,66		-	0,00%	-
16	21	<b>REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO</b>									
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	153,03	178,82	223,27	34.167,00	-	0,00%	34.167,00	
16.2	21.10.061	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	-	0,00%	4.934,38	
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	m	34,50	19,15	23,93	825,58	-	0,00%	825,58	
							39.926,96		-	0,00%	-
17	22	<b>FORRO, BRISE E FACHADA</b>									
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	-	0,00%	61.870,06	
							61.870,06		-	0,00%	-
18	23	<b>ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA</b>									
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	-	0,00%	9.271,38	
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	-	0,00%	10.400,46	
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	-	0,00%	29.745,07	
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	-	0,00%	5.016,90	
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	-	0,00%	150,50	
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58	-	0,00%	1.845,58	
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	-	0,00%	3.714,00	
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80	-	0,00%	5.803,80	
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40	-	0,00%	15.299,40	
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	un	16,90	44,29	55,36	935,58	-	0,00%	935,58	
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	m	16,90	6,82	8,52	143,98	-	0,00%	143,98	
							82.326,65		-	0,00%	-
19	24	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO</b>									
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47	-	0,00%	26.314,47	

19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95	-	0,00%	1.343,95
					27.658,42			-	0,00%	-
<b>20</b>	<b>25</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO</b>								
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76	-	0,00%	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69	-	0,00%	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	4,10	549,15	688,43	2.814,36	-	0,00%	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68	-	0,00%	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16	-	0,00%	12.536,16
					96.470,65			-	0,00%	-
<b>21</b>	<b>26</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>								
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	m²	1,50	420,84	526,05	789,07	-	0,00%	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49	-	0,00%	1.985,49
					2.774,56			-	0,00%	-
<b>22</b>	<b>27</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>								
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52	-	0,00%	19.658,52
					19.658,52			-	0,00%	-
<b>23</b>	<b>28</b>	<b>FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>								
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32	-	0,00%	1.231,32
					1.231,32			-	0,00%	-
<b>24</b>	<b>30</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>								
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	m	7,00	149,33	186,68	1.306,62	-	0,00%	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	un	7,00	95,90	119,87	839,09	-	0,00%	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18	-	0,00%	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91	-	0,00%	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05	-	0,00%	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62	-	0,00%	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	2,00	170,78	213,47	426,94	-	0,00%	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	un	5,00	786,33	957,91	4.789,55	-	0,00%	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40	-	0,00%	7.453,40

24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85	-	0,00%	5.304,85	
					33.781,21				-	0,00%	-
<b>25</b>	<b>32</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA</b>									
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01	-	0,00%	9.013,01	
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46	-	0,00%	2.012,46	
					11.025,47				-	0,00%	-
<b>26</b>	<b>33</b>	<b>PINTURA</b>									
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47	-	0,00%	21.315,47	
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63	-	0,00%	54.458,63	
26.3	33.10.060	EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09	-	0,00%	27.992,09	
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21	-	0,00%	2.624,21	
					106.390,40				-	0,00%	-
<b>27</b>	<b>34</b>	<b>PAISAGISMO E FECHAMENTOS</b>									
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	m³	4,55	149,63	187,03	850,98	-	0,00%	850,98	
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	m²	42,26	1,31	1,63	68,88	-	0,00%	68,88	
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	68,70	10,86	13,60	934,32	-	0,00%	934,32	
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉIA - H= 0,60 A 0,80 M	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32	-	0,00%	1.354,32	
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	un	15,00	29,53	36,91	553,65	-	0,00%	553,65	
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	un	2,00	29,95	37,43	74,86	-	0,00%	74,86	
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	un	2,00	89,11	111,38	222,76	-	0,00%	222,76	
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	un	13,00	41,88	52,35	680,55	-	0,00%	680,55	
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60	-	0,00%	26.613,60	
					31.353,92				-	0,00%	-
<b>28</b>	<b>37</b>	<b>QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>									
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	un	1,00	500,24	625,30	625,30	-	0,00%	625,30	
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68	-	0,00%	5.055,68	
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50	-	0,00%	1.172,50	
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92	-	0,00%	2.875,92	
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64	-	0,00%	1.294,64	
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60	-	0,00%	3.885,60	
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10	-	0,00%	1.112,10	

28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSIVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84	-	0,00%	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60	-	0,00%	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20	-	0,00%	2.800,20
					<b>32.083,38</b>			-	0,00%	-
<b>29</b>	<b>38</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA</b>								
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60	-	0,00%	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40	-	0,00%	3.209,40
					<b>18.566,00</b>			-	0,00%	-
<b>30</b>	<b>38</b>	<b>CONDUTOR E ENFIAÇAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>								
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	-	0,00%	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60	-	0,00%	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	-	0,00%	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	-	0,00%	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	m	10,00	28,39	35,48	354,80	-	0,00%	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	-	0,00%	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20	-	0,00%	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	-	0,00%	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00	-	0,00%	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	-	0,00%	9.095,40
					<b>50.884,50</b>			-	0,00%	-
<b>31</b>	<b>40</b>	<b>DISTRIBUICAO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>								
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90	-	0,00%	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	cj	6,00	22,60	28,25	169,50	-	0,00%	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30	-	0,00%	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	20,00	21,59	26,98	539,60	-	0,00%	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	cj	6,00	28,12	35,15	210,90	-	0,00%	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58	-	0,00%	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	cj	4,00	25,45	31,81	127,24	-	0,00%	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82	-	0,00%	1.615,82
					<b>6.837,84</b>			-	0,00%	-
<b>32</b>	<b>41</b>	<b>ILUMINACAO</b>								
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	-	0,00%	1.521,69

32.2	41.10.430	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6.00 M	un	3,00	1.289,33	1.611,86	4.834,98	-	0,00%	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	un	8,00	1.082,71	1.365,88	10.927,04	-	0,00%	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	-	0,00%	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	-	0,00%	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60	-	0,00%	16.053,60
							<b>52.126,72</b>			
<b>33</b>	<b>43</b>	<b>APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.</b>								
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60	-	0,00%	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	un	2,00	182,07	227,58	455,16	-	0,00%	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	un	1,00	359,17	448,96	448,96	-	0,00%	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43	-	0,00%	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	-	0,00%	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92	-	0,00%	40.780,92
							<b>80.125,17</b>			
<b>34</b>	<b>44</b>	<b>APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS</b>								
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85	-	0,00%	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	-	0,00%	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	un	6,00	99,71	124,63	747,78	-	0,00%	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25	-	0,00%	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80	-	0,00%	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un	10,00	69,91	87,38	873,80	-	0,00%	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16	-	0,00%	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	0,00%	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	-	0,00%	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	0,00%	1.874,21

34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	-	0,00%	1.512,60
					<b>23.594,07</b>			-	0,00%	-
<b>35</b>	<b>46</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.</b>								
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60	-	0,00%	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	-	0,00%	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	26,52	33,15	397,80	-	0,00%	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	-	0,00%	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	-	0,00%	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	88,85	111,08	666,36	-	0,00%	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4', INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	-	0,00%	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00	-	0,00%	8.484,00
					<b>37.030,14</b>			-	0,00%	-
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>								
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2'	un	4,00	106,87	133,58	534,32	-	0,00%	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2'	un	4,00	190,80	238,50	954,00	-	0,00%	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	-	0,00%	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	un	6,00	76,61	95,78	574,56	-	0,00%	574,56
					<b>3.665,44</b>			-	0,00%	-
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>								
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	-	0,00%	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1'	un	3,00	95,12	118,90	356,70	-	0,00%	356,70
					<b>9.706,26</b>			-	0,00%	-
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>								
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16	-	0,00%	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20	-	0,00%	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	un	2,00	354,29	442,86	885,72	-	0,00%	885,72

38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4'	un	10,00	12,94	16,17	161,70
						<b>9.458,78</b>	
<b>39</b>	<b>54</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>					
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98
39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
						<b>84.402,89</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>2.326.081,38</b>			

	-	0,00%	161,70
	-	0,00%	-
	-	0,00%	1.967,35
	-	0,00%	16.746,49
	-	0,00%	12.355,98
	-	0,00%	53.333,07
	-	0,00%	-

<b>TOTAL GERAL 5ª MEDIÇÃO</b>	<b>154.730,23</b>
<b>% MEDIDO</b>	<b>6,65%</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>257.772,12</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>	<b>1.753.312,27</b>

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2024

  
Luis Gustavo de Barros  
Responsável Técnico  
CREA 5062695430

Luis Gustavo de Barros  
Engenheiro Civil  
CREA: 5062695430

  
LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071118131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE  
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE  
**MONTEIRO  
LOBATO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 17/04/2024

RELATÓRIO Nº:  
05/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:

Fiscal do contrato

AUTOR:

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

<p>DATA: 10/05/2024</p>	<p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO</p>	<p>FOLHA: 2 / 9</p>
-----------------------------	---	---------------------

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1.: Locação de gabarito.

<p>Autor:</p> <p> Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p>	<p>Conferido:</p> <p> FISCAL DO CONTRATO</p>
--	---

DATA:  
10/05/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 9

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO**



Foto 2.: Locação das estacas.



Foto 3.: Execução do gabarito.

**Autor:**

  
**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

**Conferido:**

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO



Foto 4.: Ferragem muro de arrimo.



Foto 5.: Ferragem estaca UPA.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO



Foto 6.: Marcação das estacas.



Foto 7.: Marcação das estacas.

Autor:

  
Luis Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 6 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO



Foto 8.: Limpeza e escavação de solo.

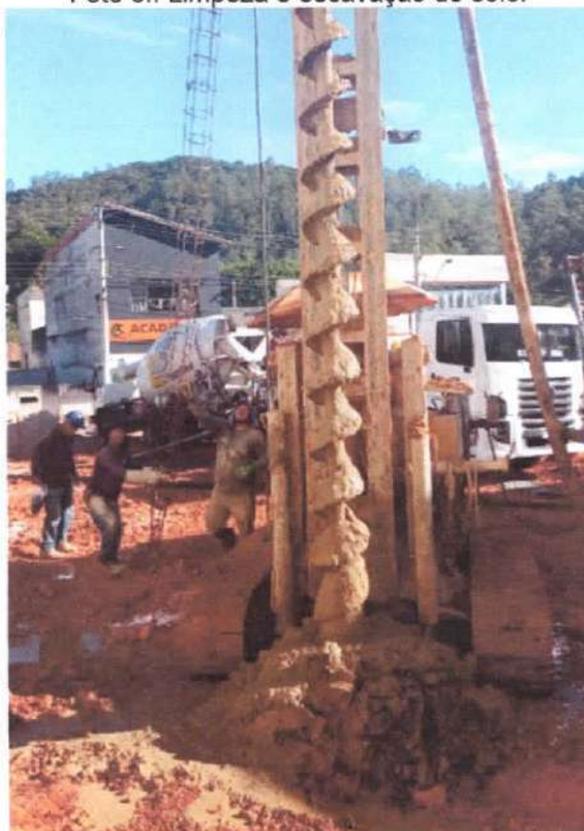


Foto 9.: Execução de estaca hélice contínua.

Autor:

  
Luis Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 7 / 9

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO

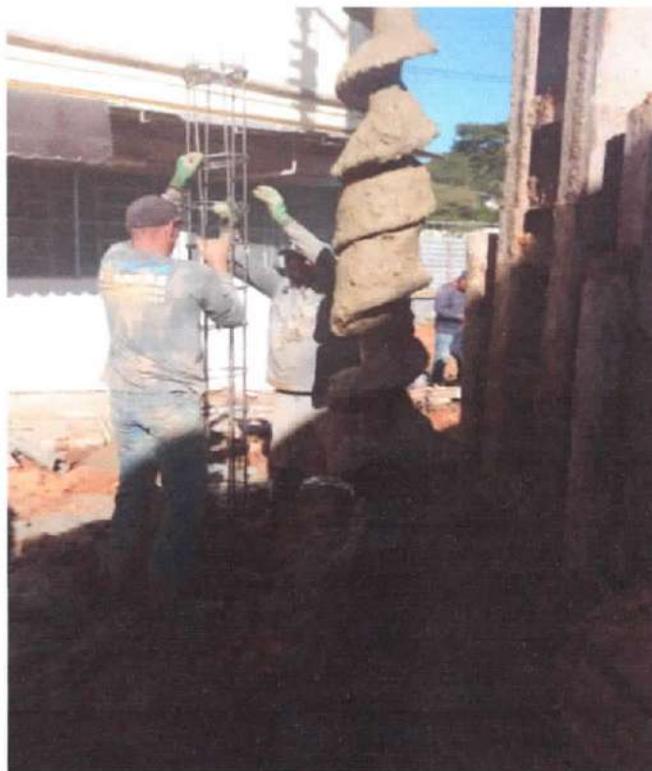


Foto 10.: Execução de estaca hélice contínua.



Foto 11.: Execução de estaca hélice contínua.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
10/05/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 8 / 9

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO**



Foto 12.: Execução de estaca hélice contínua.

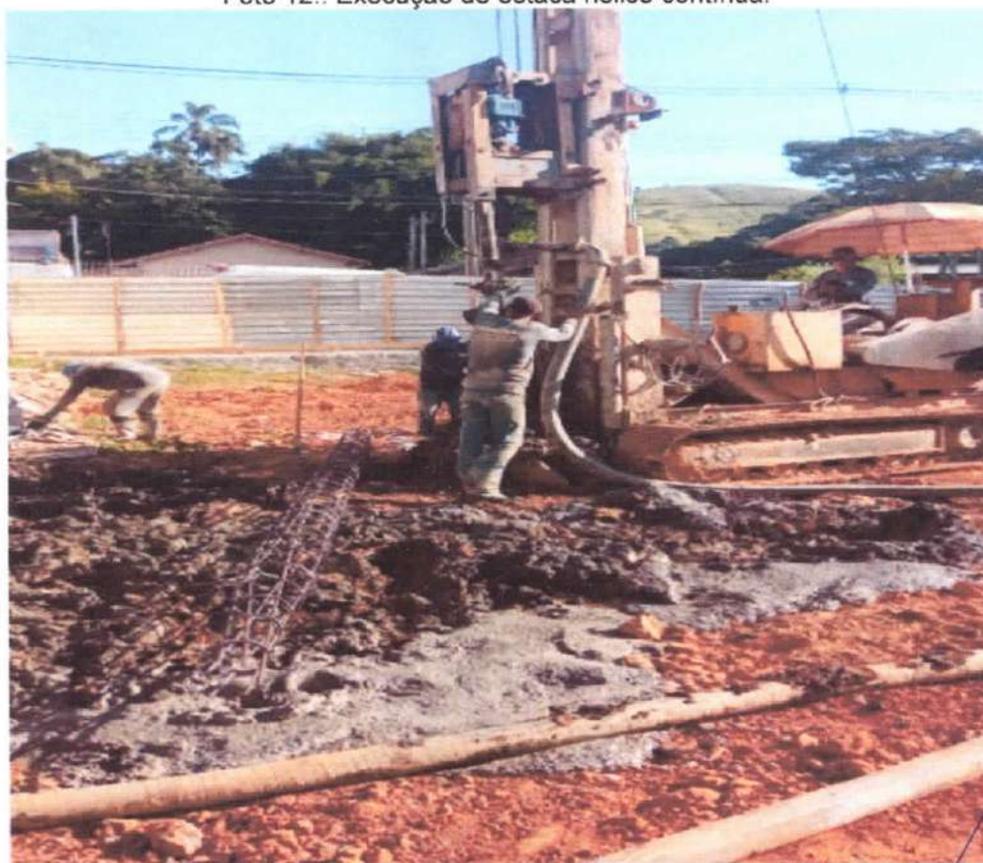


Foto 13.: Execução de estaca hélice contínua.

**Autor:**

  
**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

**Conferido:**

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
10/05/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 9 / 9

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 5ª MEDIÇÃO**



Foto 14.: Ferragem bloco de coroamento UPA e muro de arrimo.

LUÍZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP-8071119/31  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Autor:

  
Luis Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 10/05/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS
2	IDENTIFICAÇÃO DAS BROCAS PERFURADAS E CONCRETADAS COM CONCRETO USINADO
3	REMOÇÃO DE ACUMULO DE TERRA EXTRAÍDO DAS PERFURAÇÕES
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 09/05/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS
2	IDENTIFICAÇÃO DAS BROCAS PERFURADAS E CONCRETADAS COM CONCRETO USINADO
3	REMOÇÃO DE ACUMULO DE TERRA EXTRAÍDO DAS PERFURAÇÕES
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 08/05/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS
2	IDENTIFICAÇÃO DAS ESTACAS PERFURADAS E CONCRETADAS COM CONCRETO USINADO
3	REMOÇÃO DE ACUMULO DE TERRA EXTRAÍDO DAS PERFURAÇÕES
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 07/05/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	MARCAÇÃO DAS BROCAS DO MURO DE ARRIMO
2	CONFERENCIA DE RODAS AS BROCAS MARCADAS
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	06/05/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÃO DA PERFURAÇÃO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

### Observações:


  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 03/05/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	MARCAÇÃO DAS BROCAS
2	RECEBIMENTO DE FERRAGENS
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 02/05/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	DESLOCAMENTO DE FERRAGENS DAS BROCAS
2	REMARCAÇÃO DO GABARITO
3	REVISÃO DOS PONTOS MARCADOS DAS BROCAS
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 30/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 29/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 26/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 25/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	24/04/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

#### Observações:


  
ENGENHEIRO

  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 23/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 22/04/2023

**CONDIÇÕES CLIMÁTICAS**

<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 19/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE ATERRO PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS DAS BROCAS
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
ENGENHEIRO

  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 18/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE ATERRO PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS DAS BROCAS
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 17/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE ATERRO PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS DAS BROCAS
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**


\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 16/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE ATERRO PARA MARCAÇÃO DOS PONTOS DAS BROCAS
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 15/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE
2	DEMOLIÇÃO DA VIGA DO MURO DE ARRIMO EXISTENTE
3	REMOÇÃO DE ENTULHO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 12/04/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	MONTAGEM DE GABARITO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	11/04/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	RETIRADA DE TAPUME EXISTENTE
2	INSTALAÇÃO DE TAPUME NOVO COM TELHA DE ZINCO
3	REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE BLOQUETE
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
LUIZ RODOLFO WEIRELLES GOMES  
CREA-SP 507119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS  
ENGENHEIRO FISCAL

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.563.488/0001-70  
**Razão Social:** A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI  
**Endereço:** ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/05/2024 a 30/05/2024

**Certificação Número:** 2024050101162801907506

Informação obtida em 09/05/2024 17:06:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24050052984-04

Data e hora da emissão 03/05/2024 07:43:05

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000002212222

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 02/04/2024, às 09:41:01 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança 308B178FC9CC73A6.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040119299-59

Data e hora da emissão 02/04/2024 09:32:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 55539626

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/04/2024 09:28:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA

**CNPJ:** 14.563.488/0001-70

**CERTIDÃO EMITIDA** em 02/04/2024, às 10:37:04

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**Data do processamento dos dados:** 01/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **2m6Zt7gp0SaC5G7**.



02/04/2024

0074273456

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 9739530**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/04/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM, CNPJ: 14.563.488/0001-70**, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do **NOME/RAZÃO SOCIAL** com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de abril de 2024.

**PEDIDO Nº:** 0074273456  






PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000002212821

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 02/04/2024, às 09:49:07 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **0BD69943F851B5C5**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**  
**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:39 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **0172.C993.7901.002F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 22008826/2024

Expedição: 02/04/2024, às 09:37:15

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.563.488/0001-70, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

### Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Abrangência: Jurisdição de São Paulo - Capital

Certidão nº 241068 / 2024

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 01/04/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da



1 8 4 8 4 0 9 8 6 9 1 b K 2 r c V b

Certidão;

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02820

DATA: 15/05/2024 VENCI 17/05/2024 PAGTO: 15/05/2024

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA CEP:

**Discriminação...:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **172.562,96**

(cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e seis c  
entavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 172.562,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4442	/ 4	EX 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 172.562,96	RR\$ 0,00	RR\$ 8.628,15	RR\$ 163.934,81
TOTAL . . . . .					RR\$ 172.562,96	RR\$ 0,00	RR\$ 8.628,15	RR\$ 163.934,81

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 163.934,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		<b>RR\$ 163.934,81</b>
TOTAL . . . . .			RR\$ 163.934,81

Despesa paga em 15/05/2024 Com os recursos acima discriminados

  
AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO</b> PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 46643482/0001-07	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>4442 / 4</b>
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>4</b>	FICHA: 8002	DATA: 15/05/2024	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/05/2024
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios  800 TRANSF UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND 000 TRANSF UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido <b>163.937,81</b> Desconto <b>8.628,15</b>


EX	<b>SOMA</b>	<b>172.565,96</b>
----	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
238.177,20	230.207,09	172.565,96	7.970,11

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>172.565,96</b>
cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos *****	
DESCONTOS	

8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	8.628,15	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>8.628,15</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/05/2024	
-------------------------------------	---

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA \_\_\_\_\_ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora	DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM	<b>RECIBO</b>			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:04:45  
673906739 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2024  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.358.973  
VALOR TOTAL 8.628,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN M LOBATO \*FUNDO  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 3.F1B.227.C52.99B.64D

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.55  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA,AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 163.937,81

DEBITO EM: 15/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: E.C5E.86D.541.C3C.299

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>535</b>																	
			Data e Hora de Emissão <b>06/06/2024 17:25:05</b>																	
			Código de Verificação * <b>2AV2-BIEY</b>																	
			Série <b>NE</b>																	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																				
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BREL I</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>																				
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>																				
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>																				
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>																				
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>																				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/06/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>																				
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 6ª Medição Período: 11/05/2024 a 05/06/2024 Valor: R\$48.127,05  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1																				
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Valor do Serviço <b>R\$ 48.127,05</b></td> <td>Deduções <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo <b>R\$ 48.127,05</b></td> <td>Alíquota (%) <b>5,00</b></td> <td>Valor do ISS (R\$) <b>2.406,35</b></td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>								Valor do Serviço <b>R\$ 48.127,05</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 48.127,05</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>2.406,35</b>	Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
	Valor do Serviço <b>R\$ 48.127,05</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 48.127,05</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>2.406,35</b>														
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>														
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.127,05</b>																				
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 45.720,70</b>																				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																				
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO																				

\*A autenticidade desta Nota Fiscal dev erá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODRIGUES MIRELLES GOMES  
AREA SP-507/19/04  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

11.08.24



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



### Informações da obra

**Número de inscrição da obra** 90.017.25877/73 **Nome da obra** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

**Data do cadastramento** 04/12/2023 14:35 **Origem do cadastramento** e-CAC

**Tipo Zona** Zona Urbana **ART** **RRT** **CIB** **Cadastro imobiliário** 35878

**Data do início da obra** 10/11/2023 **CNAE** 4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

**Situação** Ativa **Data** 10/11/2023

### Endereço

**Pais** BRASIL **Município** MONTEIRO LOBATO **UF** SP **CEP** 12.250-000

**Bairro** Centro **Logradouro** RUA Antonio Alves Magalhães **Número** 20

### Responsável

**Nome** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA **CPF/CNPJ** 14.563.488/0001-70 **Vínculo** Dono da obra

**Data de início da responsabilidade** 10/11/2023 **Data de término da responsabilidade**

### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Mista	831,73 m <sup>2</sup>

### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Mista	Estacionamento Térreo	0,00 m <sup>2</sup>	502,00 m <sup>2</sup>	502,00 m <sup>2</sup>

### Área Resultante

**Área Resultante da Obra**  
1.333,73 m<sup>2</sup>

Data da consulta: 11/06/2024 12:01:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Reten ISS - R\$ 2.406,35

⑩



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE OBRAS



**MEMORANDO 24119/2024**

**A/C: Secretaria de Finanças**

**De: Secretaria de Obras**

**Ref.: 6º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.**

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 6º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de R\$56.100,16 dividido nas seguintes notas fiscais, nº535 e nº536. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 10 de junho de 2024.

LUÍZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 50711/9131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Luiz Rodolfo Meirelles Gomes**  
**Secretário de Obras**


**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI**

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO							
BDI = 25%				DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA			
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UP-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
					S/ BDI	C/ BDI	
1	01	<b>SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO</b>					
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.561,02	1.938,77	19.387,70
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
1.8	01.21.110	SONDAAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70
							<b>72.378,63</b>
2	02	<b>INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA</b>					
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96

6ª MEDIÇÃO - 03/06/2024			
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
1,00	783,98	11,11%	1.567,96
1,00	1.153,90	11,11%	2.307,80
	-	0,00%	6.478,65
	-	0,00%	-
	-	0,00%	976,46
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-
	-	0,00%	-

							<b>45.869,99</b>		
<b>3</b>	<b>06</b>	<b>SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>							
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	10,00	39,47	49,33	493,30		
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30		
							<b>646,60</b>		
<b>4</b>	<b>08</b>	<b>ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM</b>							
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m².mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12		
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³	783,00	10,01	12,51	9.795,33		
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19		
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96		
4.5	08.06.040	BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	m	10,00	21,02	26,27	262,70		
							<b>24.906,30</b>		
<b>5</b>	<b>09</b>	<b>FORMA</b>							
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60		
							<b>84.975,60</b>		
<b>6</b>	<b>10</b>	<b>ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL</b>							
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08		
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47		
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28		
							<b>265.520,83</b>		
<b>7</b>	<b>11</b>	<b>CONCRETO, MASSA E LASTRO</b>							
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28		
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73		
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90		
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	39,19	125,27	156,58	6.136,37		
							<b>122.876,28</b>		
<b>8</b>	<b>12</b>	<b>FUNDACAO PROFUNDA</b>							
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38		
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50		
							<b>32.282,88</b>		
<b>9</b>	<b>13</b>	<b>LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS</b>							
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77		
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04		
							<b>167.421,81</b>		
<b>10</b>	<b>14</b>	<b>ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR</b>							

	<b>1.937,88</b>		<b>11.330,87</b>
	-	0,00%	0,00
	-	0,00%	-
			<b>0,00</b>
	-	0,00%	11.463,12
	-	0,00%	9.795,33
	-	0,00%	2.076,19
	-	0,00%	1.308,96
	-	0,00%	262,70
	-		<b>24.906,30</b>
106,72	18.863,83	22,20%	66.111,78
-	<b>18.863,83</b>		<b>66.111,78</b>
	-	0,00%	53.704,17
	-	0,00%	19.613,85
	-	0,00%	75.641,28
	-		<b>148.959,30</b>
	-	0,00%	29.322,28
46,80	22.726,55	33,85%	18.861,09
46,80	4.724,93	23,29%	10.251,48
0,80	125,26	2,04%	6.011,11
	<b>27.576,74</b>		<b>64.445,96</b>
	-	0,00%	-
	-	0,00%	27.552,24
	-		<b>27.552,24</b>
	-	0,00%	67.836,77
	-	0,00%	99.585,04
	-		<b>167.421,81</b>

B

10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	m²	800,50	66,27	82,83	66.305,41		-	0,00%	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	m²	812,00	80,93	101,16	82.141,92	70,20	7.101,43	8,65%	75.040,49
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00		-	0,00%	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63		-	0,00%	10.034,63
							171.490,96		7.101,43		164.389,53
<b>11</b>	<b>15</b>	<b>ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO</b>									
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27		-	0,00%	46.132,27
							46.132,27		-		46.132,27
<b>12</b>	<b>16</b>	<b>TELHAMENTO</b>									
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20		-	0,00%	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37		-	0,00%	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57		-	0,00%	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09		-	0,00%	15.392,09
							66.411,23		-		66.411,23
<b>13</b>	<b>17</b>	<b>REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL</b>									
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	m³	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00		-	0,00%	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m³	18,40	508,35	635,43	11.691,91		-	0,00%	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00		-	0,00%	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00		-	0,00%	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	m²	2.286,62	8,76	10,95	25.060,38		-	0,00%	25.060,38
							122.001,29		-		122.001,29
<b>14</b>	<b>18</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO</b>									
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37		-	0,00%	79.178,37
14.2	18.06.182	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34		-	0,00%	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44		-	0,00%	13.291,44

14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM. TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	936,38	55,06	68,82	84.441,67	-	0,00%	64.441,67
							158.645,82	-		158.645,82
15	19	<b>REVESTIMENTO EM PEDRA</b>								
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	146,10	118,12	147,65	21.571,66	-	0,00%	21.571,66
							21.571,66	-		-
16	21	<b>REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO</b>								
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00	-	0,00%	34.167,00
16.2	21.10.061	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	-	0,00%	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	m	34,50	19,15	23,93	825,58	-	0,00%	825,58
							39.926,96	-		39.926,96
17	22	<b>FORRO, BRISE E FACHADA</b>								
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	-	0,00%	61.870,06
							61.870,06	-		61.870,06
18	23	<b>ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA</b>								
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	-	0,00%	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	-	0,00%	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	-	0,00%	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	-	0,00%	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	-	0,00%	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58	-	0,00%	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	-	0,00%	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80	-	0,00%	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40	-	0,00%	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	un	16,90	44,29	55,36	935,58	-	0,00%	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	m	16,90	6,82	8,52	143,98	-	0,00%	143,98
							82.326,65	-		82.326,65
19	24	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO</b>								
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47	-	0,00%	26.314,47

19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95	-	0,00%	1.343,95
						<b>27.658,42</b>				
<b>20</b>	<b>25</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO</b>								
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76	-	0,00%	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69	-	0,00%	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36	-	0,00%	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68	-	0,00%	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16	-	0,00%	12.536,16
						<b>96.470,65</b>				
<b>21</b>	<b>26</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>								
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	m²	1,50	420,84	526,05	789,07	-	0,00%	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49	-	0,00%	1.985,49
						<b>2.774,56</b>				
<b>22</b>	<b>27</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>								
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52	-	0,00%	19.658,52
						<b>19.658,52</b>				
<b>23</b>	<b>28</b>	<b>FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>								
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32	-	0,00%	1.231,32
						<b>1.231,32</b>				
<b>24</b>	<b>30</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>								
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62	-	0,00%	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	un	7,00	95,90	119,87	839,09	-	0,00%	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18	-	0,00%	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91	-	0,00%	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05	-	0,00%	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62	-	0,00%	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	2,00	170,78	213,47	426,94	-	0,00%	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55	-	0,00%	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40	-	0,00%	7.453,40

24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 8 LITROS	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85	-	0,00%	5.304,85	
										33.781,21	
<b>25</b>	<b>32</b>	<b>IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA</b>									
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01	-	0,00%	9.013,01	
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46	36,00	620,28	30,82%	1.392,18
										10.405,19	
										11.025,47	
<b>26</b>	<b>33</b>	<b>PINTURA</b>									
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47	-	0,00%	21.315,47	
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63	-	0,00%	54.458,63	
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09	-	0,00%	27.992,09	
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21	-	0,00%	2.624,21	
										106.390,40	
<b>27</b>	<b>34</b>	<b>PAISAGISMO E FECHAMENTOS</b>									
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	m³	4,55	149,63	187,03	850,98	-	0,00%	850,98	
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	m²	42,26	1,31	1,63	68,88	-	0,00%	68,88	
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	68,70	10,88	13,60	934,32	-	0,00%	934,32	
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32	-	0,00%	1.354,32	
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	un	15,00	29,53	36,91	553,65	-	0,00%	553,65	
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	un	2,00	29,95	37,43	74,86	-	0,00%	74,86	
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	un	2,00	89,11	111,38	222,76	-	0,00%	222,76	
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	un	13,00	41,88	52,35	680,55	-	0,00%	680,55	
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60	-	0,00%	26.613,60	
										31.353,92	
<b>28</b>	<b>37</b>	<b>QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>									
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	un	1,00	500,24	625,30	625,30	-	0,00%	625,30	
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68	-	0,00%	5.055,68	
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50	-	0,00%	1.172,50	
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92	-	0,00%	2.875,92	
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64	-	0,00%	1.294,64	
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60	-	0,00%	3.885,60	
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10	-	0,00%	1.112,10	

28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84	-	0,00%	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60	-	0,00%	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20	-	0,00%	2.800,20
							<b>32.083,38</b>			<b>32.083,38</b>
<b>29</b>	<b>38</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA</b>								
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60	-	0,00%	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40	-	0,00%	3.209,40
							<b>18.566,00</b>			<b>18.566,00</b>
<b>30</b>	<b>39</b>	<b>CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>								
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	-	0,00%	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60	-	0,00%	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	-	0,00%	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	-	0,00%	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	m	10,00	28,39	35,48	354,80	-	0,00%	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	-	0,00%	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20	-	0,00%	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	-	0,00%	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00	-	0,00%	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	-	0,00%	9.095,40
							<b>50.884,50</b>			<b>50.884,50</b>
<b>31</b>	<b>40</b>	<b>DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>								
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90	-	0,00%	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	cj	6,00	22,60	28,25	169,50	-	0,00%	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30	-	0,00%	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	20,00	21,59	26,98	539,60	-	0,00%	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	cj	6,00	28,12	35,15	210,90	-	0,00%	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58	-	0,00%	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	cj	4,00	25,45	31,81	127,24	-	0,00%	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82	-	0,00%	1.615,82
							<b>6.837,84</b>			<b>6.837,84</b>
<b>32</b>	<b>41</b>	<b>ILUMINACAO</b>								
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	-	0,00%	1.521,69

32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98	-	0,00%	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04	-	0,00%	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3890 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	-	0,00%	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	-	0,00%	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60	-	0,00%	16.053,60
							<b>52.126,72</b>			<b>52.126,72</b>
<b>33</b>	<b>43</b>	<b>APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.</b>								
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60	-	0,00%	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	un	2,00	182,07	227,58	455,16	-	0,00%	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	un	1,00	359,17	448,96	448,96	-	0,00%	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43	-	0,00%	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	-	0,00%	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92	-	0,00%	40.780,92
							<b>80.125,17</b>			<b>80.125,17</b>
<b>34</b>	<b>44</b>	<b>APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS</b>								
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPAS - 6 LITROS	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85	-	0,00%	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	-	0,00%	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	un	6,00	99,71	124,63	747,78	-	0,00%	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25	-	0,00%	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80	-	0,00%	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un	10,00	69,91	87,38	873,80	-	0,00%	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16	-	0,00%	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	0,00%	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	-	0,00%	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	0,00%	1.874,21

34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	-	0,00%	1.512,60
							<b>23.594,07</b>			23.594,07
<b>35</b>	<b>46</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.</b>								
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60	-	0,00%	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	-	0,00%	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	26,52	33,15	397,80	-	0,00%	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	-	0,00%	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	-	0,00%	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	88,85	111,06	666,36	-	0,00%	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	-	0,00%	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00	-	0,00%	8.484,00
							<b>37.030,14</b>			37.030,14
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>								
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	un	4,00	106,87	133,58	534,32	-	0,00%	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	un	4,00	190,80	238,50	954,00	-	0,00%	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	-	0,00%	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	6,00	76,61	95,76	574,56	-	0,00%	574,56
							<b>3.665,44</b>			3.665,44
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>								
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	-	0,00%	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	un	3,00	95,12	118,90	356,70	-	0,00%	356,70
							<b>9.706,26</b>			9.706,26
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>								
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16	-	0,00%	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20	-	0,00%	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	un	2,00	354,29	442,86	885,72	-	0,00%	885,72

38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4'	un	10,00	12,94	16,17	161,70
							<b>9.458,78</b>
<b>39</b>	<b>54</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>					
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98
39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ. E EM AREIA	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
							<b>84.402,89</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.326.081,38</b>			

	-	0,00%	161,70
	-		9.458,78
	-	0,00%	1.967,35
	-	0,00%	16.746,49
	-	0,00%	12.355,98
	-	0,00%	53.333,07
	-		84.402,89

<b>TOTAL GERAL 6ª MEDIÇÃO</b>	<b>56.100,16</b>
<b>% MEDIDO</b>	<b>2,41%</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>313.872,28</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>	<b>1.439.439,99</b>

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2024

  
Luis Gustavo de Barros  
Responsável Técnico  
CREA 5062695430

ADM FABRICAÇÃO E  
MONTAGEM DE ESTRUTURAS  
METÁLICAS - EIRELI

14.563.488/0001-70

  
LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 807119341  
SEC. Munic. DE OBRAS



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE  
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE  
**MONTEIRO  
LOBATO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**DATA:** 04/06/2024

**RELATÓRIO Nº:**  
06/2023

**CONFERIDO:**

Fiscal do contrato

**AUTOR:**

**CONTRATO:** 097/2023

Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

**CREA:** SP-5062695430

DATA: 04/06/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>	FOLHA: 2 / 11
<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO</b>		

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1 e 2: Execução estaca hélice.

<b>Autor:</b>  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
---	---

<p>DATA: 04/06/2024</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO</b></p>	<p align="right">FOLHA: 3 / 11</p>
-----------------------------	---	------------------------------------



Foto 3 e 4: Execução estaca hélice.



Foto 5 e 6: Escavação da fundação do muro de arrimo.

<p><b>Autor:</b></p> <p align="center"> <b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430</p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p>
---	---

DATA:  
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 11


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 7, 8 e 9: Escavação da fundação do muro de arrimo.



Foto 10 e 11: Arrasamento da cabeça da estaca do muro de arrimo.



Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 12 e 13: Execução da ferragem das vigas baldrame e dos blocos.



Foto 14 e 15: Execução da ferragem das vigas baldrame e dos blocos.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

<p>DATA: 04/06/2024</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO</b></p>	<p align="right">FOLHA: 6 / 11</p>
-----------------------------	---	------------------------------------



Foto 16: Execução da forma das vigas baldrame e dos blocos.



Foto 17 e 18: Concretagem das vigas baldrame e dos blocos.

<p><b>Autor:</b></p> <p align="center"> <b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430</p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p>
---	---

DATA:  
04/06/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 7 / 11

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO**



Foto 19 e 20: Concretagem das vigas baldrame e dos blocos.



Foto 21 e 22: Concretagem das vigas baldrame e dos blocos.

**Autor:**

**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

**Conferido:**

**FISCAL DO CONTRATO**

DATA:  
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 8 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 23 e 24: Execução da ferragem dos pilares.

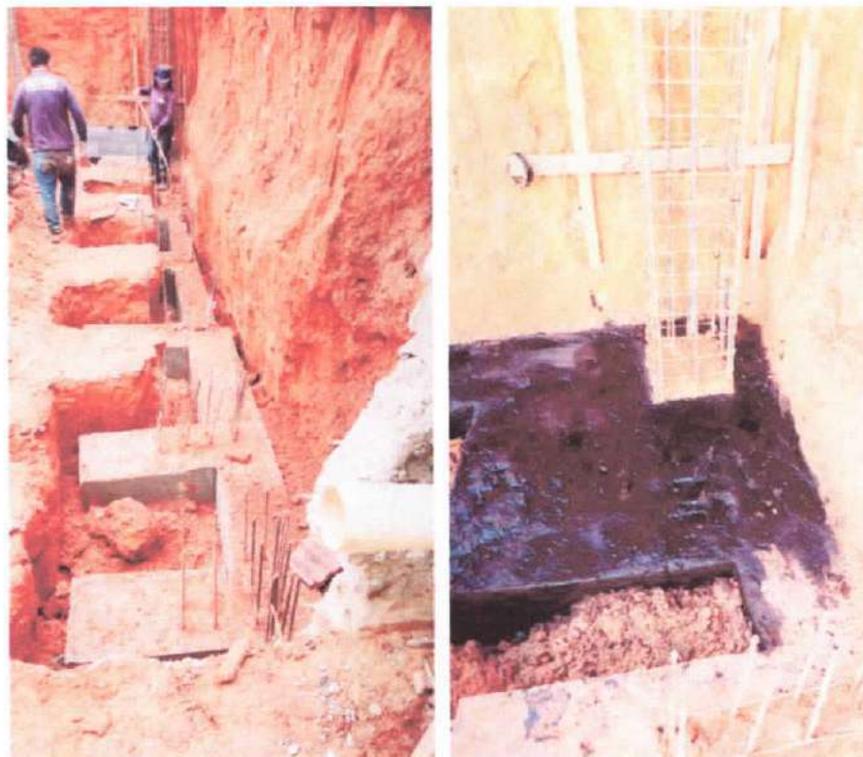



Foto 25 e 26: Remoção das formas e aplicação de impermeabilizante nos blocos e nas vigas baldrame.



Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 9 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 27 e 28: Aplicação de impermeabilizante nos blocos e nas vigas baldrame



Foto 29 e 30: Elevação do muro de arrimo.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 10 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 31, 32 e 33: Drenagem do muro de arrimo.



Foto 34 e 35: Elevação do muro de arrimo.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
04/06/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 11 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 6ª MEDIÇÃO



Foto 36 e 37: Execução da ferragem da viga intermediária.



Foto 38 e 39: Execução das formas dos pilares e da viga intermediária.

LUIZ RODOLFO MENEZES  
CREA: 82.577.119/51  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	04/06/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

<b>Observações:</b>	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	EXECUÇÃO DAS FORMAS DOS PILARES
2	EXECUÇÃO DA FERRAGEM DA VIGA INTERMEDIARIA
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

<b>Observações:</b>



\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO



\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	03/06/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO			
2	EXECUÇÃO DAS FORMAS DOS PILARES			
3	EXECUÇÃO DA FERRAGEM DA VIGA INTERMEDIARIA			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	31/05/2023		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo	
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo	

Observações:	

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO
2	COLOCAÇÃO DE BRITA DA DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Observações:

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 30/05/2023

**CONDIÇÕES CLIMÁTICAS**

<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO
2	COLOCAÇÃO DE BRITA DA DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	29/05/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO
2	APLICAÇÃO DE MASSA DE CIMENTO E COLOCAÇÃO DO TUBO DE DRENO E MANTA BIDIM DO MURO DE ARRIMO
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	28/05/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	REMOÇÃO DAS FORMAS DA FUNDAÇÃO			
2	APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NA VIGA BALDRAME E BLOCOS			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	27/05/2023		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	COLOCAÇÃO DE LONA NO TALUDE
2	LOCAÇÃO E AMARRAÇÃO DOS PILARES DO MURO DE ARRIMO
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Observed:


ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 25/05/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	FECHAMENTO DAS CAIXARIAS DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO
2	CONCRETAGEM DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO
3	CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME DO MURO DE ARRIMO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO: 10/11/2023 TERMINO 10/08/2024

DATA: 24/05/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS MANHÃ [x] Sem chuva [ ] Com chuva [ ] Improdutivo TARDE [x] Sem chuva [ ] Com chuva [ ] Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / Ocorrências / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

Table with 2 columns: Numbered list (1-19) and Description of services (e.g., ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO, ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS, etc.)

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	23/05/2023		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:	

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO
2	ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS
3	FECHAMENTO DE CAIXARIAS DA SAPATA E VIGA BALDRAME
4	COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA
5	LIGAÇÃO DE PONTO ELÉTRICO 220V TRIFASICO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Observações:

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	22/05/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo	
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo	

<b>Observações:</b>	
---------------------	--

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO
2	ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS
3	LOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME
4	PONTEAMENTO NOS ARRANQUE DOS PILARES
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

<b>Observações:</b>	

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	21/05/2023		


<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo	
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo	
<b>Observações:</b>					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO
2	ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS
3	LOCAÇÃO DOS BLOCOS E VIGA BALDRAME DO MURO DE ARRIMO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 20/05/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO
2	ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

**Observações:**

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	17/05/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
<b>Observações:</b>				

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	16/05/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
<b>Observações:</b>				

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 15/05/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO**      10/08/2024

**DATA:** 14/05/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 13/05/2023


<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


**Observações:**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA PARA COLOCAÇÃO DAS SAPATAS DO MURO DE ARRIMO
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	11/05/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**


#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS
2	IDENTIFICAÇÃO DAS ESTACAS PERFURADAS E CONCRETADAS COM CONCRETO USINADO
3	REMOÇÃO DE ACÚMULO DE TERRA EXTRAÍDO DAS PERFURAÇÕES
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

#### Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL





### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	10/05/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

<b>Observações:</b>	

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PERFURAÇÃO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS
2	IDENTIFICAÇÃO DAS BROCAS PERFURADAS E CONCRETADAS COM CONCRETO USINADO
3	REMOÇÃO DE ACUMULO DE TERRA EXTRAÍDO DAS PERFURAÇÕES
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

<b>Observações:</b>

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**  
**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:12:39 do dia 21/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2024.

Código de controle da certidão: **0172.C993.7901.002F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácara Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 262/2024

Processo nº 139305/2024

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

**CERTIFICA-SE** ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

# Assinatura Digital

O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/08/2001.



## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

### Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Certidão nº 401791 / 2024

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 04/06/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



1 8 5 9 8 2 8 7 4 3 D M D V 8 x 6 L

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000002812528

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 29/04/2024, às 14:15:08 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **05EB855596B27404**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.563.488/0001-70  
**Razão Social:** A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI  
**Endereço:** ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/05/2024 a 18/06/2024

**Certificação Número:** 2024052005431877731517

Informação obtida em 05/06/2024 17:24:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24050520280-60  
Data e hora da emissão 15/05/2024 14:15:58  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000002812396

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 29/04/2024, às 14:12:18 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **F2B57873B1D0B3A4**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br – Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

**CNPJ:** 14.563.488/0001-70

**CERTIDÃO EMITIDA** em 05/06/2024, às 17:27:31

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**Data do processamento dos dados:** 03/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Q8PVj0PWInM1e94**.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 1517578**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM**, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de junho de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0076088002**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 39405101/2024

Expedição: 05/06/2024, às 17:25:57

Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03300

DATA: 11/06/2024 VENCI 14/06/2024 PAGTO: 11/06/2024

Credor.: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade.: GUARATINGUETA

CEP:

**Discriminação..:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **48.127,05**

(quarenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 48.127,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
340	/ 1	GL 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 48.127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.406,35	RR\$ 45.720,70
TOTAL . . . . .					RR\$ 48.127,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.406,35	RR\$ 45.720,70

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 45.720,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 45.720,70
TOTAL. . . . .			RR\$ 45.720,70

Despesa paga em 11/06/2024 Com os recursos acima discriminados

  
AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

340 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>1</b>	FICHA: 307	DATA: 11/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/06/2024
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND 000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-Convên	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido <b>45.720,70</b> Desconto <b>2.406,35</b>

GL	<b>SOMA</b>	<b>48.127,05</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268.122,04	48.127,05	48.127,05	1.219.994,99

**VALOR A SER PAGO R\$****48.127,05**

quarenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e cinco centavos \*\*\*\*\*

## DESCONTOS

8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	2.406,35	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>2.406,35</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/06/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA <u>                    </u> Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora	DATA <u>                    </u> Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO  _____  NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.01  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA  
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT  
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70  
VALOR: R\$ 45.720,70  
DEBITO EM: 11/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061102  
AUTENTICACAO SISBB: B.2DC.601.022.12F.AAF

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:39  
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.739.000.000.087
VALOR TOTAL	2.406,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6

NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

NR. AUTENTICACAO	F.FEC.800.589.6EB.A8E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

<b>Número de inscrição da obra</b> 90.017.2587773	<b>Nome da obra</b> ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA			
<b>Data do cadastramento</b> 04/12/2023 14:35	<b>Origem do cadastramento</b> e-CAC			
<b>Tipo Zona</b> Zona Urbana	<b>ART</b>	<b>RRT</b>	<b>CIB</b>	<b>Cadastro Imobiliário</b> 35878
<b>Data do início da obra</b> 10/11/2023	<b>CNAE</b> 4120400 Construção de edifícios			

### Situação da obra

<b>Situação</b> Ativa	<b>Data</b> 10/11/2023
--------------------------	---------------------------

### Endereço

<b>País</b> BRASIL	<b>Município</b> MONTEIRO LOBATO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 12.250-000
<b>Bairro</b> Centro	<b>Logradouro</b> RUA Antonio Alves Magalhães	<b>Número</b> 20	

### Responsável

<b>Nome</b> ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA	<b>CPF/CNPJ</b> 14.563.488/0001-70	<b>Vínculo</b> Dono da obra
<b>Data de início da responsabilidade</b> 10/11/2023	<b>Data de término da responsabilidade</b>	

### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Mista	831,73 m <sup>2</sup>

### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Mista	Estacionamento Térreo	0,00 m <sup>2</sup>	502,00 m <sup>2</sup>	502,00 m <sup>2</sup>

### Área Resultante

**Área Resultante da Obra**  
1.333,73 m<sup>2</sup>

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>536</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>06/06/2024 17:29:57</b>			
			Código de Verificação * <b>PH40-1U72</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - BREL I</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/06/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 6ª Medição Período: 11/05/2024 a 05/06/2024 Valor: R\$ 7.973,11  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço <b>R\$ 7.973,11</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 7.973,11</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>398,66</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.973,11</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.574,45</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
<b>- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b>						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ ROBERTO MERELLES GOMES  
CREA SP 68711/19131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**DOCUMENTOS DA  
MEDIÇÃO ESTÁ ANEXADO  
NA LIQUIDAÇÃO DA NF 535.**

Data da consulta: 11/06/2024 12:01:21

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Reten ISS - R\$ 398,66

10



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE OBRAS**



**MEMORANDO 24119/2024**

**A/C: Secretaria de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

**Ref.: 6ª Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.**

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 6ª Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de R\$56.100,16 dividido nas seguintes notas fiscais, n°535 e n°536. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 10 de junho de 2024.

**LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES**  
**CREA-SP 50711/9171**  
**SEC. MUNIC. DE OBRAS**

**Luiz Rodolfo Meirelles Gomes**  
**Secretário de Obras**

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03299

DATA: 11/06/2024 **VENCI 14/06/2024** PAGTO: 11/06/2024

Credor.: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade.: GUARATINGUETA

CEP:

**Discriminação...:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **7.973,11**

(sete mil, novecentos e setenta e três reais e onze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.973,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4442	/ 5	EX	010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 7.973,11	RR\$ 0,00	RR\$ 7.574,45
TOTAL . . . . .					RR\$ 7.973,11	RR\$ 0,00	RR\$ 398,66	RR\$ 7.574,45

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 7.574,45**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 7.574,45
TOTAL. . . . .			RR\$ 7.574,45


Despesa paga em 11/06/2024 Com os recursos acima discriminados

  
AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO</b>			<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 46643482/0001-07			<b>4442 / 5</b>	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>5</b>	FICHA: 8002	DATA: 11/06/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA		230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/06/2024
NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS		14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786	
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES		GUARATINGUETA		
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios  800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND 000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên		PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido <b>7.574,45</b> Desconto <b>398,66</b>	
<b>EX</b>			<b>SOMA</b>	
			<b>7.973,11</b>	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
238.177,20	238.177,20	7.973,11	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>7.973,11</b>		
sete mil, novecentos e setenta e três reais e onze centavos *..... *****				
DESCONTOS				
8	1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	398,66		
			<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
			<b>398,66</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		11/06/2024		
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
DATA		Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças		
EMITIDO EM		ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE		
DATA		DATA		
Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora		Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.		
DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				NOME: CNPJ/CPF:



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.01  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA  
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT  
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70  
VALOR: R\$ 7.574,45  
DEBITO EM: 11/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061101  
AUTENTICACAO SISBB: 7.53C.AB9.E40.B40.EF7



11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:39  
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2024
NR. DOCUMENTO	556.739.000.000.007
VALOR TOTAL	398,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6

NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

NR.AUTENTICACAO	3.74F.869.008.9EC.3F0
-----------------	-----------------------



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>540</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>05/07/2024 16:06:51</b>			
			Código de Verificação * <b>5K0F-HK4Z</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05/07/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 009/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 7ª Medição Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 Valor: R\$91.029,59  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço <b>R\$ 91.029,59</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 91.029,59</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>4.551,48</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 91.029,59</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 86.478,11</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MERELES GOMES  
CREA-SP 37719701  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

12.07.24



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DE OBRAS

**MEMORANDO 24132/2024**

**A/C: Secretaria de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

**Ref.: 7º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.**

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 7º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023, no valor total de R\$91.029,59 referente a seguinte nota fiscal, nº540. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 10 de julho de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Luiz Rodolfo Meirelles Gomes**  
**Secretário de Obras**



# ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 - I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP

QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
		0,00%	1,00	-
		0,00%	1,00	-
		0,00%	6,00	-
		0,00%	10,00	-
		0,00%	12,00	-
		0,00%	6,00	-
		0,00%	1,00	-
		0,00%	90,00	-
1,00	783,98	11,11%	8,00	783,98
1,00	1.153,90	11,11%	8,00	1.153,90
		0,00%	0,00	6.478,65
		0,00%	80,00	-
		0,00%	0,00	976,46
		0,00%	6,00	-
		0,00%	260,00	-
		0,00%	428,00	-

OBJETO	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)
						S/BDI	C/BDI	
	1	01	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO					
	1.1	01.02.071	PARCELER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUIDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
	1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72
	1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36
	1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.938,77	1.938,77	19.387,70
	1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	832,32	9.987,84	9.987,84
	1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38
	1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADE	lx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
	1.8	01.21.110	SONDADE DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70
								<b>72.378,63</b>
	2	02	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA					
	2.1	02.01.180	BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82
	2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10
	2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65
	2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80
	2.5	02.05.202	ANDARIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46
	2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00
	2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20
	2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96

15/07

3	06	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL						1.937,88				9.392,99
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1'2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1.5 M	m³	39,47	10,00	49,33	493,30	-	0,00%	10,00	10,00	0,00
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	12,27	10,00	15,33	153,30	-	0,00%	10,00	10,00	-
							646,60					0,00
4	08	ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM										
4.1	08.02.060	CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO	m².mês	5,86	1.566,00	7,32	11.463,12	-	0,00%	0,00	0,00	11.463,12
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO	m²	10,01	783,00	12,51	9.795,33	-	0,00%	0,00	0,00	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m²	102,53	16,20	128,16	2.076,19	2.076,19	100,00%	16,20	-	0,00
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	m²	12,93	81,00	16,16	1.308,96	1.308,96	100,00%	81,00	81,00	-
4.5	08.06.040	BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	m	21,02	10,00	26,27	262,70	262,70	100,00%	10,00	10,00	-
							24.906,30	3.647,95				21.258,45
5	09	FORMA										
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	141,41	480,74	176,76	84.975,60	54.182,24	63,76%	413,25	413,25	11.929,53
							84.975,60	54.182,24				11.929,53
6	10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL										
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	9,34	13.824,00	11,67	161.326,08	15.002,49	9,30%	10.507,66	10.507,66	38.701,69
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	11,02	2.073,60	13,77	28.653,47	3.078,28	10,78%	872,76	872,76	16.535,57
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	12,07	5.016,00	15,08	75.641,28	-	0,00%	0,00	0,00	75.641,28
							265.620,83	18.080,77				130.878,53
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO										
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBAMENTO	m³	374,13	62,70	467,66	29.322,28	-	0,00%	0,00	0,00	29.322,28
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBAMENTO	m³	388,49	138,24	485,61	67.130,73	10.100,69	15,05%	120,20	120,20	8.760,40
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	m³	80,77	200,94	100,96	20.286,90	2.099,97	10,35%	120,20	120,20	8.151,51
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	125,27	39,19	156,58	6.136,37	980,19	15,97%	7,06	7,06	5.030,92
							122.876,28	13.180,85				51.265,11
8	12	FUNDAÇÃO PROFUNDA										
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	tx	1.515,51	1,00	1.894,38	1.894,38	-	0,00%	1,00	1,00	-
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	m	54,03	450,00	67,53	30.388,50	-	0,00%	42,00	42,00	27.552,24
							32.282,88	-				27.552,24
9	13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS										
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	152,65	355,52	190,81	67.836,77	-	0,00%	0,00	0,00	67.836,77
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	167,30	476,21	209,12	99.585,04	-	0,00%	0,00	0,00	99.585,04
							167.421,81	-				167.421,81
10	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR										

45.869,99

646,60

24.906,30

84.975,60

265.620,83

122.876,28

32.282,88

167.421,81

167.421,81



10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	m²	800,50	66,27	82,83	66.305,41	0,00	0,00%	-	0,00	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	m²	812,00	80,93	101,16	82.141,92	70,20	0,00%	-	70,20	75.040,49
10.3	14.30.070	DIVISORIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00	0,00	0,00%	-	0,00	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESURA 100/70MM - 1ST / 1ST	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	0,00	0,00%	-	0,00	10.034,63
11	15	<b>ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO</b>				<b>171.490,96</b>						
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27	0,00	0,00%	-	0,00	46.132,27
12	16	<b>TELHAMENTO</b>				<b>46.132,27</b>						
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20	0,00	0,00%	-	0,00	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37	0,00	0,00%	-	0,00	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57	0,00	0,00%	-	0,00	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	0,00	0,00%	-	0,00	15.392,09
13	17	<b>REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL</b>				<b>66.411,23</b>						
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	m³	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00	0,00	0,00%	-	0,00	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m²	18,40	508,35	635,43	11.691,91	0,00	0,00%	-	0,00	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	0,00	0,00%	-	0,00	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	0,00	0,00%	-	0,00	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38	0,00	0,00%	-	0,00	25.060,38
14	18	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>				<b>122.001,29</b>						
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B.L.A., RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	0,00	0,00%	-	0,00	79.178,37
14.2	18.06.182	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO B.L.B., RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	0,00	0,00%	-	0,00	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	0,00	0,00%	-	0,00	13.291,44

14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m <sup>2</sup>	936,38	55,06	68,82	64.441,67	0,00%	-	0,00	64.441,67	158.645,82
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA					158.645,82					
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	146,10	118,12	147,65	21.571,66	0,00%	-	0,00	21.571,66	21.571,66
16	21	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO										
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m <sup>2</sup>	153,03	178,62	223,27	34.167,00	0,00%	-	0,00	34.167,00	34.167,00
16.2	21.10.061	RODAPE PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	0,00%	-	0,00	4.934,38	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	m	34,50	19,15	23,93	825,58	0,00%	-	0,00	825,58	39.926,96
17	22	FORRO, BRISE E FACHADA					39.926,96					
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	m <sup>2</sup>	718,00	68,94	86,17	61.870,06	0,00%	-	0,00	61.870,06	61.870,06
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA					61.870,06					
18.1	23.04.560	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	0,00%	-	0,00	9.271,38	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	0,00%	-	0,00	10.400,46	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	17,00	1.389,77	1.749,71	29.745,07	0,00%	-	0,00	29.745,07	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	0,00%	-	0,00	5.016,90	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	m <sup>2</sup>	0,90	133,79	167,23	150,50	0,00%	-	0,00	150,50	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m <sup>2</sup>	3,78	390,60	488,25	1.845,58	0,00%	-	0,00	1.845,58	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	0,00%	-	0,00	3.714,00	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80	0,00%	-	0,00	5.803,80	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40	0,00%	-	0,00	15.299,40	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	un	16,90	44,29	55,36	935,58	0,00%	-	0,00	935,58	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	m	16,90	6,82	8,52	143,98	0,00%	-	0,00	143,98	143,98
19	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO					82.326,65					
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47	0,00%	-	0,00	26.314,47	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	m <sup>2</sup>	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95	0,00%	-	0,00	1.343,95	1.343,95



25	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA												
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESURA DE 4 MM	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01				0,00%	0,00	9.013,01	
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46				0,00%	36,00	1.392,18	
						11.025,47						10.405,19		
26	33	PINTURA												
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	m³	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47				0,00%	0,00	21.315,47	
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIFORMO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63				0,00%	0,00	54.458,63	
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09				0,00%	0,00	27.992,09	
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21				0,00%	0,00	2.624,21	
						106.390,40						106.390,40		
27	34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS												
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	m³	4,55	149,63	187,03	850,98				0,00%	0,00	850,98	
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	m²	42,26	1,31	1,63	68,88				0,00%	0,00	68,88	
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	68,70	10,88	13,60	934,32				0,00%	0,00	934,32	
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALEA - H= 0,60 A 0,80 M	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32				0,00%	0,00	1.354,32	
27.5	34.03.120	ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M	un	15,00	29,53	36,91	553,65				0,00%	0,00	553,65	
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	un	2,00	29,95	37,43	74,86				0,00%	0,00	74,86	
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	un	2,00	89,11	111,38	222,76				0,00%	0,00	222,76	
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	un	13,00	41,88	52,35	680,55				0,00%	0,00	680,55	
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60				0,00%	0,00	26.613,60	
						31.353,92						31.353,92		
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA												
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	un	1,00	590,24	625,30	625,30				0,00%	0,00	625,30	
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68				0,00%	0,00	5.055,68	
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50				0,00%	0,00	1.172,50	
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	95,87	119,63	2.875,92				0,00%	0,00	2.875,92	
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64				0,00%	0,00	1.294,64	
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60				0,00%	0,00	3.885,60	
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10				0,00%	0,00	1.112,10	
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATE NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84				0,00%	0,00	8.719,84	
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60				0,00%	0,00	4.541,60	



28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20	0,00%	0,00	2.800,20
<b>32.083,38</b>										
29	38	<b>TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA</b>								
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60	0,00%	0,00	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40	0,00%	0,00	3.209,40
<b>18.566,00</b>										
30	39	<b>CONDUTOR E ENFIAÇAO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>								
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	0,00%	0,00	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60	0,00%	0,00	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	0,00%	0,00	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	0,00%	0,00	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	m	10,00	28,39	35,48	354,80	0,00%	0,00	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS, TELEFÔNICOS	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	0,00%	0,00	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20	0,00%	0,00	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	0,00%	0,00	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00	0,00%	0,00	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	0,00%	0,00	9.095,40
<b>50.884,50</b>										
31	40	<b>DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>								
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARA F., 400X400X150 MM	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90	0,00%	0,00	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	qj	6,00	22,60	28,25	169,50	0,00%	0,00	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	qj	90,00	18,30	22,87	2.058,30	0,00%	0,00	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	qj	20,00	21,59	26,98	539,60	0,00%	0,00	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	qj	6,00	28,12	35,15	210,90	0,00%	0,00	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	qj	49,00	17,94	22,42	1.098,58	0,00%	0,00	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	qj	4,00	25,45	31,81	127,24	0,00%	0,00	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82	0,00%	0,00	1.615,82
<b>6.837,84</b>										
32	41	<b>ILUMINAÇÃO</b>								
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	0,00%	0,00	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98	0,00%	0,00	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LMW - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04	0,00%	0,00	10.927,04



32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	0,00%	-	0,00	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	0,00%	-	0,00	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60	0,00%	-	0,00	16.053,60
							52.126,72				52.126,72
<b>33 APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GAS.</b>											
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60	0,00%	-	0,00	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	un	2,00	182,07	227,58	455,16	0,00%	-	0,00	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190MPH	un	1,00	359,17	448,96	448,96	0,00%	-	0,00	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43	0,00%	-	0,00	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	0,00%	-	0,00	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92	0,00%	-	0,00	40.780,92
							80.125,17				80.125,17
<b>34 APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS</b>											
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85	0,00%	-	0,00	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	0,00%	-	0,00	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	un	6,00	99,71	124,63	747,78	0,00%	-	0,00	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25	0,00%	-	0,00	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPOBANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80	0,00%	-	0,00	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M. COM VISOR	un	10,00	69,91	87,38	873,80	0,00%	-	0,00	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16	0,00%	-	0,00	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	4,00	34,59	43,23	172,92	0,00%	-	0,00	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	0,00%	-	0,00	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2"OU 3/4"	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	0,00%	-	0,00	1.874,21
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	0,00%	-	0,00	1.512,60
							23.594,07				23.594,07
<b>35 TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES.</b>											
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60	0,00%	-	0,00	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	0,00%	-	0,00	7.522,50

35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	26,52	33,15	397,80	0,00	0,00%	-	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	0,00	0,00%	-	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	0,00	0,00%	-	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	88,85	111,06	666,36	0,00	0,00%	-	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	0,00	0,00%	-	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00	0,00	0,00%	-	8.484,00
							<b>37.030,14</b>				<b>37.030,14</b>
36	47	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>									
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	un	4,00	106,87	133,58	534,32	0,00	0,00%	-	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, AÇIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	un	4,00	190,80	238,50	954,00	0,00	0,00%	-	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	0,00	0,00%	-	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	6,00	76,61	95,76	574,56	0,00	0,00%	-	574,56
							<b>3.685,44</b>				<b>3.685,44</b>
37	48	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>									
37.1	48.02.206	RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	0,00	0,00%	-	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	un	3,00	95,12	118,90	356,70	0,00	0,00%	-	356,70
							<b>9.706,26</b>				<b>9.706,26</b>
38	49	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>									
38.1	49.01.030	CAIXA SFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16	0,00	0,00%	-	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20	0,00	0,00%	-	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	un	2,00	354,29	442,86	885,72	0,00	0,00%	-	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 4'	un	10,00	12,94	16,17	161,70	0,00	0,00%	-	161,70
							<b>9.458,78</b>				<b>9.458,78</b>
39	54	<b>PAVIMENTACAO E PASSEIO</b>									
39.1	54.01.010	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANIZADA DE SUPERFICIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35	0,00	0,00%	-	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49	0,00	0,00%	-	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVACAO, COMPACTACAO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98	0,00	0,00%	-	12.355,98







# ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



# PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 05/07/2024

RELATÓRIO Nº:  
07/2023

CONFERIDO:  
Fiscal do contrato

CONTRATO: 097/2023

AUTOR:  
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

<p>DATA: 05/07/2024</p>	<p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO</b></p>	<p>FOLHA: 2 / 11</p>
-----------------------------	--	----------------------

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1 e 2: Abertura das sapatas e arrasamento da cabeça de estaca.

<p>Autor:</p> <p><i>Luis Gustavo de Barros</i></p> <p><b>Luis Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430</p>	<p>Conferido:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>FISCAL DO CONTRATO</p>
--	---

DATA:  
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 3 e 4: Abertura das sapatas e arrasamento da cabeça de estaca.



Foto 5 e 6: Abertura das sapatas e arrasamento da cabeça de estaca.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO

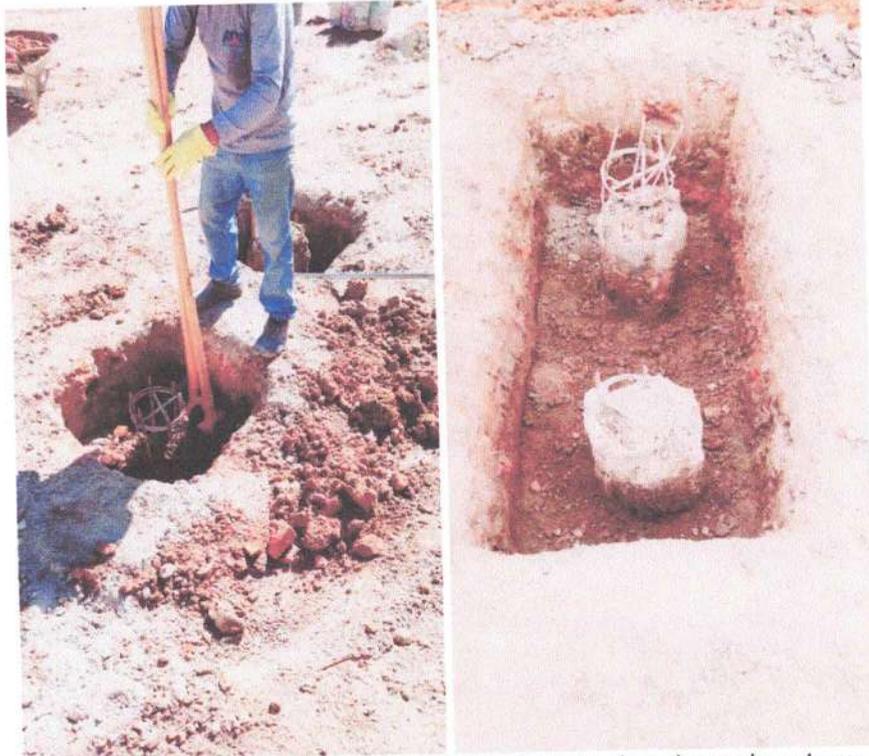


Foto 7 e 8: Abertura das sapatas e arrasamento da cabeça de estaca.



Foto 9 e 10: Abertura das sapatas e arrasamento da cabeça de estaca.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 11 e 12: Abertura da viga baldrame e arrasamento da cabeça de estaca.



Foto 13 e 14: Abertura da viga baldrame e arrasamento da cabeça de estaca.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 6 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO




Foto 15 e 16: Abertura da viga baldrame e arrasamento da cabeça de estaca.



Foto 17 e 18: Abertura da viga baldrame.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 7 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO

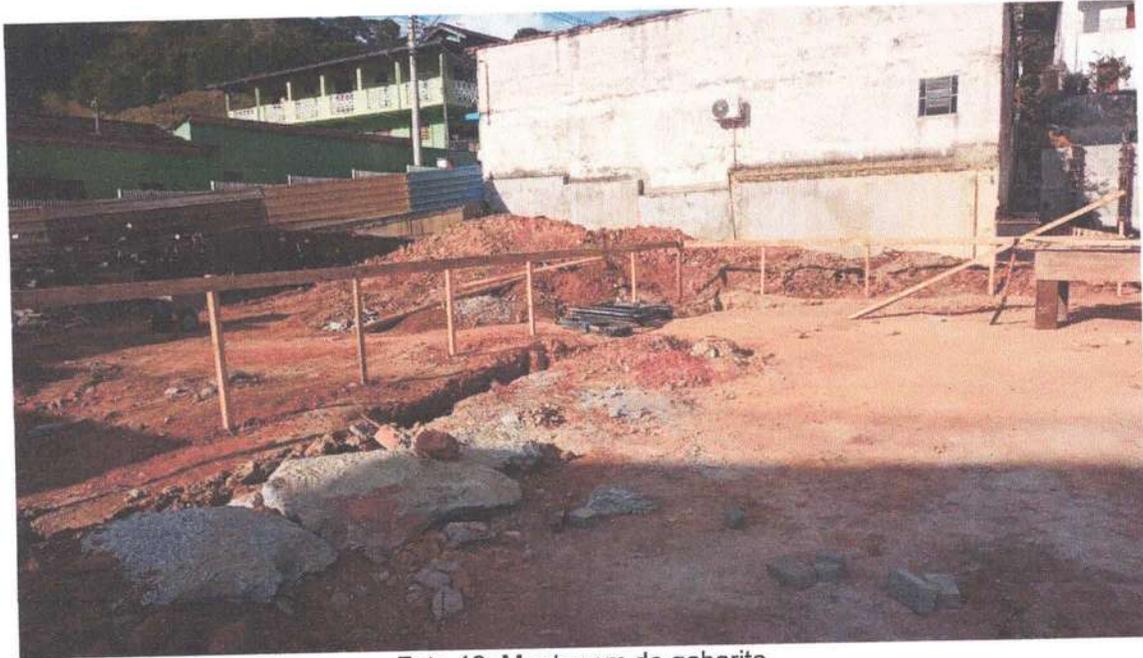


Foto 19: Montagem do gabarito.




Foto 20: Montagem do gabarito.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 8 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 21: Marcação dos eixos no gabarito.



Foto 22: Remoção de terra.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 9 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 23 e 24: Remoção de terra.



Foto 25: Remoção de terra.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 10 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 26 e 27: Montagem da ferragem da viga baldrame.



Foto 28 e 29: Montagem da ferragem e forma da viga baldrame.

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
05/07/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 11 / 11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 7ª MEDIÇÃO



Foto 30 e 31: Montagem da forma e colocação do lastro de brita da viga baldrame.

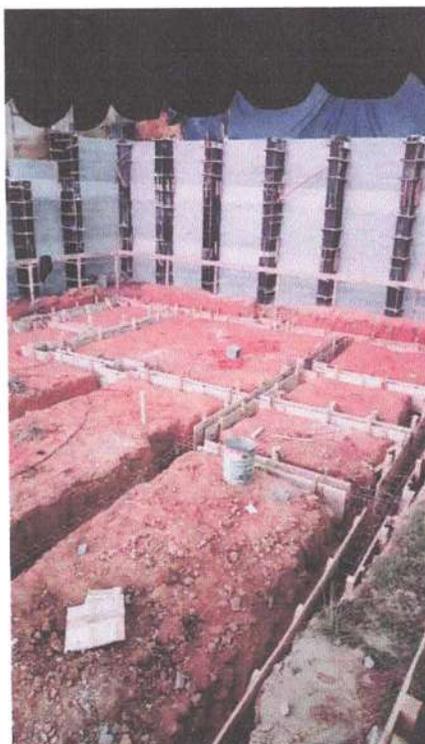


Foto 32: Forma da viga baldrame.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Autor:

Luis Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	03/06/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	ELEVAÇÃO DO MURO DE ARRIMO
2	EXECUÇÃO DAS FORMAS DOS PILARES
3	EXECUÇÃO DA FERRAGEM DA VIGA INTERMEDIARIA
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071110131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS  
  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA:

07/06/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA  
AMARRAÇÃO DOS PILARES DO MURO DE ARRIMO

Observações:

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	10/06/2023			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	DESFORMA CAIXARIA
3	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
4	ABERTURA DAS SAPATAS
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	11/06/2023		


CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Observações:


  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 12/06/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
4	LOCAÇÃO DAS VIGAS INTERMEDIARIAS DO MURO DE ARRIMO
5	FECHAMENTO DE CAIXARIA DAS VIGAS INTERMEDIARIAS DO MURO DE ARRIMO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA:

13/06/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	MONTAGEM DE FORMAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DAS VIGAS INTERMEDIARIAS DO MURO DE ARRIMO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	14/06/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	ABERTURA DE BALDRAME
4	CONCRETAGEM DAS VIGAS INTERMEDIARIAS DO MURO DE ARRIMO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 17/06/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	ABERTURA DE BALDRAME
4	DESFORMA DAS VIGAS INTERMEDIÁRIA DO MURO DE ARRIMO
5	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
6	ASSENTAMENTO E CONCRETAGEM DAS CANALETAS DE CIMENTO
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	18/06/2023		


<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	ABERTURA DE BALDRAME
4	ARRASAMENTO DAS CABEÇA DE ESTACAS
5	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



# RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	19/06/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	ABERTURA DE BALDRAME
4	LOCAÇÃO DAS VIGAS INTERMEDIÁRIA DO MURO DE ARRIMO
5	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
6	FECHAMENTO DE CAIXARIA DA VIGA INTERMEDIÁRIA DO MURO DE ARRIMO
7	CONCRETAGEM DA VIGA INTERMEDIÁRIA DO MURO DE ARRIMO
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

---



---



---



---



---



---




---



---

  
 \_\_\_\_\_  
 ENGENHEIRO

  
 \_\_\_\_\_  
 ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	20/06/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo


Observações:

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES DO MURO DE ARRIMO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Observações:

  
 \_\_\_\_\_  
 ENGENHEIRO

  
 \_\_\_\_\_  
 ENGENHEIRO FISCAL



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	21/06/2023			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	CONCRETAGEM DOS PILARES DO MURO DE ARRIMO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

ENDEREÇO:

RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

INÍCIO:

10/11/2023

TERMINO

10/08/2024

DATA:

24/06/2023

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

MANHÃ

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

TARDE

Sem chuva

Com chuva

Improdutivo

Observações:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1

REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA

2

ABERTURA DAS SAPATAS

3

ABERTURA DE BALDRAME COM MINI RETRO

4

REMOÇÃO DE TERRA COM CARREGADEIRA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Observações:

ENGENHEIRO

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	25/06/2023		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	ABERTURA DE BALDRAME
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	ASSENTAMENTO DE CANALETAS DE CIMENTO
4	CONCRETAGEM DAS CANALETAS E PILARES DO MURO DE ARRIMO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	26/06/2023		


CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DE BALDRAME
2	ABERTURA DAS SAPATAS
3	MONTAGEM DO GABARITO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

#### Observações:

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO

  
\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	27/06/2023			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	ABERTURA DE BALDRAME			
2	ABERTURA DAS SAPATAS			
3	MARCAÇÃO DOS EIXOS DO GABARITO			
4	ARRASAMENTO DAS CABEÇA DE ESTACAS			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>Observações:</b>				

  
ENGENHEIRO

  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 28/06/2023

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE TERRA ACUMULADA
2	ARRASAMENTO DAS CABEÇA DE ESTACAS
3	ABERTURA DE BALDRAME
4	ABERTURA DAS SAPATAS
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

**Observações:**

ENGENHEIRO

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119/31  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

ENGENHEIRO FISCAL



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 58135598

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 17/06/2024 08:04:29

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA**  
**Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região**  
**N. 2024/000002812528**

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 29/04/2024, às 14:15:08 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **05EB855596B27404**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000002812396

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão **emitida em**: 29/04/2024, às 14:12:18 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **F2B57873B1D0B3A4**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

**CNPJ:** 14.563.488/0001-70

**CERTIDÃO EMITIDA** em 05/06/2024, às 17:27:31

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**Data do processamento dos dados:** 03/06/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Q8PVj0PWInM1e94**.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.563.488/0001-70

**Razão Social:** A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI

**Endereço:** ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/06/2024 a 26/07/2024

**Certificação Número:** 2024062718471877731530

Informação obtida em 05/07/2024 14:58:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão n°: 39405101/2024

Expedição: 05/06/2024, às 17:25:57

Validade: 02/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.563.488 Nome Empregador: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS Qtd. Trabalhadores: 43 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 02/07/2024 Número da Guia: 0124070216294105-5 Emitida por: 50.638.273/0001-34 - VERTICE - SOLUCOES Data Emissão: 02/07/2024 11:33:00 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ADRIANO CESAR SALES TEIXEIRA	506	434.767.086-25	101	20/06/2024	Mensal	2.785,10	222,80	1,11	0,02	22,28	246,21
05/2024		ELISEU DE MORAES	515	060.507.028-60	101	20/06/2024	Mensal	2.785,10	222,80	1,11	0,02	22,28	246,21
05/2024		LUIZ ANTONIO DOS SANTOS	000502	144.712.048-58	101	20/06/2024	Mensal	2.288,03	183,04	0,91	0,02	18,30	202,27
Total do Tomador								7.858,23	628,64	3,13	0,06	62,86	694,69
Total do Estabelecimento								103.522,10	8.281,55	41,20	0,87	828,05	9.151,67
Total da Guia								103.522,10	8.281,55	41,20	0,87	828,05	9.151,67

CPF/CNPJ do Empregador  
14.563.488

Nome/Razão Social do Empregador  
ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124070216294105-5

Tag  
14563488 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**02/07/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**9.151,67**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	43	8.281,55	0,00	0,00	870,12	9.151,67
<b>Total Geral:</b>		<b>8.281,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,12</b>	<b>9.151,67</b>

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 11:33:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





**30**  
horas

## Comprovante de pagamento QR Code

### dados da conta debitada:

nome do pagador: **A DE M MENDES MANUTENCAO EIREL**  
CPF / CNPJ do pagador: **14.563.488/0001-70**  
instituição: **341**  
agência/conta: **7983 / 00120051**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*305000-\*\***  
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**  
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**  
nome do devedor: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE E**  
CPF / CNPJ do devedor: **14.563.488/0001-70**  
data de vencimento: **02/07/2024**  
data de validade: **02/07/2024**  
valor do documento: **9.151,67**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **9.151,67**  
valor da transação: **9.151,67**  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **845eb9474bf3430db48a35c09d5cbfb1**

### autenticação do comprovante:

**B0BEAF325FF39B1F48533FBCE629255163B56323**

### ID da transação:

**E60701190202407021813DY537FFNWM4**

### controle:

**005453399384098**

**Pagamento efetuado em 02/07/2024 às 15:13:50 via Sispag.**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 603/2024

Processo nº 141626/2024

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

**CERTIFICA-SE** ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 1517578**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM**, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de junho de 2024.

**PEDIDO Nº:**

**0076088002**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**  
**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:49:01 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **77B6.E714.43DF.9325**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

### Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Certidão nº 401791 / 2024

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 04/06/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



1 8 5 9 8 2 8 7 4 3 D M D V 8 x 6 L

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

reten ISS-5% = R\$ 4.551,48



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.41  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 86.478,11

DEBITO EM: 15/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 6.848.0B0.4A1.676.83B

---

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:22  
673906739 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2024
NR. DOCUMENTO	556.739.000.000.087
VALOR TOTAL	4.551,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF.MUNIC.MLOBATO - CONV  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 87-6  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

NR. AUTENTICACAO	8.4ED.985.E66.034.11B
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>550</b>																	
			Data e Hora de Emissão <b>08/08/2024 16:04:21</b>																	
			Código de Verificação * <b>B7KU-6A8G</b>																	
			Série <b>NE</b>																	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																				
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>																				
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>																				
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>																				
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>																				
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>																				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 08/08/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>																				
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 8ª Medição Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Valor: R\$ 87.518,74  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Valor do Serviço <b>R\$ 87.518,74</b></td> <td style="width: 15%;">Deduções <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo <b>R\$ 87.518,74</b></td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%) <b>5,00</b></td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$) <b>4.375,94</b></td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>								Valor do Serviço <b>R\$ 87.518,74</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 87.518,74</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>4.375,94</b>	Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
	Valor do Serviço <b>R\$ 87.518,74</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 87.518,74</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>4.375,94</b>														
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>														
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 87.518,74</b>																				
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 83.142,80</b>																				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																				
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO																				

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE OBRAS

**MEMORANDO 24156/2024**

**A/C: Secretaria de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

**Ref.: 8º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.**

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 8º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de R\$87.518,74 referente a seguinte nota fiscal, nº550. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 9 de agosto de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Luiz Rodolfo Meirelles Gomes**  
**Secretário de Obras**



**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI**  
 CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 - I.E. nº 332.225.640.110  
 Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguá – SP

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

BDI = 25%

8ª MEDIÇÃO - 05/08/2024

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP													
	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
						S/BDI	C/BDI							
1	01	<b>SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO</b>												
1.1	01.02.071	PARECER TECNICO DE FUNDAÇÕES, CONDIÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUIDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15	5.254,15	-	-	0,00%	1,00	-	
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72	6.710,72	-	-	0,00%	1,00	-	
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,05	2.643,56	15.861,36	15.861,36	-	-	0,00%	6,00	-	
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70	19.387,70	-	-	0,00%	10,00	-	
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	666,66	832,32	9.987,84	9.987,84	-	-	0,00%	12,00	-	
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38	5.545,38	-	-	0,00%	6,00	-	
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADEMI	lx	1,00	942,15	1.177,66	1.177,66	1.177,66	-	-	0,00%	1,00	-	
1.8	01.21.110	SONDADEMI DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70	8.453,70	-	-	0,00%	90,00	-	
										<b>72.378,53</b>				
2	02	<b>INICIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>												
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un/mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82	7.055,82	1,00	783,98	11,11%	9,00	-	
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVABO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,89 M²	un/mês	9,00	823,12	1.153,90	10.385,10	10.385,10	1,00	1.153,90	11,11%	9,00	-	
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un/mês	9,00	575,98	719,95	6.478,65	6.478,65	-	-	0,00%	0,00	6.478,65	
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80	7.704,80	-	-	0,00%	80,00	-	
2.5	02.05.202	ANDARIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m²	40,50	19,28	24,11	976,45	976,45	-	-	0,00%	0,00	976,45	
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00	5.085,00	-	-	0,00%	6,00	-	
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONÇOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO A DISPOSICÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20	1.734,20	-	-	0,00%	260,00	-	
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96	6.449,96	-	-	0,00%	428,00	-	
3	06	<b>SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>												
										<b>45.859,99</b>	<b>1.937,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>428,00</b>	<b>7.455,11</b>



10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	0%	m²	21,42	485,87	807,33	13.009,00	-	0,00%	0,00	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESURA 100/70MM - 1ST / 1ST	0%	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	0,00%	0,00	10.034,63
							171.480,98		70.574,97			93.714,55
<b>ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO</b>												
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	0%	m³	355,52	103,81	129,76	48.132,27	-	0,00%	0,00	48.132,27
							46.132,27					46.132,27
<b>TELHAMENTO</b>												
12.1	16.03.010	COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	0%	m²	480,00	48,86	58,57	26.942,20	-	0,00%	0,00	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	0%	m³	17,50	587,08	733,95	12.842,37	-	0,00%	0,00	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	0%	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57	-	0,00%	0,00	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	0%	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	-	0,00%	0,00	15.392,09
							66.411,23					66.411,23
<b>REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL</b>												
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	0%	m²	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00	-	0,00%	0,00	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	0%	m²	18,40	508,35	635,43	11.691,91	-	0,00%	0,00	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	0%	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	-	0,00%	0,00	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	0%	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	-	0,00%	0,00	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	0%	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38	-	0,00%	0,00	25.060,38
							122.001,29					122.001,29
<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>												
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PELS PARA AREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BILA, RESISTENCIA QUIMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	0%	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	-	0,00%	0,00	79.178,37
14.2	18.06.182	RODAPÊ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RUSTICA PELS PARA AREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BILA, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	0%	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	-	0,00%	0,00	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, ESPESURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	0%	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	-	0,00%	0,00	13.291,44
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	0%	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67	-	0,00%	0,00	64.441,67
							158.645,82					158.645,82
<b>REVESTIMENTO EM PEDRA</b>												
15.1	19.01.082	PETORIL, EOU SOLIEIRA EM GRANITO, ESPESURA DE 2 CM E LARGURA TE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	0%	m	146,10	118,12	147,65	21.571,66	-	0,00%	0,00	21.571,66
							21.571,66					21.571,66





PAISAGISMO E FECHAMENTOS										106.390,40		
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM	0%	m²	4,55	-149,63	187,03	850,98	-	0,00%	0,00	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULAZIÇÃO DE AREAS PARA AJARDINAMENTO	0%	m²	42,28	1,31	1,63	68,88	-	0,00%	0,00	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	0%	m²	88,70	10,88	13,80	934,32	-	0,00%	0,00	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉIA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32	-	0,00%	0,00	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M	0%	un	15,00	28,53	36,81	553,65	-	0,00%	0,00	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86	-	0,00%	0,00	74,86
27.7	34.04.130	ARVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	0%	un	2,00	89,11	111,38	222,76	-	0,00%	0,00	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCULIGO - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,88	52,35	680,55	-	0,00%	0,00	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	0%	m²	12,00	1774,24	2.217,80	28.613,60	-	0,00%	0,00	26.613,60
										31.353,92		
QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA										31.353,92		
28.1	37.01.180	QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	0%	un	1,00	500,24	925,30	625,30	-	0,00%	0,00	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	0%	un	4,00	1.011,14	1.283,92	5.055,68	-	0,00%	0,00	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAAMENTO DE COBRE NU	0%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50	-	0,00%	0,00	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A	0%	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92	-	0,00%	0,00	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A	0%	un	8,00	128,47	181,83	1.294,64	-	0,00%	0,00	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A	0%	un	24,00	129,52	181,90	3.885,60	-	0,00%	0,00	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A	0%	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10	-	0,00%	0,00	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACONJUNTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATE NH-2, 400 A - SEM FUSÍVEIS	0%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84	-	0,00%	0,00	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	0%	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60	-	0,00%	0,00	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATE 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	0%	un	4,00	580,04	700,05	2.800,20	-	0,00%	0,00	2.800,20
										32.083,38		
TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA										32.083,38		
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	0%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60	-	0,00%	0,00	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	0%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40	-	0,00%	0,00	3.209,40
										18.566,00		
CONDUTOR E ENFIAPAO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA										18.566,00		
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	0%	m	4.200,00	3,28	4,11	17.282,00	-	0,00%	0,00	17.282,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	0%	m	880,00	5,05	6,31	4.164,60	-	0,00%	0,00	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	0%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	-	0,00%	0,00	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	0%	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	-	0,00%	0,00	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80	-	0,00%	0,00	354,80

30.6	39 11 090	FIO TELEFONICO TIPO P80, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS	0%	m	400,00	3,07	3,88	1.692,00			0,00%	0,00	1.592,00
30.7	38 21 080	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM² ISOL. 0,6/KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	0%	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20			0,00%	0,00	4.219,20
30.8	38 21 070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM² ISOL. 0,6/KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	0%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50			0,00%	0,00	3.787,50
30.9	38 21 080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM² ISOL. 0,6/KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	0%	m	120,00	29,88	37,10	4.452,00			0,00%	0,00	4.452,00
30.10	38 21 090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM² ISOL. 0,6/KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	0%	m	180,00	40,43	50,63	9.095,40			0,00%	0,00	9.095,40
<b>R\$ 884,50</b>													
<b>31</b>													
<b>DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>													
31.1	40 02 100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF. 400X400X190 MM	0%	un	6,00	735,72	189,85	1.017,90			0,00%	0,00	1.017,90
31.2	40 04 080	TOMADA PARA TELEFONE AP. PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	0%	q	6,00	22,80	28,25	189,90			0,00%	0,00	189,90
31.3	40 04 450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	0%	q	90,00	18,30	22,87	2.058,30			0,00%	0,00	2.058,30
31.4	40 04 480	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	0%	q	20,00	21,58	25,68	539,60			0,00%	0,00	539,60
31.5	40 04 470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	0%	q	6,00	28,12	35,15	210,90			0,00%	0,00	210,90
31.6	40 06 020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	0%	q	49,00	17,84	22,42	1.098,58			0,00%	0,00	1.098,58
31.7	40 05 040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	0%	q	4,00	25,45	31,81	127,24			0,00%	0,00	127,24
31.8	40 10 108	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 AM0 A - 2P+2N	0%	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82			0,00%	0,00	1.615,82
<b>6.837,84</b>													
<b>32</b>													
<b>LUMINÁRIAS</b>													
32.1	41 10 080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	\$07,23	1.621,86			0,00%	0,00	1.621,86
32.2	41 10 430	POSTE TELECOMUNIC. RETO EM AÇO SAE 1010Y1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,88			0,00%	0,00	4.834,98
32.3	41 11 703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 1480 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MINIMA DE 118 LM/W - POTENCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.082,71	1.385,88	10.927,04			0,00%	0,00	10.927,04
32.4	41 31 040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANS. 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3980 A 4800 LM, POTENCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05			0,00%	0,00	7.874,05
32.5	41 31 090	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBITUR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1090 LM, POTENCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	98,00	128,42	180,52	10.915,36			0,00%	0,00	10.915,36
32.6	41 31 087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR REQUADO TRANS. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTENCIA DE 17 W A 19 W	0%	un	90,00	214,05	287,58	18.053,60			0,00%	0,00	18.053,60
<b>62.126,72</b>													
<b>33</b>													
<b>APARELHOS ELÉTRICOS, MÓDULO, ACION. E C.A.S.</b>													
33.1	43 02 080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W/ 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	0%	un	5,00	362,50	453,12	2.285,60			0,00%	0,00	2.285,60
33.2	43 04 020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,07	227,68	455,16			0,00%	0,00	455,16
33.3	43 05 080	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	0%	un	1,00	359,17	449,96	448,96			0,00%	0,00	448,96
33.4	43 07 300	AIR CONDITIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	0%	q	3,00	6.158,05	7.888,81	23.086,43			0,00%	0,00	23.086,43
33.5	43 07 320	AIR CONDITIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 96.000 BTU/H	0%	q	1,00	10.482,48	13.079,10	13.078,10			0,00%	0,00	13.078,10



36.2	47 01 210	VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, AÇIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	984,00	
36.3	47 02 020	REGISTRO DE GAIVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	
36.4	47 02 110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	6,00	76,61	95,76	574,56	
		<b>3.665,44</b>							
<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>									
37.1	48 02 206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	0%	un	3,00	2.483,22	3.116,52	9.349,56	
37.2	48 06 020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	356,70	
		<b>9.706,26</b>							
<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>									
38.1	49 01 030	CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	0%	un	28,00	82,53	103,16	2.682,16	
38.2	49 03 020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	60%	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20	
38.3	49 03 036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 18 L	0%	un	2,00	354,29	442,86	885,72	
38.4	49 06 010	GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,94	16,17	161,70	
		<b>9.468,78</b>							
<b>PAVIMENTACAO E PASSEIO</b>									
39.1	54 01 010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFICIE SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	0%	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35	
39.2	54 01 210	BASE DE BRITA GRADUADA	0%	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49	
39.3	54 01 400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98	
39.4	54 04 350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ E EM AREIA	0%	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07	
		<b>84.402,89</b>							
<b>TOTAL</b>							<b>2.326.081,38</b>	<b>84.402,89</b>	

Montreiro Lobato, 08 de agosto de 2024

Luis Gustavo de Barros

Responsável Técnico  
CREA 5062695430

ADM FABRICAÇÃO E  
MONTAGEM DE ESTRUTURAS  
METALICAS - EIRELI

14.563.488/0001-70

		-	0,00%	0,00	954,00
		-	0,00%	0,00	1.602,56
		-	0,00%	0,00	574,56
		-	0,00%	0,00	3.665,44
<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>					
		-	0,00%	0,00	9.349,56
		-	0,00%	0,00	356,70
		-	0,00%	0,00	9.706,26
<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>					
		-	0,00%	0,00	2.682,16
		12,00	60,00%	12,00	2.291,68
		-	0,00%	0,00	885,72
		-	0,00%	0,00	161,70
		3.437,52	0,00%	0,00	6.021,26
<b>PAVIMENTACAO E PASSEIO</b>					
		-	0,00%	0,00	1.967,35
		-	0,00%	0,00	16.746,49
		-	0,00%	0,00	12.355,98
		-	0,00%	0,00	53.333,07
		-	0,00%	0,00	84.402,89
<b>TOTAL GERAL 8ª MEDIÇÃO</b>					<b>87.518,74</b>
<b>% MEDIDO</b>					<b>3,76%</b>
<b>ACUMULADO</b>					<b>492.420,61</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>					<b>R\$ 1.833.660,77</b>

LUIZ RODRIGO MIRELLES GOMES  
CREA-SP 50419/21  
SOL. INGEN. DE OBRAS



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	01/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	1	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>		

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119431  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	02/07/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	1	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORRA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	03/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	04/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	05/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORRIMENTOS METALICOS		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	08/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>	FERIADO			

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME		
ENCARREGADO		ROMPEDOR		
PEDREIRO		BETONEIRA		
AJUDANTE		COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 09/07/2024

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

**Observações:** EMENDA DE FERIADO ( REPOSIÇÃO NO DIA 13/07/24 SÁBADO )

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME		
ENCARREGADO		ROMPEDOR		
PEDREIRO		BETONEIRA		
AJUDANTE		COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	10/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	2	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORRA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	11/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	ABERTURA DAS SAPATAS			
2	ABERTURA DE BALDRAME			
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS			
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA			
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>PESSOAL</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>
<b>FUNÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MODELO</b>	<b>QUANT.</b>	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	2	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORRIMENTOS METÁLICOS		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	12/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	2	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	13/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>	SÁBADO - REPOSIÇÃO DA EMENDA DO FERIADO DO DIA 08/07/24			

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	2	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	15/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	AMARRAÇÃO DE ARRANQUE DOS PILARES NO BALDRAME
2	CONCRETAGEM DOS BALDRAMES DA OBRA
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	2	ANDAIME	0	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	1	
PEDREIRO	4	BETONEIRA	2	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA	0	
		VIGA 1M	0	
		VIGA 2M	0	
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M	0	
		SERRA MÁRMORE	0	
		ESMERILHADEIRA	0	
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	16/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORRA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	17/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	RECEBIMENTO DE MATERIAL
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	18/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	AMARRAÇÃO DE ARRANQUES DOS PILARES NO BALDRAME
2	CONCRETAGEM DOS BALDRAMES DA OBRA
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	19/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ABERTURA DAS SAPATAS
2	ABERTURA DE BALDRAME
3	DEMOLIÇÃO DAS CABEÇAS DE ESTACAS
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
5	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
6	AMARRAÇÃO DE ARRANQUE DOS PILARES NO BALDRAME
7	CONCRETAGEM DOS BALDRAMES DA OBRA
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	22/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	DESFORMA DAS CAIXARIA DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E SAPATAS
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
4	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORRA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	23/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	DESFORMA DAS CAIXARIA DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E SAPATAS
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
4	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
5	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
6	RECEBIMENTO DOS BLOCOS
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	24/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	DESFORMA DAS CAIXARIA DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES E SAPATAS
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
4	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
5	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORRIMENTOS METALICOS		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023 **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 25/07/2024

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
2	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
3	CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME
4	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	2	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORRA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	26/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	FECHAMENTO DE CAIXARIA DO BALDRAME DA OBRA
2	COLOCAÇÃO DE VIGA BALDRAME DA OBRA
3	CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME
4	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	2	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	29/07/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME E SAPATAS
2	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
3	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
4	RECEBIMENTO DE MATERIAL
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	30/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input checked="" type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
3	AMARRAÇÃO DE PILAR
4	DESFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	31/07/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
3	AMARRAÇÃO DE PILAR
4	DESFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE  
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE  
**MONTEIRO  
LOBATO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 08/08/2024

RELATÓRIO Nº:  
08/2023

CONFERIDO:  
Fiscal do contrato

CONTRATO: 097/2023

AUTOR:  
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

DATA: 08/08/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL  RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO	FOLHA: 2 / 8
---------------------	--	--------------

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO


A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1: Desfôrma das vigas baldrame e blocos de coroamento

<b>Autor:</b>  Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
---	---



DATA:  
08/08/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3 / 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO



Foto 2: Impermeabilização com impermeabilizante asfáltico nas vigas baldrame e blocos de coroamento




Foto 3: Impermeabilização com impermeabilizante asfáltico nas vigas baldrame e blocos de coroamento

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO



<p>DATA: 08/08/2024</p>	<p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO</p>	<p>FOLHA: 4 / 8</p>
-----------------------------	---	---------------------



Foto 4: Assentamento da primeira fiada da alvenaria de blocos de cimento

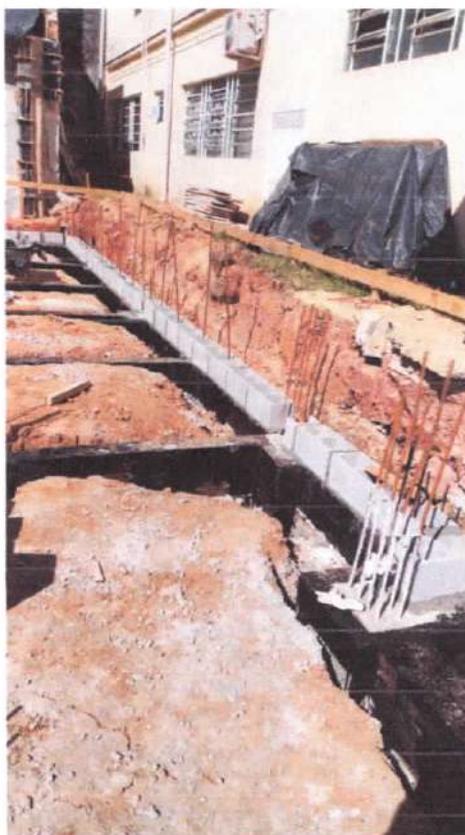



Foto 5: Assentamento da primeira fiada da alvenaria de blocos de cimento

<p>Autor:</p> <p><i>[Signature]</i> Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p>	<p>Conferido:</p> <p><i>[Signature]</i> FISCAL DO CONTRATO</p>
---	--



DATA:  
08/08/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO



Foto 6: Assentamento da alvenaria de blocos de cimento




Foto 7: Assentamento da alvenaria de blocos de cimento

Autor:

  
Luis Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO



DATA:  
08/08/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 6 / 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO



Foto 8: Assentamento da alvenaria de blocos de cimento




Foto 9: Assentamento da alvenaria de blocos de cimento

Autor:

Luis Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO



DATA:  
08/08/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 7 / 8

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO



Foto 10: Alvenaria das caixas de esgoto




Foto 11: Reboco das caixas de esgoto

Autor:

  
Luis Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO



<p>DATA: 08/08/2024</p>	<p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 8ª MEDIÇÃO</p>	<p>FOLHA: 8 / 8</p>
-----------------------------	---	---------------------



Foto 12: Tubulações das caixas de esgoto



Foto 13: Tubulações e caixas de esgoto

<p>Autor:</p> <p> Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430</p>	<p>Conferido:</p> <p> FISCAL DO CONTRATO</p>
--	---



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

**Número de inscrição da obra**  
90.017.25877773

**Nome da obra**  
ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

**Data do cadastramento**  
04/12/2023 14:35

**Origem do cadastramento e-CAC**

**Tipo Zona**  
Zona Urbana

**ART**

**RRT**

**CIB**

**Cadastro Imobiliário**  
35878

**Data do início da obra**  
10/11/2023

**CNAE**  
4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

**Situação**  
Ativa

**Data**  
10/11/2023

### Endereço

**País**  
BRASIL

**Município**  
MONTEIRO LOBATO

**UF**  
SP

**CEP**  
12.250-000

**Bairro**  
Centro

**Logradouro**  
RUA Antonio Alves Magalhães

**Número**  
20

### Responsável

**Nome**  
ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

**CPF/CNPJ**  
14.563.488/0001-70

**Vínculo**  
Dono da obra

**Data de início da responsabilidade**  
10/11/2023

**Data de término da responsabilidade**

### Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Mista	831,73 m <sup>2</sup>

### Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Mista	Estacionamento Térreo	0,00 m <sup>2</sup>	502,00 m <sup>2</sup>	502,00 m <sup>2</sup>

### Área Resultante

**Área Resultante da Obra**  
1.333,73 m<sup>2</sup>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.563.488 Nome Empregador: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS Qtd. Trabalhadores: 43 Origem: Gestao de Guias  
 Vencimento da Guia: 26/07/2024 Numero da Guia: 0124072619869381-4 Emitida por: 50.638.273/0001-34 - VERTICE - SOLUCOES Data Emissao: 26/07/2024 10:52:11 (Brasilia)

Relação de Trabalhadores

Empregador	Nome	Matricula	CPF	Carreira	Vencimento	Tipo	Deposito	Base	Valor FGTS	Juros	Atualiz.	Multas	Total	
14.563.488/0001-70	Tomador:	90.017.2587773						Total	na Guia		Monetaria			
06/2024	ADRIANO CESAR SALES TEIXEIRA	506	434.767.098-25	101	19/07/2024	Mensal		2.516,90	201,26	1,00	0,03	10,08	212,44	
06/2024	ALEX DE ALMEIDA FERNANDES	535	427.623.948-20	101	19/07/2024	Mensal		1.227,59	98,20	0,49	0,01	4,91	103,81	
06/2024	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PACHECO	536	404.237.059-65	101	19/07/2024	Mensal		991,59	79,32	0,39	0,01	3,96	83,86	
Total do Tomador								90.017.2587773	4.736,08	378,87	1,88	0,05	18,93	390,73
Total do Estabelecimento								14.563.488/0001-70	95.144,30	7.811,35	37,85	0,98	390,40	8.030,59
Total da Guia									95.144,30	7.811,35	37,85	0,99	390,40	8.030,59



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/00005343991

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 01/08/2024, às 14:08:55 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **5501B6DA9905254C**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 3386804**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 31/07/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ADM FABRICAÇÃO**, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de agosto de 2024.

PEDIDO Nº:

0078070225





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles - Guaratinguetá - SP - 12.505-470

**Certidão Fiscal NEGATIVA de débitos de Qualquer Natureza**

**Certidão nº 603/2024**

**Processo nº 141626/2024**

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no CNPJ 14.563.488/0001-70, com inscrição municipal 13-5546/01/ISS. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

**CERTIFICA-SE** ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

## Assinatura Digital

O presente documento recebe Assinatura Digital com Certificação Digital de acordo com as disposições normativas instituída pela Medida Provisória No 2200-2 de 24/09/2001.



## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

### Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Certidão n° 541132 / 2024

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 31/07/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do n° do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



1 8 5 9 2 9 3 0 5 4 M c M V W 4 W w

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000005344226

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 01/08/2024, às 14:11:53 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **5C64611584669627**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24080099490-46  
Data e hora da emissão 05/08/2024 15:06:08  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 59419949

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/08/2024 14:00:31

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.563.488/0001-70  
**Razão Social:** A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI  
**Endereço:** ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/07/2024 a 15/08/2024

**Certificação Número:** 2024071718321877731545

Informação obtida em 01/08/2024 14:35:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**  
**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:58:20 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **AA69.6E47.D16D.C087**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 14.563.488/0001-70  
Certidão n°: 52848101/2024  
Expedição: 01/08/2024, às 14:05:32  
Validade: 28/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
**SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO**

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

**CERTIDÃO EMITIDA em 01/08/2024, às 14:32:52**

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

**Data do processamento dos dados: 22/07/2024**

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **TYQ1mFRfqwmm4Ub**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
4. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
5. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
6. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de

2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por invalidez. O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por invalidez.

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07 Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04613

DATA: 13/08/2024 VENCI 16/08/2024 PAGTO: 13/08/2024

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA CEP:

**Discriminação...:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **87.518,74**

(oitenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*


Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 87.518,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
340	/ 3	GL 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 87.518,74	RR\$ 0,00	RR\$ 4.375,94	RR\$ 83.142,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 87.518,74	RR\$ 0,00	RR\$ 4.375,94	RR\$ 83.142,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 83.142,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 83.142,80
TOTAL. . . . .			RR\$ 83.142,80

Despesa paga em 13/08/2024 Com os recursos acima discriminados

  
AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

340 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>3</b>	FICHA: 307	DATA: 12/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/08/2024
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido
800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND		<b>83.142,80</b>
000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên		Desconto
		<b>4.375,94</b>

GL	<b>SOMA</b>	<b>87.518,74</b>
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268.122,04	226.675,38	87.518,74	1.041.446,66

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>87.518,74</b>
oitenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos .....	
DESCONTOS	

8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	4.375,94
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>4.375,94</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	12/08/2024	<i>Flavio Araujo</i>
--------------------------	------------	----------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
DATA	Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
DATA <u>                    </u> Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora	DATA <u>                    </u> Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
NOME: _____				CNPJ/CPF: _____



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
13/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.29  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 83.142,80

DEBITO EM: 13/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081301

AUTENTICACAO SISBB: 4.22F.3E8.EDE.9D3.6A6

13/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:48:22  
673986739 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.739.000.358.973
VALOR TOTAL	4.375,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN M LOBATO \*FUNDO  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

NR. AUTENTICACAO	A.385.158.785.000.A3A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE668488 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>559</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>12/09/2024 10:56:20</b>			
			Código de Verificação <b>USPA-HLE6</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 12/09/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 9ª Medição Período: 01/08/2024 a 31/08/2024 Valor: R\$ 154.343,51  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço <b>R\$ 154.343,51</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 154.343,51</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>7.717,18</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 154.343,51</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 146.626,33</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
<b>- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b>						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODRIGUES MENEZES GOMES  
CREA-SP 007110931  
SEC. MUNIC. DE ORÇ.  
10/08/2010

Data da consulta: 12/09/2024 15:40:01

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **14.563.488/0001-70**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Retenão

ISS\_5% = R\$ 7.717,18

Q



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DE OBRAS

**MEMORANDO 24170/2024**

**A/C: Secretaria de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

**Ref.: 9º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.**

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 9º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023, no valor total de R\$154.343,51 referente a seguinte nota fiscal, nº559. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 12 de setembro de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA SP 50711/9131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Luiz Rodolfo Meirelles Gomes**  
**Secretário de Obras**



# ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

13/09

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

OBJETO								9ª MEDIÇÃO - 05/09/2024			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP								QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)				
					S/ BDI	C/ BDI					
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO</b>									
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15	-	1,00	-	
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72	-	1,00	-	
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36	-	6,00	-	
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70	-	10,00	-	
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84	-	12,00	-	
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38	-	6,00	-	
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	tx	1,00	942,15	1.177,88	1.177,88	-	1,00	-	
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70	-	90,00	-	
							<b>72.378,53</b>				
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA</b>									
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82	-	9,00	0,00	
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10	-	9,00	-	
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65	1,00	719,85	5.758,80	
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80	-	80,00	-	
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46	-	0,00	976,46	
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00	-	6,00	-	
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20	-	260,00	-	
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96	-	428,00	-	

							46.869,99			6.735,26	
3	06	SERVICO EM SOLO E ROCHA MANUAL									
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1 <sup>o</sup> /2 <sup>a</sup> CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	10,00	39,47	49,33	493,30		10,00	0,00	
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30		10,00	-	
							646,60			0,00	
4	06	ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM									
4.1	06.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³.mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12	896,69	5.563,77	896,69	4.899,35
4.2	06.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m²	783,00	10,01	12,51	9.795,33	446,31	5.583,34	446,31	4.211,99
4.3	06.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19		16,20	0,00	
4.4	06.05.180	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 6KN/M	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96		81,00	-	
4.5	06.06.040	BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	m	10,00	21,02	26,27	262,70		10,00	-	
							24.906,30	12.147,11		9.111,34	
5	09	FORMA									
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	480,74	141,41	176,78	84.975,60	10,00	1.767,60	433,25	10.161,93
							84.975,60	-	1.767,60		10.161,93
6	10	ARMADURA E CORDALHA ESTRUTURAL									
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08		10.507,66	38.701,69	
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47		872,76	16.535,57	
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	6.016,00	12,07	15,08	75.641,28	476,21	7.181,25	476,21	68.460,03
							265.520,83	7.181,25		123.697,29	
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO									
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28	22,92	10.718,77	22,92	18.603,51
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73	4,88	2.369,78	129,96	64.760,08
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB	m²	200,94	80,77	100,96	20.286,90		120,20	20.286,30	
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	39,19	125,27	156,58	6.136,37	12,54	1.963,51	19,60	4.172,68
							122.876,28	15.052,06		107.822,58	
8	12	FUNDAÇÃO PROFUNDA									
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	bx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38		1,00	-	
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50		42,00	27.552,24	
							32.282,88			27.552,24	
9	13	LAJE E PAREDE DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS									
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	365,52	152,65	190,81	67.836,77		0,00	67.836,77	
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04	476,21	99.585,04	476,21	-
							167.421,81	-	99.585,04		67.836,77

10	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR									
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	m²	800,50	66,27	82,83	66.305,41	-	-	400,25	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	m²	812,00	80,93	101,16	82.141,92	-	-	441,12	75.040,49
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00	-	-	0,00	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63	-	-	0,00	10.034,63
							171.490,96	-	-		164.389,53
11	15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO									
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27	-	-	0,00	46.132,27
							46.132,27	-	-		46.132,27
12	16	TELHAMENTO									
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20	-	-	0,00	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37	-	-	0,00	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57	-	-	0,00	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09	-	-	0,00	15.392,09
							66.411,23	-	-		66.411,23
13	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL									
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	m²	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00	-	-	0,00	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m²	18,40	508,35	635,43	11.691,91	-	-	0,00	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	-	-	0,00	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00	-	-	0,00	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,36	-	-	0,00	25.060,36
							122.001,29	-	-		122.001,29
14	18	REVESTIMENTO CERÂMICO									
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37	-	-	0,00	79.178,37
14.2	18.06.182	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34	-	-	0,00	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44	-	-	0,00	13.291,44

14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67	-	0,00	64.441,67
							158.645,82	-		158.645,82
<b>15</b>	<b>19</b>	<b>REVESTIMENTO EM PEDRA</b>								
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	146,10	118,12	147,85	21.571,66	-	0,00	21.571,66
							21.571,66	-		21.571,66
<b>16</b>	<b>21</b>	<b>REVESTIMENTO SINTETICO E METALICO</b>								
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00	-	0,00	34.167,00
16.2	21.10.061	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	-	0,00	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	m	34,50	19,15	23,93	825,58	-	0,00	825,58
							39.926,96	-		39.926,96
<b>17</b>	<b>22</b>	<b>FORRO, BRISE E FACHADA</b>								
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	-	0,00	61.870,06
							61.870,06	-		61.870,06
<b>18</b>	<b>23</b>	<b>ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA</b>								
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	-	0,00	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	-	0,00	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	-	0,00	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	-	0,00	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	-	0,00	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58	-	0,00	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	-	0,00	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80	-	0,00	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO -160 X 210 CM	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40	-	0,00	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	un	16,90	44,29	55,36	935,58	-	0,00	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	m	16,90	6,82	8,52	143,98	-	0,00	143,98
							82.326,65	-		82.326,65
<b>19</b>	<b>24</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO</b>								
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47	-	0,00	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95	-	0,00	1.343,95

							27.658,42			27.658,42
<b>20</b>	<b>25</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO</b>								
20.1	25.01.050	CAXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76	-	0,00	34.238,76
20.2	25.01.060	CAXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	m²	29,65	706,32	882,90	26.089,69	-	0,00	26.089,69
20.3	25.01.090	CAXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36	-	0,00	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68	-	0,00	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16	-	0,00	12.536,16
							98.470,85			98.470,85
<b>21</b>	<b>26</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>								
21.	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	m²	1,50	420,84	526,05	789,07	-	0,00	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49	-	0,00	1.985,49
							2.774,86			2.774,86
<b>22</b>	<b>27</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>								
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	m	128,00	124,82	156,02	19.658,52	-	0,00	19.658,52
							19.658,52			19.658,52
<b>23</b>	<b>28</b>	<b>FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>								
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32	-	0,00	1.231,32
							1.231,32			1.231,32
<b>24</b>	<b>30</b>	<b>ACESSORIOS</b>								
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62	-	0,00	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	un	7,00	95,90	119,87	839,09	-	0,00	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18	-	0,00	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91	-	0,00	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	11,50	160,96	188,70	2.170,05	-	0,00	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62	-	0,00	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	2,00	170,78	213,47	426,94	-	0,00	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55	-	0,00	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	un	5,00	1.182,55	1.490,68	7.453,40	-	0,00	7.453,40
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85	-	0,00	5.304,85
							33.781,21			33.781,21

25	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA								
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01	-	0,00	9.013,01
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46	-	116,80	1.392,18
							11.025,47	-	-	10.405,19
26	33	PINTURA								
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47	-	0,00	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63	-	0,00	54.458,63
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09	-	0,00	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21	-	0,00	2.624,21
							106.390,40	-	-	106.390,40
27	34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS								
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	m³	4,55	149,63	187,03	850,98	-	0,00	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	m²	42,26	1,31	1,63	68,88	-	0,00	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	68,70	10,88	13,60	934,32	-	0,00	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,50 A 0,80 M	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32	-	0,00	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	un	15,00	29,53	36,91	553,65	-	0,00	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	un	2,00	29,95	37,43	74,86	-	0,00	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	un	2,00	89,11	111,38	222,76	-	0,00	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	un	13,00	41,88	52,35	680,55	-	0,00	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60	-	0,00	26.613,60
							31.353,92	-	-	31.353,92
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA								
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	un	1,00	500,24	625,30	625,30	-	0,00	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68	-	0,00	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50	-	0,00	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92	-	0,00	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64	-	0,00	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60	-	0,00	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10	-	0,00	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84	-	0,00	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60	-	0,00	4.541,60

28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20	-	0,00	2.800,20	
							<b>32.083,38</b>			<b>32.083,38</b>	
<b>29</b>	<b>38</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA</b>									
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60	196,00	3.071,32	196,00	12.285,28
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40	36,00	641,88	36,00	2.567,52
							<b>18.566,00</b>		<b>3.713,20</b>		<b>14.852,80</b>
<b>30</b>	<b>39</b>	<b>CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>									
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	-		0,00	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60	-		0,00	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	-		0,00	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	-		0,00	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	m	10,00	28,39	35,48	354,80	-		0,00	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	-		0,00	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20	-		0,00	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	-		0,00	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00	-		0,00	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	-		0,00	9.095,40
							<b>50.884,50</b>				<b>50.884,50</b>
<b>31</b>	<b>40</b>	<b>DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>									
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90	-		0,00	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	cj	6,00	22,60	28,25	169,50	-		0,00	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30	-		0,00	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	20,00	21,59	26,98	539,60	-		0,00	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	cj	6,00	28,12	35,15	210,90	-		0,00	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58	-		0,00	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	cj	4,00	25,45	31,81	127,24	-		0,00	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82	-		0,00	1.615,82
							<b>6.837,84</b>				<b>6.837,84</b>
<b>32</b>	<b>41</b>	<b>ILUMINACAO</b>									
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	-		0,00	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98	-		0,00	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04	-		0,00	10.927,04

32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPÓS COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4890 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	-	0,00	7.874,05	
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	-	0,00	10.915,36	
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60	-	0,00	16.053,60	
							52.126,72	-	-	52.126,72	
<b>33</b>	<b>43</b>	<b>APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS</b>									
33.1	43.02.060	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60	-	0,00	2.265,60	
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	un	2,00	162,07	227,58	455,16	-	0,00	455,16	
33.3	43.05.090	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 160 A 190M <sup>3</sup> /H	un	1,00	359,17	448,96	448,96	-	0,00	448,96	
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	cj	3,00	6.169,05	7.698,81	23.096,43	-	0,00	23.096,43	
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	-	0,00	13.078,10	
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92	-	0,00	40.780,92	
							80.125,17	-	-	80.125,17	
<b>34</b>	<b>44</b>	<b>APARELHOS E SISTEMAS HIDRÁULICOS</b>									
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85	-	0,00	1.373,85	
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUMA	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	-	0,00	2.164,08	
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	un	6,00	99,71	124,63	747,78	-	0,00	747,78	
34.4	44.01.310	TÂNQUE DE LOUÇA COM COLUMA DE 30 LITROS	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25	-	0,00	2.273,25	
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTEIRO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m <sup>2</sup>	13,92	590,74	738,42	10.278,80	-	0,00	10.278,80	
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un	10,00	69,91	87,38	873,80	-	0,00	873,80	
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	18,00	56,21	70,26	1.124,16	-	0,00	1.124,16	
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	0,00	172,92	
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	8,00	159,82	199,77	1.198,62	-	0,00	1.198,62	
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, AÇIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	0,00	1.874,21	
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	-	0,00	1.512,60	
							23.594,07	-	-	23.594,07	
<b>35</b>	<b>46</b>	<b>TUBULAÇÃO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES</b>									
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60	54,00	1.502,28	54,00	3.505,32
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	75,00	3.761,25	75,00	3.761,25


35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	26,52	33,15	397,80	6,00	198,90	6,00	198,90
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	30,00	1.275,90	30,00	1.275,90
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	60,00	3.966,60	60,00	3.966,60
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2', INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	88,85	111,06	666,36	-	-	0,00	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4', INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	-	-	0,00	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00	-	-	84,00	8.484,00
						<b>37.030,14</b>		<b>10.704,93</b>			<b>26.325,21</b>
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>									
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2'	un	4,00	106,87	133,58	534,32	-	-	0,00	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2'	un	4,00	190,80	238,50	954,00	-	-	0,00	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	-	-	0,00	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	un	6,00	76,61	95,76	574,56	-	-	0,00	574,56
						<b>3.665,44</b>		<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>3.665,44</b>
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>									
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	-	-	0,00	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	un	3,00	95,12	118,90	356,70	-	-	0,00	356,70
						<b>9.706,26</b>		<b>-</b>		<b>0,00</b>	<b>9.706,26</b>
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>									
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16	17,00	1.753,72	17,00	928,44
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20	6,00	1.718,76	18,00	4.010,44
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	un	2,00	354,29	442,86	885,72	-	-	0,00	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4'	un	10,00	12,94	16,17	161,70	-	-	0,00	161,70
						<b>9.458,78</b>		<b>3.472,48</b>		<b>0,00</b>	<b>5.986,30</b>
<b>39</b>	<b>54</b>	<b>PAVIMENTACAO E PASSEIO</b>									
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35	-	-	0,00	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m²	76,65	174,79	218,48	16.746,49	-	-	0,00	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m³	511,00	19,35	24,18	12.355,98	-	-	0,00	12.355,98

39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ.E EM AREIA	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
							84.402,89
<b>TOTAL</b>					<b>2.326.081,38</b>		

		0,00	53.333,07
			84.402,89

<b>TOTAL GERAL 9ª MEDIÇÃO</b>		<b>154.343,51</b>
<b>% MEDIDO</b>		<b>7%</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>646.764,11</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.679.317,26</b>

Monteiro Lobato, 11 de setembro de 2024



Luis Gustavo de Barros  
Responsável Técnico  
CREA 5062695430

ADM FABRICAÇÃO E  
MONTAGEM DE ESTRUTURAS  
METÁLICAS - EIRELI

14.563.488/0001-70



LUIZ RODOLFO WERRELES GOMES  
CREA SP 40711143/31  
SEC. MUNIC. DE OBRAS



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	01/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
3	AMARRAÇÃO DE PILAR
4	DESFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>		

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

LUÍZ RODOLFO WEIRELES GOMES  
CREA SP 507119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024

<b>DATA:</b>	02/08/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
3	AMARRAÇÃO DE PILAR
4	DESFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAME E SAPATAS
5	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
6	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	05/08/2024			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
3	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
4	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	5	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
TOTAL	10	TOTAL	0	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA


<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	06/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
3	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
4	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	5	BETONEIRA		
AJUDANTE	5	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

  
ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	07/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REMOÇÃO DE TERRA COM PÁ CARREGADEIRA
2	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
3	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
4	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
5	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	5	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023 **TERMINO** 10/08/2024

**DATA:** 08/08/2024

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	REMOÇÃO DE TERRA COM PÁ CARREGADEIRA
2	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
3	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
4	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
5	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024
DATA:	09/08/2024		

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
3	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
TOTAL	8	TOTAL	0	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	12/08/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
3	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORRA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	13/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	RELOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CIMENTO
3	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
4	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	14/08/2024			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
4	CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
TOTAL	8	TOTAL	0	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	15/08/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>	SÁBADO - REPOSIÇÃO DA EMENDA DO FERIADO DO DIA 08/07/24			

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
4	CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	16/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CIMENTO
2	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
4	CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA
5	NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO
6	COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	19/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
2	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
4	CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA
5	NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO
6	COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA
7	ENCANAMENTO INTERNO DE ESGOTO
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	3	BETONEIRA		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	20/08/2024		
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva
<b>Observações:</b>	<input type="checkbox"/> Improdutivo	<input type="checkbox"/> Improdutivo	

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
2	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
4	CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA
5	NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO
6	COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA
7	ENCANAMENTO INTERNO DE ESGOTO
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	3	BETONEIRA		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	21/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
2	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
4	CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA
5	NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO
6	COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA
7	ENCANAMENTO INTERNO DE ESGOTO
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	3	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	22/08/2024			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E TUBULAÇÃO
2	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO
3	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
4	CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES E VERGA E CONTRA VERGA
5	NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO
6	COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA
7	ENCANAMENTO INTERNO DE ESGOTO
8	CONCRETAGEM DO CONTRAPISO INTERNO
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	3	BETONEIRA		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	23/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	REATERRO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO
2	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
3	NIVELAMENTO DE ATERRO PARA CONTRAPISO
4	COLOCAÇÃO DE BERÇO DE BRITA
5	ENCANAMENTO INTERNO DE ESGOTO
6	RECEBIMENTO DAS VIGAS DE RESPALDO DA LAJE
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	3	BETONEIRA		
AJUDANTE	3	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	26/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	DESFORMA DOS PILARES DO MURO DE ARRIMO
2	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
3	CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES
4	CONCRETAGEM DO CONTRA PISO INTERNO
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	3	BETONEIRA		
AJUDANTE	4	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	27/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO
2	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
3	CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES
4	DESFORMA DAS CAIXARIAS DO MURO DE ARRIMO
5	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO
6	COLOCAÇÃO DE VIGA DE RESPALDO DA LAJE
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	3	BETONEIRA		
AJUDANTE	5	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	28/08/2024		
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo	
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo	
<b>Observações:</b>			

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO
2	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
3	CONCRETAGEM DA PRIMEIRA ETAPA DOS PILARES
4	REGULARIZAÇÃO DO CORREDOR EXTERNO
5	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO
6	CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRA VERGA
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	3	BETONEIRA		
AJUDANTE	6	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	29/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO
2	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
3	CONCRETAGEM DOS PILARES
4	REGULARIZAÇÃO DO CORREDOR EXTERNO
5	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO
6	CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRA VERGA
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	6	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	30/08/2024		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	FECHAMENTO DE CAIXARIA DOS PILARES
2	CONCRETAGEM DOS PILARES
3	REGULARIZAÇÃO DO CORREDOR EXTERNO
4	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO
5	CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRA VERGA
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME		
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR		
PEDREIRO	4	BETONEIRA		
AJUDANTE	6	COMPACTADOR		
		SERRA CIRCULAR		
		ESCORA METALICA		
		VIGA 1M		
		VIGA 2M		
		PLATAFORMA		
		ELEVATORIA 12M		
		SERRA MÁRMORE		
		ESMERILHADEIRA		
		FURADEIRA		
		FURADEIRA DE IMPACTO		
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	

  
Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

  
ENGENHEIRO FISCAL



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE  
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP



PREFEITURA DE  
**MONTEIRO  
LOBATO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**DATA:** 02/09/2024

**RELATÓRIO Nº:**  
09/2023

**CONTRATO:** 097/2023


**CONFERIDO:**

Fiscal do contrato

**AUTOR:**

Luis Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430



<p>DATA: 05/09/2024</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</b></p>	<p align="center"><b>FOLHA: 2 / 14</b></p>
-----------------------------	---	--

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS

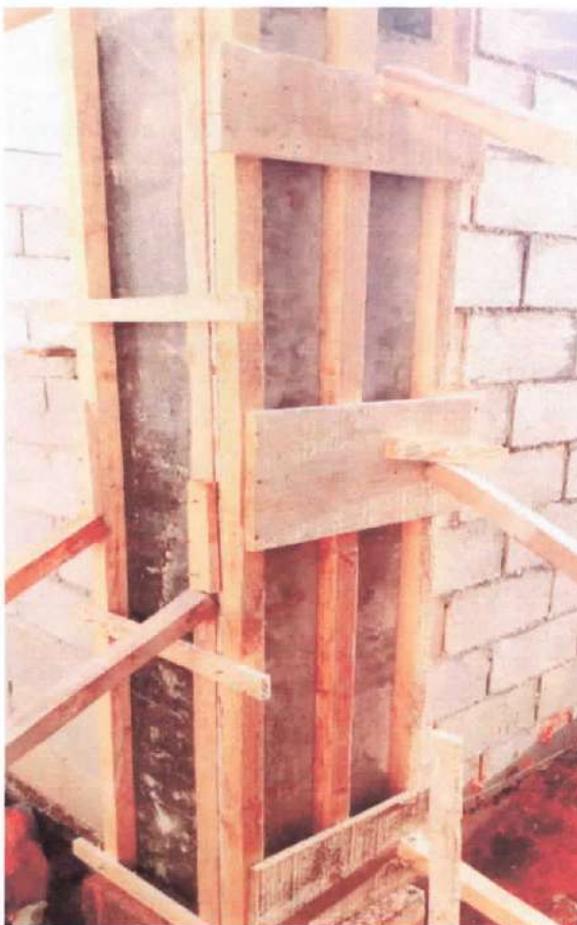


Foto 1: Fechamento e travamento das fôrmas dos pilares

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 50711913  
SEJ. MUNIC. DE CERRAS

<p><b>Autor:</b></p> <p align="center">   <b>Luís Gustavo de Barros</b>          CREA: 5062695430       </p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p align="center">   <b>FISCAL DO CONTRATO</b> </p>
---	---

DATA: 05/09/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</b>	<b>FOLHA: 3 / 14</b>
---------------------	--	----------------------



Foto 2: Fechamento e travamento das fôrmas dos pilares

<b>Autor:</b>  <b>Luis Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  <b>FISCAL DO CONTRATO</b>
--	--



DATA:  
05/09/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 14

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO




Foto 3 e 4: Concretagem dos pilares

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO  

DATA: 05/09/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</b>	FOLHA: 5 / 14
---------------------	--	---------------



Foto 5 e 6: Finalização das alvenarias das caixas de esgoto


<b>Autor:</b>  <b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
--	---

DATA: 05/09/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</b>	FOLHA: 6 / 14
---------------------	--	---------------



Foto 7 e 8: Escavação para colocação das caixas sifonadas e tubulação de esgoto

Autor:  <b>Luis Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	Conferido:  FISCAL DO CONTRATO
---	--------------------------------------




DATA: 05/09/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</b>	<b>FOLHA: 7 / 14</b>
---------------------	--	----------------------



Foto 9: Escavação para colocação das caixas sifonadas e tubulação de esgoto

<b>Autor:</b>  <b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
--	---




DATA: 05/09/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</b>	FOLHA: 8 / 14
---------------------	--	---------------



Foto 10: Escavação para colocação das caixas sifonadas e tubulação de esgoto

<b>Autor:</b>  <b>Luis Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
--	---



<p>DATA: 05/09/2024</p>	<p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</b></p>	<p>FOLHA: 9 / 14</p>
-----------------------------	--	----------------------



Foto 11: Preparação do solo com brita para a concretagem



Foto 12: Preparação do solo com brita para a concretagem


<p>Autor:</p> <p> <b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430</p>	<p>Conferido:</p> <p>FISCAL DO CONTRATO </p>
---	---

DATA: 05/09/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</b>	FOLHA: 10 / 14
---------------------	--	----------------



Foto 13: Concretagem do piso


Autor:  <b>Luis Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	Conferido:  FISCAL DO CONTRATO 
---	--



<p>DATA: 05/09/2024</p>	<p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</b></p>	<p>FOLHA: 11 / 14</p>
-----------------------------	--	-----------------------



Foto 14 e 15: Preparação do terreno e concretagem do piso

<p><b>Autor:</b></p> <p> <b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430</p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p> FISCAL DO CONTRATO</p>
--	--

DATA:  
05/09/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 12 / 14

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO**



Foto 16: Preparação do terreno para concretagem do piso




Foto 17: Concretagem do piso

Autor:

  
**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO



DATA:  
05/09/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 13 / 14

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO**



Foto 18: Colocação das vigas sobre as paredes



Foto 19: Vigotas treliçadas para montagem da laje

Autor:

  
**Luis Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO



<p>DATA: 05/09/2024</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 9ª MEDIÇÃO</b></p>	<p>FOLHA: 14 / 14</p>
-----------------------------	---	-----------------------




Foto 20: Separação do EPS para montagem da laje.



Foto 21: Montagem da laje do 1º pavimento.

<p><b>Autor:</b></p> <p align="center"> <b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430</p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p align="center"> <b>FISCAL DO CONTRATO</b></p>
---	--





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 14.563.488 Nome Empregador: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Gu  
 Nascimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0.00 Total da Guia (FGTS): 5.486  
 Número da Guia: 0124090927281940-8 Data Emissão: 09/09/2024 12:06:22 (Brasília) Emitida por: 50.638.273/0001-34 - VERTICE - SOLUCOES

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 14.563.488/0001-70		Tomador: 90.017.2587773											
CPF	Nome	CPF	CPF	Classificação	Período	Valor FGTS							
CPF	Nome	CPF	CPF	Classificação	Período	Total	na Guia	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela	Parcela
2024	ADRIANO CLSAR SALES TEIXEIRA	506	434.767.068-25	101	20/09/2024 Mensal	2.591,86	207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201
2024	ALEX DE ALMEIDA FERNANDES	535	427.523.948-29	101	20/09/2024 Mensal	2.572,17	205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202
2024	FILISFU DE MORAES	513	056.507.028-00	101	20/09/2024 Mensal	2.561,86	207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203
2024	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS PACHECO	536	404.237.058-65	101	20/09/2024 Mensal	2.113,08	169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156
			Total do Tomador		90.017.2587773	9.868,98	789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784
			Total do Estabelecimento		14.563.488/0001-70	68.585,00	5.486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484
			Total FGTS			68.585,00	5.486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**  
**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:58:20 do dia 28/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2024.

Código de controle da certidão: **AA69.6E47.D16D.C087**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Serviço de Dívida Ativa

Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

**Certidão Fiscal NEGATIVA de débitos de Qualquer Natureza**

**Certidão nº 931/2024**

**Processo nº 144.190//2024**

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no CNPJ **14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município em nome da firma acima citada

**CERTIFICA-SE** ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

MARIA DO CARMO Assinado de forma digital  
por MARIA DO CARMO  
PONTES XAVIER PONTES XAVIER  
GONCALVES:0809 GONCALVES:08095615811  
5615811 Dados: 2024.09.09 16:44:14  
-03'00'

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.563.488/0001-70  
**Razão Social:** A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI  
**Endereço:** ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/08/2024 a 22/09/2024

**Certificação Número:** 2024082401471877731557

Informação obtida em 05/09/2024 14:02:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



06/09/2024

0079390851

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 4565806****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 04/09/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ADM FABRICAÇÃO**, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de setembro de 2024.

PEDIDO Nº:





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS  
LTDA

**CNPJ:** 14.563.488/0001-70

**CERTIDÃO EMITIDA** em 05/09/2024, às 13:53:55

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 02/09/2024, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **7EOLRkP1hErucWE**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 02/09/2024. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 02/09/2024 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000006477250

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.

Certidão emitida em: 05/09/2024, às 11:29:10 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **8D0F38766FA4D8B9**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2024/000006477672

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 05/09/2024, às 11:35:09 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **6B4F0BC27F6C9AA8**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta sera de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.
- g) Foram pesquisados processos de Execução Criminal - SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão n°: 60993550/2024

Expedição: 05/09/2024, às 11:23:04

Validade: 04/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.563.488/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24090212630-87  
Data e hora da emissão 05/09/2024 11:14:13  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 60380607

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/09/2024 11:19:21

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

### Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS

Certidão n° 630839 / 2024

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 04/09/2024, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do n° do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



1 8 5 9 5 6 8 6 1 0 0 w 2 f j A 1 m

- c. Estão compreendidos nesta certidão, no caso de pessoa jurídica, todos os seus estabelecimentos, agência ou filiais vinculados à raiz do CNPJ;
- d. Certidão emitida gratuitamente.



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

**Número de inscrição da obra** 90.017.25877/73 **Nome da obra** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA

**Data do cadastramento** 04/12/2023 14:35 **Origem do cadastramento** e-CAC

**Tipo Zona** Zona Urbana **ART** **RRT** **CIB** **Cadastro Imobiliário** 35878

**Data do início da obra** 10/11/2023 **CNAE** 4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

**Situação** Ativa **Data** 10/11/2023

### Endereço

**País** BRASIL **Município** MONTEIRO LOBATO **UF** SP **CEP** 12.250-000

**Bairro** Centro **Logradouro** RUA Antonio Alves Magalhães **Número** 20

### Responsável

**Nome** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA **CPF/CNPJ** 14.563.488/0001-70 **Vínculo** Dono da obra

**Data de início da responsabilidade** 10/11/2023 **Data de término da responsabilidade**

### Áreas Principais

<b>Categoria</b>	<b>Destinação</b>	<b>Tipo de Obra</b>	<b>Área</b>
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Mista	831,73 m <sup>2</sup>

### Áreas Complementares

<b>Categoria</b>	<b>Destinação</b>	<b>Tipo de Obra</b>	<b>Tipo de Área</b>	<b>Área Coberta</b>	<b>Área Descoberta</b>	<b>Área Total</b>
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Mista	Estacionamento Térreo	0,00 m <sup>2</sup>	502,00 m <sup>2</sup>	502,00 m <sup>2</sup>

### Área Resultante

**Área Resultante da Obra**  
1.333,73 m<sup>2</sup>

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05269

DATA: 13/09/2024 VENCÍ 16/09/2024 PAGTO: 13/09/2024

Credor.: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade.: GUARATINGUETA

CEP:

**Discriminação...:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **154.343,51**

(cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e u  
m centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 154.343,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
340	/ 4	GL 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 154.343,51	RR\$ 0,00	RR\$ 7.717,18	RR\$ 146.626,33
TOTAL . . . . .					RR\$ 154.343,51	RR\$ 0,00	RR\$ 7.717,18	RR\$ 146.626,33

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 146.626,33**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 146.626,33
TOTAL . . .			RR\$ 146.626,33

Despesa paga em 13/09/2024 Com os recursos acima discriminados

AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

<b>PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO</b>				<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	
PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 46643482/0001-07				340 / 4	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>4</b>		FICHA: 307	DATA: 12/09/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OBRA TOMADA		230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2024	
NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS		14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786		
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES		GUARATINGUETA			
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios		PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.		Liquido <b>146.626,33</b>	
800 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND 000 TRANSF. UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-Convên				Desconto <b>7.717,18</b>	
GL				<b>SOMA</b>	
				<b>154.343,51</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde			
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.268.122,04		381.018,89	154.343,51	887.103,15	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>154.343,51</b>			
cento e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos *****					
DESCONTOS					
8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL		7.717,18			
				<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
				<b>7.717,18</b>	
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM		12/09/2024		<i>João Paulo</i>	
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA		Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças			
EMITIDO EM			ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora			Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.		
DESPESA PAGA EM			<b>RECIBO</b>		
			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
			NOME		
			CNPJ/CPF:		



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.30  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA,AV JOAO PESSOA  
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT  
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70  
VALOR: R\$ 146.626,33  
DEBITO EM: 13/09/2024

=====

DOCUMENTO: 091301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.356.374.185.549.248



13/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:00  
673906739 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 13/09/2024  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.358.973  
VALOR TOTAL 7.717,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF NUM M LOBATO \*FUNDO  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 5.E9F.1D7.33D.19C.961

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

G3331311420023791  
13/09/2024 11:48:31

---

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>566</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>24/10/2024 15:09:27</b>			
			Código de Verificação * <b>5V7R-WQC1</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 24/10/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 10ª Medição Período: 01/09/2024 a 21/10/2024 Valor: R\$ 84.786,14  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço <b>R\$ 84.786,14</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 84.786,14</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>4.239,31</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84.786,14</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 80.546,83</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES BOMES  
CREA SP 07119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

25.10.24



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
*SECRETARIA DE OBRAS*

**MEMORANDO 24187/2024**

**A/C: Secretaria de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

**Ref.: 10º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.**

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 10º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023, no valor total de R\$84.786,14 referente a seguinte nota fiscal, nº566. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 25 de outubro de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Luiz Rodolfo Meirelles Gomes**  
**Secretário de Obras**



ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE  
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



PREFEITURA DE  
**MONTEIRO  
LOBATO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 21/10/2024

RELATÓRIO Nº:  
10/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:  
Fiscal do contrato

AUTOR:  
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

<p>DATA: 21/10/2024</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 10ª MEDIÇÃO</b></p>	<p align="center"><b>FOLHA: 2 / 6</b></p>
-----------------------------	--	---

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1: Marcação da alvenaria do 2º Pavimento

<p><b>Autor:</b></p> <p align="center">   <b>Luís Gustavo de Barros</b>          CREA: 5062695430       </p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p align="center">   <b>FISCAL DO CONTRATO</b> </p>
---	--

DATA:  
21/10/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3 / 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 10ª MEDIÇÃO



Foto 2: Elevação da alvenaria do 2º Pavimento




Foto 3: Elevação da alvenaria do 2º Pavimento

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
21/10/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 10ª MEDIÇÃO

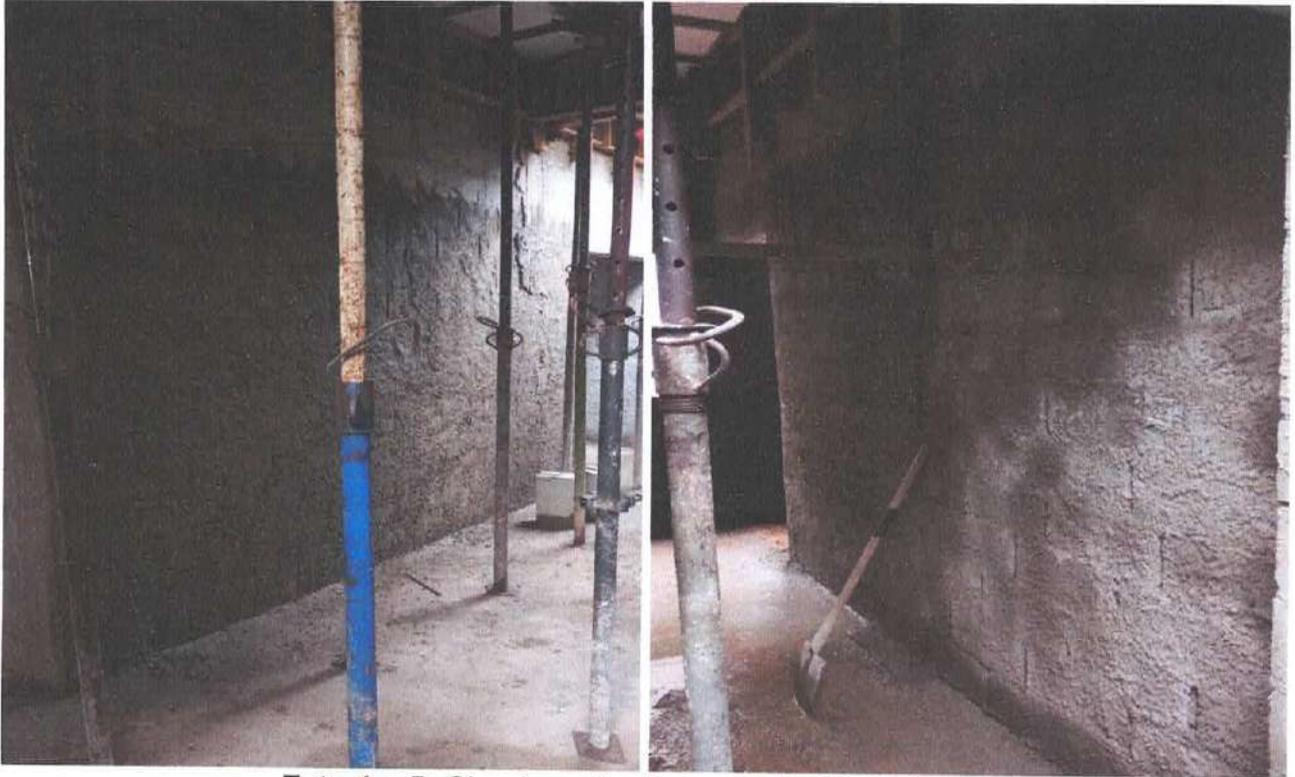


Foto 4 e 5: Chapisco da alvenaria do 1º Pavimento



Foto 6: Colocação das ferragens dos pilares do 2º Pavimento

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
21/10/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 10ª MEDIÇÃO



Foto 7: Ferragem das vigas do 2º Pavimento



Foto 9: Ferragem das vigas do 2º Pavimento

Autor:

  
**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA: 21/10/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 10ª MEDIÇÃO</b>	<b>FOLHA: 6 / 6</b>
---------------------	---	---------------------



Foto 10: Montagem de andaimes

<b>Autor:</b>  <b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  <b>FISCAL DO CONTRATO</b>
---	--



# ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

OBJETO								10ª MEDIÇÃO - 21/10/2024				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UP-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP								QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)					
					S/ BDI	C/ BDI						
1	01	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO										
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15	-	1,00	-		
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72	-	1,00	-		
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36	-	6,00	-		
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70	-	10,00	-		
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84	-	12,00	-		
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38	-	6,00	-		
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	bx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68	-	1,00	-		
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70	-	90,00	-		
							72.378,53					
2	02	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA										
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82	-	-	9,00	0,00	
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10	-	-	9,00	-	
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65	1,00	719,85	2,00	5.038,95	
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80	-	-	80,00	-	
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46	-	-	0,00	976,46	
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00	-	-	6,00	-	
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20	-	-	260,00	-	
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96	-	-	428,00	-	

							46.869,99
3	06	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL					
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	10,00	39,47	49,33	493,30
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30
							646,60
4	08	ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM					
4.1	08.02.060	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m².mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	m³	783,00	10,01	12,51	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÉXTEL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96
4.5	08.06.040	BARBACÁ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	m	10,00	21,02	26,27	262,70
							24.906,30
5	09	FORMA					
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60
							84.975,60
6	10	ARMADURA E CORDALHA ESTRUTURAL					
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28
							265.520,83
7	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO					
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	m³	138,24	388,49	485,51	67.130,73
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	39,19	125,27	156,58	6.136,37
							122.876,28
8	12	FUNDAÇÃO PROFUNDA					
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	tx	1,00	1.515,51	1.894,36	1.894,36
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50
							32.282,88
9	13	LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS					
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04
							167.421,81

		719,85		6.015,41
-	-		10,00	0,00
-	-		10,00	-
				0,00
-	-		896,69	4.899,35
-	-		446,31	4.211,99
			16,20	-
			81,00	-
			10,00	-
				9.111,34
47,49	8.394,33		480,74	-
-	8.394,33			-
1.345,00	15.696,15		11.852,66	23.005,54
417,16	5.744,29		1.289,92	10.791,27
-	-		476,21	68.460,03
				102.256,84
			22,92	18.603,51
8,28	4.020,85		138,24	-
60,00	6.057,60		180,20	2.093,91
			19,60	3.067,40
				10.078,45
			1,00	-
			42,00	27.552,24
				67.836,77
			476,21	-
-	-			

10	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR									
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	m²	800,50	66,27	82,83	66.305,41	200,13	16.576,77	600,38	16.575,93
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	m²	812,00	80,93	101,16	82.141,92	203,00	20.535,48	644,12	16.982,74
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00		-	-	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,63		-	-	10.034,63
							171.490,96		37.112,25		
11	15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO									
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27		-	-	46.132,27
							46.132,27		-	-	
12	16	TELHAMENTO									
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20		-	-	26.942,20
12.2	16.30.020	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37		-	-	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57		-	-	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09		-	-	15.392,09
							66.411,23		-	-	
13	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL									
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	m³	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00		-	-	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	m³	18,40	508,35	635,43	11.691,91		-	-	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00	1.150,46	7.040,82	1.150,46	12.696,18
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00		-	-	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38		-	-	25.060,38
							122.001,29		7.040,82		
14	18	REVESTIMENTO CERÂMICO									
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37		-	-	79.178,37
14.2	18.06.182	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34		-	-	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44		-	-	13.291,44

14.4	16.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67	-	-	64.441,67
						158.646,82		-	-	
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA								
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	m	146,10	118,12	147,85	21.571,66	-	-	21.571,66
						21.571,66		-	-	21.571,66
16	21	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO								
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00	-	-	34.167,00
16.2	21.10.061	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38	-	-	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	m	34,50	19,15	23,93	825,58	-	-	825,58
						39.926,96		-	-	39.926,96
17	22	FORRO, BRISE E FACHADA								
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06	-	-	61.870,06
						61.870,06		-	-	61.870,06
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA								
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38	-	-	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46	-	-	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07	-	-	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90	-	-	5.016,90
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	m²	0,90	133,79	167,23	150,50	-	-	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58	-	-	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00	-	-	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80	-	-	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40	-	-	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	un	16,90	44,29	55,36	935,58	-	-	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	m	16,90	6,82	8,52	143,98	-	-	143,98
						82.326,65		-	-	82.326,65
19	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO								
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47	-	-	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95	-	-	1.343,95

								27.658,42				27.658,42
<b>20</b>	<b>25</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO</b>										
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76			-	-	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69			-	-	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,36			-	-	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68			-	-	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	m²	16,80	596,96	746,20	12.536,16			-	-	12.536,16
								<b>96.470,65</b>				<b>96.470,65</b>
<b>21</b>	<b>26</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>										
21.	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	m²	1,50	420,84	526,05	789,07			-	-	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49			-	-	1.985,49
								<b>2.774,56</b>				<b>2.774,56</b>
<b>22</b>	<b>27</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>										
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52			-	-	19.658,52
								<b>19.658,52</b>				<b>19.658,52</b>
<b>23</b>	<b>28</b>	<b>FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>										
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32			-	-	1.231,32
								<b>1.231,32</b>				<b>1.231,32</b>
<b>24</b>	<b>30</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>										
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62			-	-	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	un	7,00	95,90	119,87	839,09			-	-	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18			-	-	2.203,18
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91			-	-	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05			-	-	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62			-	-	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	un	2,00	170,78	213,47	426,94			-	-	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55			-	-	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40			-	-	7.453,40
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85			-	-	5.304,85
								<b>33.781,21</b>				<b>33.781,21</b>

25	32	IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA					
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46
							<b>11.025,47</b>
26	33	PINTURA					
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	m²	1.462,97	11,86	14,57	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21
							<b>106.390,40</b>
27	34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS					
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	m³	4,55	149,63	187,03	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	m²	42,26	1,31	1,63	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	m²	66,70	10,88	13,60	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	un	15,00	29,53	36,91	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	un	2,00	29,95	37,43	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	un	2,00	89,11	111,38	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	un	13,00	41,88	52,35	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60
							<b>31.353,92</b>
28	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA					
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	un	1,00	500,24	625,30	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 58 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60

							9.013,01
							0,00
						116,80	9.013,01
							21.315,47
							54.458,63
							27.992,09
							2.624,21
							106.390,40
							850,98
							68,88
							934,32
							1.354,32
							553,65
							74,86
							222,76
							680,55
							26.613,60
							31.353,92
							625,30
							5.055,68
							1.172,50
							2.875,92
							1.294,64
							3.885,60
							1.112,10
							8.719,84
							4.541,60

28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20	-	-	2.800,20
							32.083,38			32.083,38
29	38	<b>TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA</b>								
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60	-	196,00	12.285,28
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40	-	36,00	2.567,52
							18.566,00			14.852,80
30	39	<b>CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>								
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	-	-	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60	-	-	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00	-	-	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00	-	-	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	m	10,00	28,39	35,48	354,80	-	-	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00	-	-	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20	-	-	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50	-	-	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00	-	-	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40	-	-	9.095,40
							50.884,50			50.884,50
31	40	<b>DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>								
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90	-	-	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	cj	6,00	22,60	28,25	169,50	-	-	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	cj	90,00	18,30	22,67	2.058,30	-	-	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	cj	20,00	21,59	26,98	539,60	-	-	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	cj	6,00	28,12	35,15	210,90	-	-	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58	-	-	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	cj	4,00	25,45	31,81	127,24	-	-	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82	-	-	1.615,82
							6.837,84			6.837,84
32	41	<b>ILUMINAÇÃO</b>								
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69	-	-	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98	-	-	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04	-	-	10.927,04

32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05	-	-	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36	-	-	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL.O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60	-	-	16.053,60
							52.126,72	-	-	52.126,72
33	43	APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.								
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60	-	-	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	un	2,00	182,07	227,58	455,16	-	-	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H	un	1,00	359,17	448,96	448,96	-	-	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43	-	-	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10	-	-	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92	-	-	40.780,92
							80.125,17	-	-	80.125,17
34	44	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS								
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85	-	-	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08	-	-	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	un	6,00	99,71	124,63	747,78	-	-	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25	-	-	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80	-	-	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	un	10,00	69,91	87,36	873,80	-	-	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16	-	-	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	un	4,00	34,59	43,23	172,92	-	-	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62	-	-	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2 OU 3/4"	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21	-	-	1.874,21
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60	-	-	1.512,60
							23.594,07	-	-	23.594,07
35	46	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.								
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60	-	54,00	3.505,32
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50	-	75,00	3.761,25

35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	12,00	26,52	33,15	397,80	-	6,00	198,90
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80	-	30,00	1.275,90
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20	-	60,00	3.966,60
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	m	6,00	88,85	111,06	666,36	-	-	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88	-	-	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00	-	84,00	2.545,20
							<b>37.030,14</b>			<b>20.386,41</b>
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>								
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	un	4,00	106,87	133,56	534,32	-	-	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	un	4,00	190,80	238,50	954,00	-	-	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56	-	-	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	un	6,00	76,81	95,76	574,56	-	-	574,56
							<b>3.665,44</b>			<b>3.665,44</b>
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>								
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56	-	-	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	un	3,00	95,12	118,90	356,70	-	-	356,70
							<b>9.706,26</b>			<b>9.706,26</b>
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>								
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 60 MM, COM GRELHA	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16	-	17,00	928,44
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20	-	18,00	572,92
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	un	2,00	354,29	442,86	885,72	-	-	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	un	10,00	12,94	16,17	161,70	-	-	161,70
							<b>9.458,78</b>			<b>2.548,78</b>
<b>39</b>	<b>54</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>								
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35	-	-	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	76,65	174,79	218,48	16.746,49	-	-	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98	-	-	12.355,98

39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ.E EM AREIA	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
							84.402,89
<b>TOTAL</b>							<b>2.326.081,38</b>

			53.333,07
			84.402,89

<b>TOTAL GERAL 9ª MEDIÇÃO</b>		<b>84.786,14</b>
-------------------------------	--	------------------

<b>% MEDIDO</b>		<b>3,65%</b>
-----------------	--	--------------

<b>ACUMULADO</b>		<b>731.550,25</b>
------------------	--	-------------------

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		<b>R\$ 1.594.531,12</b>
---------------------------	--	-------------------------

Monteiro Lobato, 21 de outubro de 2024

  
 Luís Gustavo de Barros  
 Responsável Técnico  
 CREA 5062695430

  
 LUIZ RODOLFO WEIRUELLES GOMES  
 CREA 5062695430  
 SEC. MUNIC. DE OBRAS

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

340 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>5</b>	FICHA: 307	DATA: 25/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2024
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	


FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND 000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-Convên	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido <b>80.546,83</b> Desconto <b>4.239,31</b>
<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>84.786,14</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268.122,04	465.805,03	84.786,14	802.317,01

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>84.786,14</b>
oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos *****	

DESCONTOS		
8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	4.239,31	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>4.239,31</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/10/2024 

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA \_\_\_\_\_ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora	DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06124

DATA: 31/10/2024 VENCI 29/10/2024 PAGTO: 31/10/2024

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST: CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA CEP:

**Discriminação...:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **84.786,14**

(oitenta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 84.786,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
340	/ 5	GL 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 84.786,14	RR\$ 0,00	RR\$ 4.239,31	RR\$ 80.546,83
TOTAL . . . . .					RR\$ 84.786,14	RR\$ 0,00	RR\$ 4.239,31	RR\$ 80.546,83

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 80.546,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 80.546,83
TOTAL . . .			RR\$ 80.546,83

Despesa paga em 31/10/2024 Com os recursos acima discriminados

AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.39  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$

80.546,83

DEBITO EM: 31/10/2024

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB:

9.87C.531.6D1.017.9D1

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:09  
673906739 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.739.000.358.973
VALOR TOTAL	4.239,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN M LOBATO \*FUNDO  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.EF0.8FE.2F7.624.59E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA S

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		Número da Nota <b>569</b>			
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Data e Hora de Emissão <b>21/11/2024 11:02:28</b>			
			Código de Verificação * <b>5U4S-YF8V</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 21/11/2024, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 11ª Medição Período: 01/11/2024 a 18/11/2024 Valor: R\$ 185.956,27  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço <b>R\$ 185.956,27</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 185.956,27</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>9.297,81</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 185.956,27</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 176.658,46</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREESP 30/11/10  
SEC. MUNIC. DE OBRAS



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**MEMORANDO 24195/2024**

**A/C: Secretaria de Finanças**  
**De: Secretaria de Obras**

**Ref.: 11º Medição – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.**

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 11º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023, no valor total de R\$185.956,27 referente a seguinte nota fiscal, nº569.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 22 de novembro de 2024.

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP 5071119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**Luiz Rodolfo Meirelles Gomes**  
**Secretário de Obras**



# ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP



# PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**DATA:** 18/11/2024

**RELATÓRIO Nº:**  
11/2023

**CONFERIDO:**  
Fiscal do contrato

**CONTRATO:** 097/2023

**AUTOR:**  
Luís Gustavo de Barros – Eng. Civil

**CREA:** SP-5062695430

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES  
CREA-SP-607110431  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

DATA: 18/11/2024	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO</b>	FOLHA: 2 / 10
---------------------	--	---------------

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1: Alvenaria do 2º Pavimento

Autor:  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido:  FISCAL DO CONTRATO
--	--------------------------------------

DATA:  
18/11/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 3 / 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO



Foto 2: Alvenaria do 2º Pavimento

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
18/11/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO



Foto 3: Passagem de corrugados para tomadas e interruptores do 1º Pavimento

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
18/11/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 5 / 10

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO

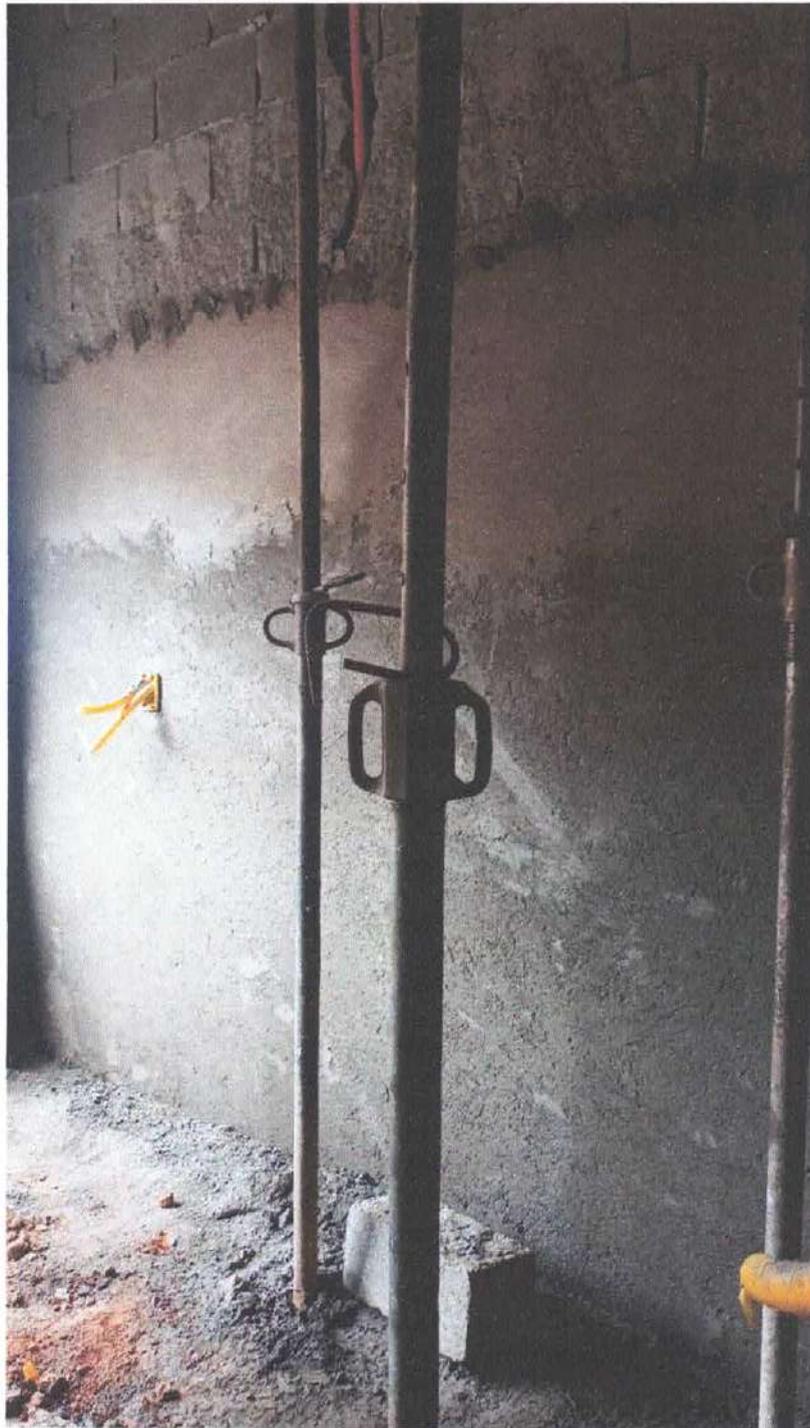


Foto 4: Emboço do 1º Pavimento área interna

Autor:

  
**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA: 18/11/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO</b>	FOLHA: 6 / 10
---------------------	---	---------------



Foto 5: Reboco do 1º Pavimento área interna

<b>Autor:</b>  Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
---	---

<p>DATA: 18/11/2024</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO</b></p>	<p>FOLHA: 7 / 10</p>
-----------------------------	--	----------------------

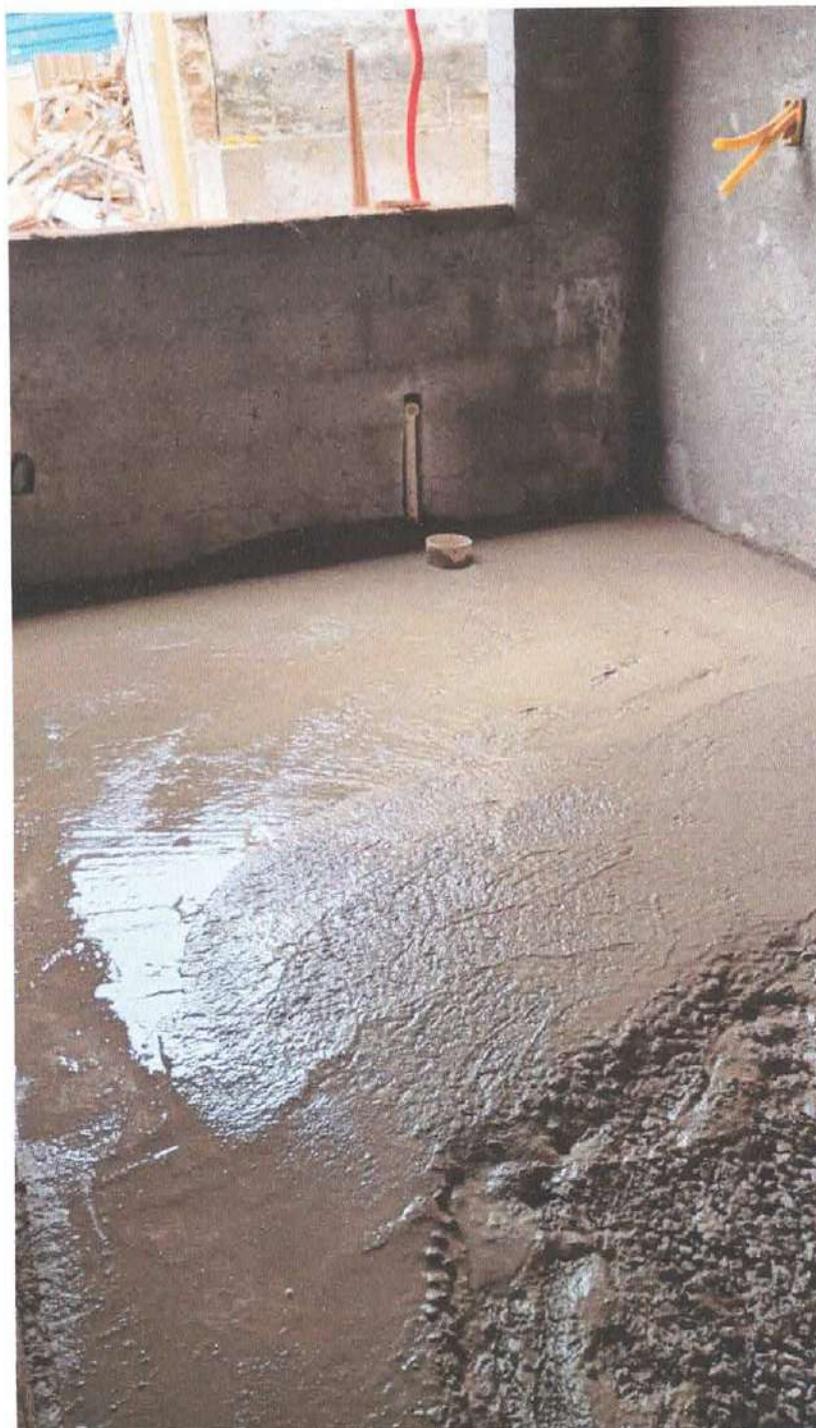


Foto 6: Lastro de concreto impermeabilizado 1º Pavimento

<p><b>Autor:</b></p> <p align="center"><i>[Handwritten Signature]</i> <b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430</p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p align="center"><i>[Handwritten Signature]</i> <b>FISCAL DO CONTRATO</b></p>
--	---

DATA:  
18/11/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFETÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 8 / 10

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO**

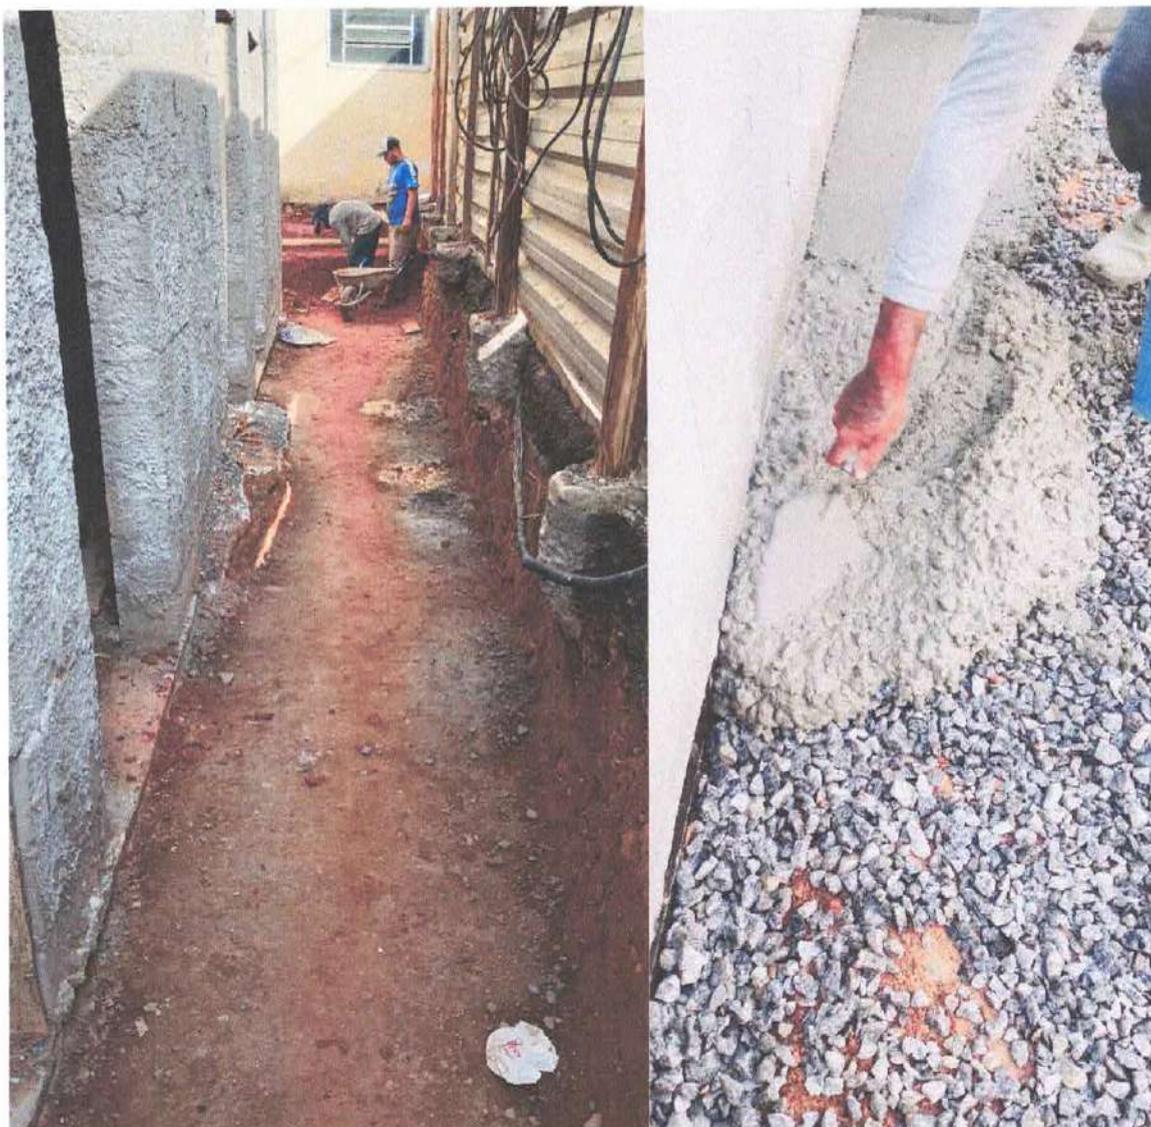


Foto 7 e 8: Regularização do terreno e concretagem da calçada

Autor:

  
**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
18/11/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 9 / 10

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO**



Foto 9: Colocação e fechamento das fôrmas das ferragens das vigas



Foto 10: Colocação dos EPS e escoramento da laje

Autor:

  
Luis Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

  
FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
18/11/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

**FOLHA: 10 / 10**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 11ª MEDIÇÃO**

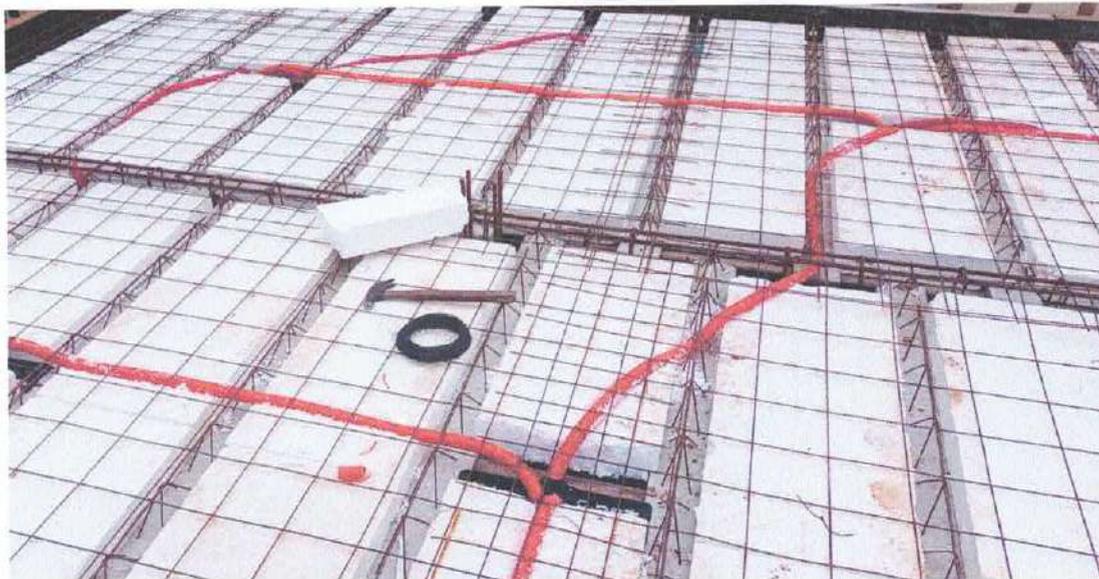


Foto 11: Colocação da malha pop e passagem de corrugados da laje

**Autor:**

  
**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

**Conferido:**

  
**FISCAL DO CONTRATO**



**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI**

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

OBJETO		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
					S/ BDI	C/ BDI		
<b>1 01 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO</b>								
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	100%	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	100%	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	100%	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	100%	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	un	5,00	739,39	924,23	5.545,38
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAJEM	100%	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
1.8	01.21.110	SONDAJEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	100%	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70
							<b>72.378,53</b>	
<b>2 02 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	100%	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	33%	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	100%	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	100%	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100%	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	100%	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	100%	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96
							<b>45.869,99</b>	
<b>3 06 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>								
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	100%	m³	10,00	39,47	49,33	493,30
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	100%	m³	10,00	12,27	15,33	153,30
							<b>646,60</b>	
<b>4 06 ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM</b>								
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³.mês	1.566,00	5,86	7,32	11.463,12

**11ª MEDIÇÃO - 18/11/2024**

QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
	-	1,00	-
	-	1,00	-
	-	6,00	-
	-	10,00	-
	-	12,00	-
	-	6,00	-
	-	1,00	-
	-	90,00	-
	-	-	-
	-	9,00	-
	-	9,00	-
1,00	719,85	3,00	4.319,10
	-	80,00	-
40,50	976,46	40,50	-
	-	6,00	-
	-	260,00	-
	-	428,00	-
	<b>1.696,31</b>		<b>4.319,10</b>
	-	10,00	0,00
	-	10,00	-
	-		<b>0,00</b>
<b>669,31</b>	<b>4.899,35</b>	<b>1566,00</b>	-

4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m²	783,00	10,01	12,51	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	100%	m²	16,20	102,53	128,16	2.076,19
4.4	08.05.180	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	100%	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96
4.5	08.06.040	BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	m	10,00	21,02	26,27	262,70
<b>24.906,30</b>								
<b>5</b>	<b>09</b>	<b>FORMA</b>						
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60
<b>84.975,60</b>								
<b>6</b>	<b>10</b>	<b>ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL</b>						
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	95%	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	86%	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	17%	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.841,28
<b>265.520,83</b>								
<b>7</b>	<b>11</b>	<b>CONCRETO, MASSA E LASTRO</b>						
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO	75%	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28
7.2	11.01.280	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	100%	m³	138,24	388,49	485,61	87.130,73
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	100%	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	50%	m²	39,19	125,27	156,58	8.136,37
<b>122.676,28</b>								
<b>8</b>	<b>12</b>	<b>FUNDAÇÃO PROFUNDA</b>						
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	9%	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50
<b>32.282,88</b>								
<b>9</b>	<b>13</b>	<b>LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRE-FABRICADOS</b>						
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	355,52	152,85	190,81	87.836,77
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04
<b>167.421,81</b>								
<b>10</b>	<b>14</b>	<b>ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR</b>						
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	85%	m²	800,50	66,27	82,83	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 18 X 19 X 39 CM - CL B	85%	m²	612,00	80,93	101,16	82.141,92
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	0%	m²	21,42	485,87	607,33	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	0%	m²	87,70	81,54	114,42	10.034,63
<b>171.490,96</b>								
<b>11</b>	<b>15</b>	<b>ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO</b>						
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 18,00 M	0%	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27
<b>46.132,27</b>								
<b>12</b>	<b>16</b>	<b>TELHAMENTO</b>						

336,69	4.211,99	783,00	-
-	-	16,20	-
-	-	81,00	-
-	-	10,00	-
9.111,34	-	-	-
-	-	480,74	0,00
-	-	-	-
1.291,04	15.066,44	13.143,70	7.939,10
499,03	6.871,64	1.788,95	3.919,63
355,52	5.361,24	831,73	63.098,79
-	27.299,32	-	74.957,52
24,00	11.223,84	46,92	7.379,67
-	-	138,24	-
19,80	1.999,01	200,00	94,90
-	-	19,60	3.067,40
-	13.222,85	-	10.541,98
-	-	1,00	-
-	-	42,00	27.552,24
-	-	-	27.552,24
355,52	67.836,77	355,52	-
-	-	476,21	-
-	67.836,77	-	-
84,00	6.957,72	684,38	-
50,00	5.058,00	694,12	11.924,74
-	-	0,00	13.009,00
-	-	0,00	10.034,63
-	12.015,72	-	34.968,37
-	-	0,00	46.132,27
-	-	-	-

12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	0%	m²	460,00	48,86	58,57	26.942,20
12.2	16.30.020	DÔMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	0%	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	0%	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,60 M	0%	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09
								66.411,23
13	17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL						
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	0%	m²	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	85%	m²	18,40	508,35	635,43	11.691,91
13.3	17.02.020	CHAPISCO	48%	m²	3.225,00	4,90	6,12	19.737,00
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	48%	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00
13.5	17.02.220	REBOCO	55%	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38
								122.001,29
14	18	REVESTIMENTO CERÂMICO						
14.1	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	0%	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37
14.2	18.06.182	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	0%	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 8MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	0%	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	0%	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67
								158.645,82
15	19	REVESTIMENTO EM PEDRA						
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	0%	m	146,10	118,12	147,65	21.571,66
								21.571,66
16	21	REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO						
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	0%	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00
16.2	21.10.061	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	0%	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	0%	m	34,50	19,15	23,93	825,58
								39.926,96
17	22	FORRO, BRISE E FACHADA						
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	0%	m²	718,00	66,94	86,17	61.870,06
								61.870,06
18	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA						
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM	0%	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	0%	un	6,00	1.388,73	1.733,41	10.400,46

-	-	0,00	26.942,20
-	-	0,00	12.842,37
-	-	0,00	11.234,57
-	-	0,00	15.392,09
-	-	-	66.411,23
-	-	0,00	2.947,00
15,64	9.938,13	15,64	-
-	-	1550,46	10.248,18
1.066,71	20.694,17	1550,46	32.486,08
922,30	10.099,19	1265,59	11.202,17
-	40.731,48	-	56.883,43
-	-	0,00	79.178,37
-	-	0,00	1.734,34
-	-	0,00	13.291,44
-	-	0,00	64.441,67
-	-	-	158.645,82
-	-	0,00	21.571,66
-	-	-	21.571,66
-	-	0,00	34.167,00
-	-	0,00	4.934,38
-	-	0,00	825,58
-	-	-	39.926,96
-	-	0,00	61.870,06
-	-	-	61.870,06
-	-	0,00	9.271,38
-	-	0,00	10.400,46



24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	213,47	426,94
24.8	30.06.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	0%	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	0%	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40
24.10	30.06.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	0%	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85
						33.781,21		
25	32	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA</b>						
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESURA DE 4 MM	0%	m²	113,30	63,84	79,55	9.013,01
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46
						11.025,47		
26	33	<b>PINTURA</b>						
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0%	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63
26.3	33.10.060	EPOXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	64,82	32,49	40,61	2.624,21
						106.390,40		
27	34	<b>PAISAGISMO E FECHAMENTOS</b>						
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	0%	m³	4,55	149,63	197,03	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	0%	m²	42,26	1,31	1,63	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	0%	m²	68,70	10,88	13,60	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	0%	un	15,00	29,53	36,91	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	0%	un	2,00	89,11	111,38	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,88	52,35	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	0%	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60
						31.353,92		
28	37	<b>QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>						
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	100%	un	1,00	500,24	625,30	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	0%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	0%	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	0%	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	0%	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	0%	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	0%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	0%	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	0%	un	4,00	580,04	700,05	2.800,20
						32.083,38		

			0,00		426,94
			0,00		4.789,55
			0,00		7.453,40
			0,00		5.304,85
					33.781,21
			0,00		9.013,01
			116,80		0,00
					9.013,01
			0,00		21.315,47
			0,00		54.458,63
			0,00		27.992,09
			0,00		2.624,21
					106.390,40
			0,00		850,98
			0,00		68,88
			0,00		934,32
			0,00		1.354,32
			0,00		553,65
			0,00		74,86
			0,00		222,76
			0,00		680,55
			0,00		26.613,60
					31.353,92
		1,00	625,30	1,00	-
		4,00	5.055,68	4,00	-
					1.172,50
					2.875,92
					1.294,64
					3.885,60
					1.112,10
					8.719,84
					4.541,60
					2.800,20
					32.083,38
		5.680,98			26.402,40

29 38 TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA								
28.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORÇADO, DN 25 MM	50%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORÇADO, DN 32 MM	53%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40
								18.566,00
30 39 CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA								
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	0%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	0%	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	0%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	0%	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	0%	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	0%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	0%	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	0%	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40
								50.884,50
31 40 DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA								
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	0%	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	0%	cj	6,00	22,80	28,25	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	0%	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	0%	cj	20,00	21,59	26,98	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	0%	cj	6,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	0%	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	0%	cj	4,00	25,45	31,81	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	0%	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82
								6.837,84
32 41 ILUMINAÇÃO								
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECUADO TRANSL. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W	0%	un	60,00	214,05	267,56	16.053,60
								52.126,72
33 43 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.								

	294,00	4.606,98	490,00	7.678,30
	60,00	1.069,80	96,00	1.497,72
		5.676,78		9.176,02
			0,00	17.262,00
			0,00	4.164,60
			0,00	3.227,00
			0,00	2.790,00
			0,00	354,80
			0,00	1.532,00
			0,00	4.219,20
			0,00	3.787,50
			0,00	4.452,00
			0,00	9.095,40
				50.884,50
			0,00	1.017,90
			0,00	169,50
			0,00	2.058,30
			0,00	539,60
			0,00	210,90
			0,00	1.098,58
			0,00	127,24
			0,00	1.615,82
				6.837,84
			0,00	1.521,69
			0,00	4.834,98
			0,00	10.927,04
			0,00	7.874,05
			0,00	10.915,36
			0,00	16.053,60
				52.126,72

33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	0%	un	5,00	362,50	453,12	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,07	227,58	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M <sup>3</sup> /H	0%	un	1,00	359,17	448,96	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	0%	cj	3,00	6.159,05	7.698,81	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETTE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	0%	cj	1,00	10.462,48	13.078,10	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	0%	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92
						<b>80.125,17</b>		
<b>34</b>	<b>44</b>	<b>APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS</b>						
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPAS - 6 LITROS	0%	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	0%	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	0%	un	6,00	99,71	124,63	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	0%	un	3,00	806,20	757,75	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	0%	m <sup>2</sup>	13,92	590,74	738,42	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	0%	un	10,00	69,91	87,38	873,80
34.7	44.03.180	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	0%	un	16,00	56,21	70,26	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	0%	un	4,00	34,59	43,23	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	0%	un	6,00	159,82	199,77	1.198,62
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2 OU 3/4"	0%	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	0%	un	6,00	201,68	252,10	1.512,60
						<b>23.594,07</b>		
<b>35</b>	<b>46</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.</b>						
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	50%	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	50%	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	50%	m	12,00	26,52	33,15	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	50%	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	50%	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	0%	m	6,00	68,85	111,06	666,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	0%	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	70%	m	120,00	55,56	70,70	8.484,00
						<b>37.030,14</b>		
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>						
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	106,87	133,58	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	954,00

			0,00	2.265,60	
			0,00	455,16	
			0,00	448,96	
			0,00	23.096,43	
			0,00	13.078,10	
			0,00	40.780,92	
				<b>80.125,17</b>	
			0,00	1.373,85	
			0,00	2.164,08	
			0,00	747,78	
			0,00	2.273,25	
			0,00	10.278,80	
			0,00	873,80	
			0,00	1.124,16	
			0,00	172,92	
			0,00	1.198,62	
			0,00	1.874,21	
			0,00	1.512,60	
				<b>23.594,07</b>	
		36,00	1.001,52	90,00	2.503,80
				75,00	3.761,25
				6,00	198,90
				30,00	1.275,90
				60,00	3.966,60
				0,00	666,36
				0,00	4.466,88
				84,00	2.545,20
			1.001,52		<b>19.384,89</b>
				0,00	534,32
				0,00	954,00

36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	18,00	80,13	100,16	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	6,00	78,61	95,76	574,56
								<b>3.665,44</b>
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>						
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	0%	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	356,70
								<b>9.706,26</b>
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>						
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	55%	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	90%	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	0%	un	2,00	354,29	442,86	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,94	16,17	161,70
								<b>9.458,78</b>
<b>39</b>	<b>54</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>						
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	7%	m²	76,65	174,79	218,48	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98
39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE E EM AREIA	0%	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
								<b>84.402,89</b>
<b>TOTAL</b>						<b>2.115.308,84</b>		

-	0,00	1.602,56	
-	0,00	574,56	
-		<b>3.665,44</b>	
-	0,00	9.349,56	
-	0,00	356,70	
-		<b>9.706,26</b>	
-	17,00	928,44	
-	18,00	572,92	
-	0,00	885,72	
-	0,00	161,70	
-		<b>2.548,78</b>	
113,93	438,63	113,93	1.528,72
5,70	1.244,57	5,70	15.501,92
-		0,00	12.355,98
-		0,00	53.333,07
-	<b>1.683,20</b>		<b>82.719,69</b>

<b>TOTAL GERAL 11ª MEDIÇÃO</b>		<b>185.956,27</b>
<b>% MEDIDO</b>		<b>9%</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>933.097,89</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.182.210,95</b>

Monteiro Lobato, 18 de novembro de 2024

  
Luis Gustavo de Barros  
Responsável Técnico  
CREA 5062695430

  
LUIZ RODOLFO MENDES GOMES  
CREA-SP-507119131  
SEC. MUNIC. DE OBRAS

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

340 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>6</b>	FICHA: 307	DATA: 22/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2024
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido <b>176.658,46</b> Desconto <b>9.297,81</b>
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00 Recursos Ordinarios		
800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND		
000 TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-Convên		

GL	<b>SOMA</b>	<b>185.956,27</b>
----	-------------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268.122,04	651.761,30	185.956,27	616.360,74

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>185.956,27</b>
cento e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos *****	

DESCONTOS		TOTAL DE DESCONTOS
8	1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	9.297,81
		<b>9.297,81</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	22/11/2024	<i>Lucia Ferreira</i>
--------------------------	------------	-----------------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA _____ Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora	_____ DATA _____ Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
				NOME: _____
				CNPJ/CPF: _____

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180

46643482/0001-07

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06573

DATA: 22/11/2024 VENCI 23/12/2024 PAGTO: 22/11/2024

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA

CEP:

**Discriminação...:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **185.956,27**

(cento e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 185.956,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
340	/ 6	GL 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 185.956,27	RR\$ 0,00	RR\$ 9.297,81	RR\$ 176.658,46
TOTAL . . . . .					RR\$ 185.956,27	RR\$ 0,00	RR\$ 9.297,81	RR\$ 176.658,46

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 176.658,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 176.658,46
TOTAL. . . . .			RR\$ 176.658,46

Despesa paga em 22/11/2024 Com os recursos acima discriminados

AMAURY DONIZETE DA SILVA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.07  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA  
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT  
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70  
VALOR: R\$ 176.658,46  
DEBITO EM: 22/11/2024

=====

DOCUMENTO: 112201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C18.9BE.73C.228.FE8

22/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:21:40  
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/11/2024
NR. DOCUMENTO	556.739.000.358.973
VALOR TOTAL	9.297,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN M LOBATO \*FUNDO  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.918.AF8.CED.F73.F15
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA S



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:35:22

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:38:29

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.541.090,96			1.260.243,454522		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.552.474,83			1.260.243,454522		1.260.243,454522

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.541.090,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.383,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.383,87
SALDO ATUAL =	1.552.474,83

### Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:35:28

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.000.087	1.796,93 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	34.141,60 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.938,53 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:38:39

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.552.474,83				1.260.243,454522		
19/02/2024	RESGATE	35.938,53				29.071,272826	1,236221414	1.231.172,181696
	Aplicação 03/10/2023	35.938,53				29.071,272826		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.525.871,94				1.231.172,181696		1.231.172,181696

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552.474,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.938,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.335,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.335,64
SALDO ATUAL =	1.525.871,94

### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:35:32

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.000.087	196,79 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.000.931	3.681,97 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.878,76 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:38:47

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência MARCO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.525.871,94				1.231.172,181696		
26/03/2024	RESGATE	3.878,76				3.112,043033	1,246370940	1.228.060,138663
	Aplicação 03/10/2023	3.878,76				3.112,043033		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.531.535,37				1.228.060,138663		1.228.060,138663

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.525.871,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.878,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.542,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.542,19
SALDO ATUAL =	1.531.535,37

### Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

### Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:35:41

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.000.087	891,34 D	
				30/04 15:14 PREF.MUNIC.MLOBATO - CON			
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	16.935,50 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.826,84 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:38:57

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência ABRIL/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.531.535,37				1.228.060,138663		
30/04/2024	RESGATE	17.826,84				14.200,609132	1,255357417	1.213.859,529531
	Aplicação 03/10/2023	17.826,84				14.200,609132		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.523.827,56				1.213.859,529531		1.213.859,529531

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.531.535,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.826,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.119,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.119,03
SALDO ATUAL =	1.523.827,56

### Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

### Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:35:51

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.608.556.360.122	3,00 C	
				15/05 16:08 14563488000170 ADM FABRICA			
15/05/2024		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	8.628,15 D	
				15/05 14:04 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	163.937,81 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.562,96 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:39:06

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência MAIO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.523.827,56				1.213.859,529531		
15/05/2024	RESGATE	172.562,96				137.055,944777	1,259069501	1.076.803,584754
	Aplicação 03/10/2023	172.562,96				137.055,944777		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.360.105,68				1.076.803,584754		1.076.803,584754

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.523.827,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.562,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.841,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.841,08
SALDO ATUAL =	1.360.105,68

### Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

### Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:35:58

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.000.087	398,66 D	
				11/06 14:27 PREF.MUNIC.MLOBATO - CON			
11/06/2024		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.000.087	2.406,35 D	
				11/06 14:27 PREF.MUNIC.MLOBATO - CON			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	7.574,45 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	45.720,70 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
11/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.100,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:40:27

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência JUNHO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.360.105,68				1.076.803,584754		
11/06/2024	RESGATE	56.100,16				44.324,410035	1,265671894	1.032.479,174719
	Aplicação 03/10/2023	56.100,16				44.324,410035		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.311.733,96				1.032.479,174719		1.032.479,174719

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360.105,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.100,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.728,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.728,44
SALDO ATUAL =	1.311.733,96

### Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

### Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:36:04

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2024		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.000.087	4.551,48 D	
				15/07 14:08 PREF.MUNIC.MLOBATO - CON			
15/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	86.478,11 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
15/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.029,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:40:38

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência JULHO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.311.733,96				1.032.479,174719		
15/07/2024	RESGATE	91.029,59				71.422,788960	1,274517438	961.056,385759
	Aplicação 03/10/2023	91.029,59				71.422,788960		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.229.160,47				961.056,385759		961.056,385759

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311.733,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.029,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.456,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.456,10
SALDO ATUAL =	1.229.160,47

### Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

### Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:36:11

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	4.375,94 D	
				13/08 14:48 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
13/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	83.142,80 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
13/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.518,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:42:45

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.229.160,47			961.056,385759		
13/08/2024	RESGATE	87.518,74			68.250,250567	1,282321153	892.806,135192
	Aplicação 03/10/2023	87.518,74			68.250,250567		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.149.200,33			892.806,135192		892.806,135192

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.229.160,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	87.518,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.558,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.558,60
SALDO ATUAL =	1.149.200,33

### Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

### Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3381709464372231  
17/10/2024 10:36:19

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2024		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	7.717,18 D	
				13/09 11:48 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	146.626,33 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
13/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.343,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381709464372231  
17/10/2024 10:42:56

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.149.200,33			892.806,135192		
13/09/2024	RESGATE	154.343,51			119.562,722325	1,290899931	773.243,412867
	Aplicação 03/10/2023	154.343,51			119.562,722325		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.001.428,89			773.243,412867		773.243,412867

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.149.200,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	154.343,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.572,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.572,07
SALDO ATUAL =	1.001.428,89

### Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

### Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360811471219451  
08/11/2024 11:53:56

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	4.239,31 D	
				31/10 14:56 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	80.546,83 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
31/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.786,14 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360811471219451  
08/11/2024 11:55:08

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.001.428,89				773.243,412867		
31/10/2024	RESGATE	84.786,14				65.017,774927	1,304045549	708.225,637940
	Aplicação 03/10/2023	84.786,14				65.017,774927		
31/10/2024	SALDO ATUAL	923.558,49				708.225,637940		708.225,637940

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.001.428,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.786,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.915,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.915,74
SALDO ATUAL =	923.558,49

### Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

### Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JE668467 AMAURY DONIZETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651  
08/04/2025 13:10:58

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2024		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	9.297,81 D	
				22/11 10:21 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
22/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	176.658,46 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
22/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.956,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651  
08/04/2025 13:19:06

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	923.558,49			708.225,637940		
22/11/2024	RESGATE	185.956,27			141.980,043144	1,309735269	566.245,594796
	Aplicação 03/10/2023	185.956,27			141.980,043144		
29/11/2024	SALDO ATUAL	742.807,60			566.245,594796		566.245,594796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	923.558,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	185.956,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.205,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.205,38
SALDO ATUAL =	742.807,60

### Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

### Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651  
08/04/2025 13:11:09

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651  
08/04/2025 13:19:16

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	742.807,60			566.245,594796		
31/12/2024	SALDO ATUAL	747.885,63			566.245,594796		566.245,594796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 742.807,60  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.078,03  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.078,03  
SALDO ATUAL = 747.885,63

### Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714  
31/12/2024 1,320779604

### Rentabilidade

No mês 0,6836  
No ano 8,0081  
Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**EMENDA PIX: 202341180001**  
**PARLAMENTAR: MARCO BERTAIOLLI**  
**PLANO DE AÇÃO: 09032023-038371 / 2023**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EMENDA PIX  
**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JÃO AURICCHIO  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
**CNPJ:** 46.643.482/0001-07  
**ENDEREÇO e CEP:** PRAÇA DEPUTADO ANTONIO SILVIO CUNHA BUENO, 180 - CENTRO, CEP: 12.250-000  
**RESPONSÁVEL (IS) PELO ÓRGÃO:** EDMAR JOSÉ DE ARAÚJO  
**VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO:** R\$ 0,00

<b>I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>	
	<b>VALORES R\$</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>RS 747.885,63</b>
<b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>	
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	<b>RS 11.862,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RS 759.747,73</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>	<b>RS 0,00</b>

O signatário, na qualidade de representante do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no valor de R\$0,00, mais saldo do exercício anterior no valor de R\$ 747.885,63 (setecentos e quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), mais rendimentos financeiros no valor de R\$ 11.862,10 (onze mil oitocentos e sessenta e dois reais e dez centavos).

<b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
13/01/2025	NF: 580	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS 279.239,06
11/02/2025	NF: 583	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS 247.019,36
30/04/2025	NF: 597	ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS 90.102,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>RS 616.360,74</b>
<b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>				<b>RS 143.386,99</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>RS 0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				<b>RS 143.386,99</b>

Declaro, na qualidade de responsável pelo órgão beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Controle Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3)**

<b>AJUSTE Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>CONTRATADO / CNPJ</b>	<b>OBJETO RESUMIDO</b>	<b>LICITAÇÃO Nº (4)</b>	<b>FONTE (5)</b>	<b>VALOR GLOBAL DO AJUSTE</b>
235/2023	26/10/2023	ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAUDE DR. JOÃO AURICCHIO	TOMADA DE PREÇOS N: 08/2023	FEDERAL	R\$ 2.326.081,35

**LOCAL E DATA:** MONTEIRO LOBATO, 11 DE JUNHO DE 2025.

**RESPONSÁVEL:** EDMAR JOSÉ DE ARAUJO - PREFEITO MUNICIPAL

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b></p>		Número da Nota <b>580</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>13/01/2025 11:42:31</b>			
			Código de Verificação * <b>EVDJ-E1PF</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 13/01/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 12ª Medição Período:19/11/2024 a 09/01/2025 Valor: R\$ 279.239,06  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço <b>R\$ 279.239,06</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 279.239,06</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>13.961,95</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 279.239,06</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 265.277,11</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Lu

14.01.25

Francisco Alexandro Henriques DA Silva  
CPF 178 249-838 . 19



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE OBRAS

**MEMORANDO 25005/2025**

**A/C: Secretaria de Finanças**

**De: Secretaria de Obras**

**Ref.:** 12º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.


Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 12º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023, no valor total de R\$265.277,11 referente a seguinte nota fiscal, nº580.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 14 de janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
**RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE  
ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI**

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



**PREFEITURA DE  
MONTEIRO  
LOBATO**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO**

**DATA:** 10/01/2024

**RELATÓRIO Nº:**  
12/2023

**CONFERIDO:**

Fiscal do contrato

**AUTOR:**

**CONTRATO:** 097/2023

Luis Gustavo de Barros – Eng. Civil

**CREA:** SP-5062695430

DATA: 10/01/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>	FOLHA: 2 / 7
<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO</b>		

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1: Ferragem das vigas e pilares

<b>Autor:</b>  Luis Gustavo de Barros CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
---	---

DATA:  
10/01/2024

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 7

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO**



Foto 2: Ferragem das vigas e pilares



Foto 3: Alvenaria do 2º Pavimento

Autor:

  
**Luis Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA:  
10/01/2024

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 7

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO



Foto 4: Alvenaria do 2º Pavimento



Foto 5: Preparação com lastro de brita e malha pop para a concretagem

Autor:

  
Luís Gustavo de Barros  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

<p>DATA: 10/01/2024</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO</b></p>	<p align="center">FOLHA: 5 / 7</p>
-----------------------------	--	------------------------------------



Foto 6: Concretagem do piso do 1º Pavimento



Foto 7: Emboço do 1º Pavimento

<p>Autor:</p> <p align="center">   <b>Luis Gustavo de Barros</b>          CREA: 5062695430       </p>	<p>Conferido:</p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p>
--	--

<p>DATA: 10/01/2024</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO</b></p>	<p align="right">FOLHA: 6 / 7</p>
-----------------------------	--	-----------------------------------

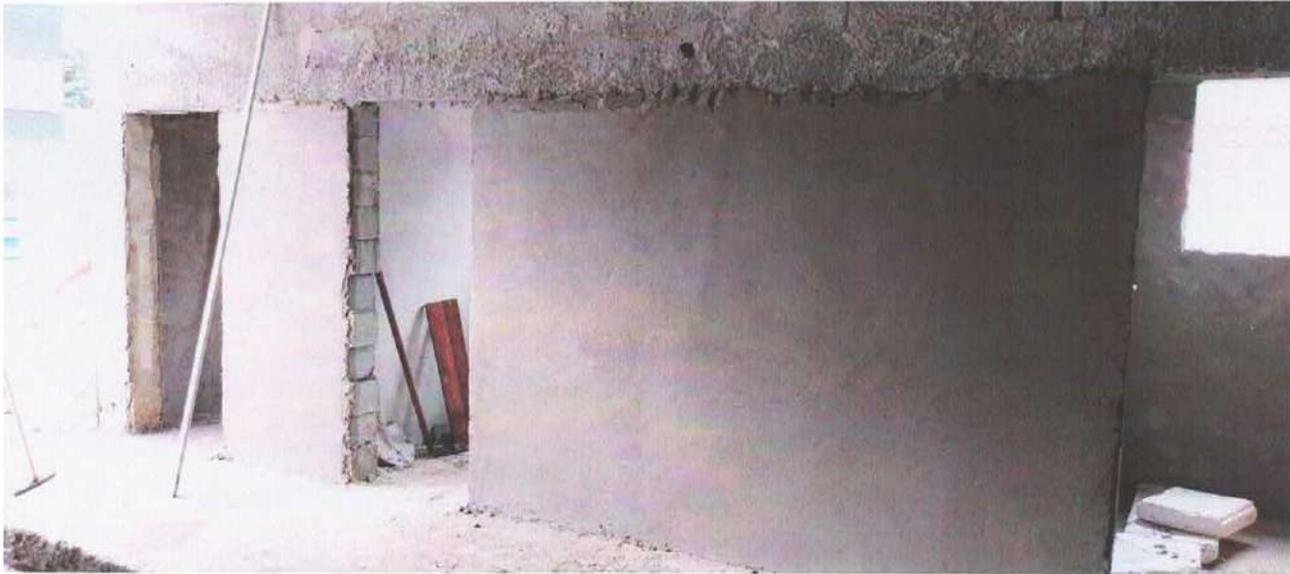


Foto 8: Reboco do 1º Pavimento



Foto 9: Revestimentos do 1º Pavimento

<p><b>Autor:</b></p> <p align="center">   <b>Luis Gustavo de Barros</b>          CREA: 5062695430       </p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p>
---	---

DATA: 10/01/2024	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 12ª MEDIÇÃO</b>	FOLHA: 7 / 7
---------------------	---	--------------

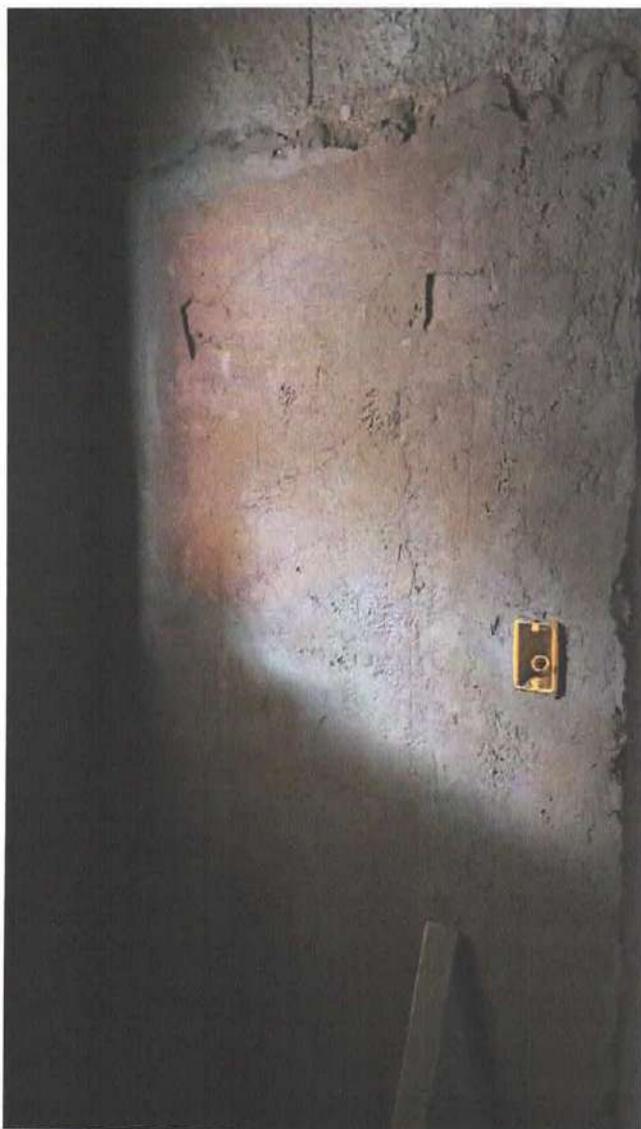


Foto 10: Instalação de caixinhas 4x2 de elétrica no 1º Pavimento

Autor:  <b>Luis Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	Conferido:  FISCAL DO CONTRATO
---	--------------------------------------



## ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

## PLANILHA DE MEDIÇÃO

BDI = 25%

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
					S/ BDI	C/ BDI		
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO</b>						
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15	
1.2	01.06.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72	
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36	
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70	
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84	
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38	
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAAGEM	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68	
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70	
							<b>72.378,53</b>	
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA</b>						
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82	
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10	
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65	
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80	
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46	
2.6	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00	
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20	
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	m²	428,00	12,06	15,07	6.449,96	
							<b>45.869,99</b>	
<b>3</b>	<b>06</b>	<b>SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>						
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	m³	10,00	39,47	49,33	493,30	
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	10,00	12,27	15,33	153,30	
							<b>646,60</b>	
<b>4</b>	<b>08</b>	<b>ESCORAMENTO, CONTENCAO E DRENAGEM</b>						

## 12ª MEDIÇÃO - 09/01/2025

QUANT.	MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
		-	-	5.254,15	-
		-	-	6.710,72	-
		-	-	15.861,36	-
		-	-	19.387,70	-
		-	-	9.987,84	-
		-	-	5.545,38	-
		-	-	1.177,68	-
		-	-	8.453,70	-
		-	-		-
		-	-	7.055,82	0,00
		-	-	10.385,10	-
1,00		719,85	0,11	2.879,40	3.599,25
		-	-	7.704,80	-
		-	-	976,46	-
		-	-	5.085,00	-
		-	-	1.734,20	-
		-	-	6.449,96	-
		<b>719,85</b>			<b>3.599,25</b>
		-	-	493,30	0,00
		-	-	153,30	-
		-	-		<b>0,00</b>





18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 60 X 160 CM	33%	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	33%	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	29%	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	33%	m	30,00	133,79	167,23	5.016,80
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	33%	m²	0,90	133,79	167,23	150,50
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPENSÃO EM MADEIRA COM BATENTE	26%	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	25%	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00
18.8	23.09.560	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	33%	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 160 X 210 CM	33%	un	12,00	1.019,98	1.274,95	15.299,40
18.10	23.20.100	BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA	30%	un	16,90	44,29	55,36	935,58
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	30%	m	16,90	6,82	8,52	143,98
							<b>82.326,65</b>	
<b>19</b>	<b>24</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO</b>						
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	100%	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0%	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95
							<b>27.658,42</b>	
<b>20</b>	<b>25</b>	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO</b>						
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	22%	m²	41,10	666,45	833,06	34.238,76
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	78%	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	24%	m²	4,10	549,15	666,43	2.814,36
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	21%	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	24%	m²	16,80	595,98	746,20	12.536,16
							<b>66.470,65</b>	
<b>21</b>	<b>26</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>						
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	0%	m²	1,50	420,84	526,05	789,07
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	0%	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49
							<b>2.774,56</b>	
<b>22</b>	<b>27</b>	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>						
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	0%	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52
							<b>19.658,52</b>	
<b>23</b>	<b>28</b>	<b>FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>						
23.1	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	0%	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32
							<b>1.231,32</b>	
<b>24</b>	<b>30</b>	<b>ACESSIBILIDADE</b>						
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	0%	m	7,00	149,33	166,66	1.306,62
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	0%	un	7,00	95,90	119,87	839,09
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	0%	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18

	2,00	3.090,46	0,33	3.090,46	6.180,92
	2,00	3.466,82	0,33	3.466,82	6.933,64
	5,00	8.748,55	0,29	8.748,55	20.996,52
	10,00	1.672,30	0,33	1.672,30	3.344,60
	0,30	50,17	0,33	50,17	100,33
	1,00	488,25	0,26	488,25	1.357,33
	1,00	928,50	0,25	928,50	2.785,50
	2,00	1.934,60	0,33	1.934,60	3.869,20
	4,00	5.099,80	0,33	5.099,80	10.199,60
	5,00	276,80	0,30	276,80	658,78
	5,00	42,60	0,30	42,60	101,38
		<b>25.798,85</b>			<b>56.527,80</b>
	29,75	26.314,47	1,00	26.314,47	-
		-		-	1.343,95
		26.314,47			1.343,95
	9,00	7.497,54	0,22	7.497,54	26.741,22
	23,00	20.306,70	0,78	20.306,70	5.782,99
	1,00	686,43	0,24	686,43	2.127,93
	4,00	4.352,00	0,21	4.352,00	16.439,68
	4,00	2.984,80	0,24	2.984,80	9.551,36
		<b>35.827,47</b>			<b>60.643,18</b>
	-	-	-	-	789,07
	-	-	-	-	1.985,49
	-	-	-	-	2.774,56
	-	-	-	-	19.658,52
	-	-	-	-	19.658,52
	-	-	-	-	1.231,32
	-	-	-	-	1.231,32
	-	-	-	-	1.306,62
	-	-	-	-	839,09
	-	-	-	-	2.203,18

24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	0%	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	0%	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05
24.6	30.04.060	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	0%	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	213,47	426,94
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	0%	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	0%	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	0%	un	5,00	846,78	1.060,97	5.304,85
<b>25</b>	<b>32</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA</b>						<b>33.781,21</b>
25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 4 MM	0%	m²	113,30	63,64	78,55	9.013,01
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46
<b>26</b>	<b>33</b>	<b>PINTURA</b>						<b>11.025,47</b>
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0%	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	64,82	32,49	40,61	2.624,21
<b>27</b>	<b>34</b>	<b>PAISAGISMO E FECHAMENTOS</b>						<b>106.390,40</b>
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	0%	m³	4,65	149,63	187,03	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	0%	m²	42,26	1,31	1,63	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	0%	m²	68,70	10,88	13,60	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MOREIA - H= 0,50 M	0%	un	15,00	29,53	36,91	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	0%	un	2,00	89,11	111,38	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,86	52,35	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	0%	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60
<b>28</b>	<b>37</b>	<b>QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>						<b>31.353,92</b>
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	100%	un	1,00	500,24	625,30	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.283,92	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	0%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	0%	un	24,00	95,87	119,83	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	0%	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	0%	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60

-	-	-	-	2.471,91
-	-	-	-	2.170,05
-	-	-	-	6.815,62
-	-	-	-	426,94
-	-	-	-	4.789,55
-	-	-	-	7.453,40
-	-	-	-	5.304,85
-	-	-	-	33.781,21
-	-	-	-	9.013,01
-	-	2.012,46	-	0,00
-	-	-	-	9.013,01
-	-	-	-	21.315,47
-	-	-	-	54.458,63
-	-	-	-	27.992,09
-	-	-	-	2.624,21
-	-	-	-	106.390,40
-	-	-	-	850,98
-	-	-	-	68,88
-	-	-	-	934,32
-	-	-	-	1.354,32
-	-	-	-	553,65
-	-	-	-	74,86
-	-	-	-	222,76
-	-	-	-	680,55
-	-	-	-	26.613,60
-	-	-	-	31.353,92
-	-	625,30	-	-
-	-	-	5.055,68	-
-	-	-	-	1.172,50
-	-	-	-	2.875,92
-	-	-	-	1.294,64
-	-	-	-	3.885,60

28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	0%	un	6,00	149,28	185,35	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	0%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	0%	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	0%	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20
						<b>32.083,38</b>		
<b>29</b>	<b>38</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA</b>						
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	50%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	53%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40
						<b>18.566,00</b>		
<b>30</b>	<b>39</b>	<b>CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>						
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C	0%	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80
30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO FI-60, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	m	120,00	29,68	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLACAO HEPR 90°C	0%	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40
						<b>50.884,50</b>		
<b>31</b>	<b>40</b>	<b>DISTRIBUICAO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>						
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF., 400X400X150 MM	33%	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	33%	cj	6,00	22,60	28,25	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	20,00	21,59	26,98	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	cj	6,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	33%	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	50%	cj	4,00	25,45	31,81	127,24
31.8	40.10.106	CONTADOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF	50%	un	2,00	646,33	807,91	1.615,82
						<b>6.837,84</b>		
<b>32</b>	<b>41</b>	<b>ILUMINACAO</b>						
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,66	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04

		-	-	-				1.112,10
		-	-	-				8.719,84
		-	-	-				4.541,60
		-	-	-				2.800,20
		-	-	-				26.402,40
		-	-	-				
		-	-	7.678,30				7.678,30
		-	-	1.711,68				1.497,72
		-	-	-				9.176,02
		-	-	-				
		-	-	-				17.262,00
		-	-	-				4.164,60
		-	-	-				3.227,00
		-	-	-				2.790,00
		-	-	-				354,80
		-	-	-				1.532,00
		-	-	-				4.219,20
		-	-	-				3.787,50
		-	-	-				4.452,00
		-	-	-				9.095,40
		-	-	-				50.884,50
		2,00	339,30	0,33			339,30	678,60
		2,00	56,50	0,33			56,50	113,00
		45,00	1.029,15	0,50			1.029,15	1.029,15
		10,00	269,80	0,50			269,80	269,80
		2,00	70,30	0,33			70,30	140,60
		16,00	358,72	0,33			358,72	739,86
		2,00	63,62	0,50			63,62	63,62
		1,00	807,91	0,50			807,91	807,91
			2.995,30					3.842,54
		-	-	-				1.521,69
		-	-	-				4.834,98
		-	-	-				10.927,04



35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	0%	m	36,00	99,27	124,08	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM. INCLUSIVE CONEXÕES	70%	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00
						37.030,14		
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>						
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	106,87	133,58	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	38%	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	6,00	76,61	95,76	574,56
						3.665,44		
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>						
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	0%	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	356,70
						9.706,26		
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>						
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	65%	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	90%	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	0%	un	2,00	354,29	442,86	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,94	16,17	161,70
						9.458,78		
<b>39</b>	<b>54</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO</b>						
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,95	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	7%	m³	76,65	174,79	218,48	16.748,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98
39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONC. 35 MPA, ESPESURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ.E EM AREIA	0%	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
						84.402,89		
<b>TOTAL</b>					<b>2.326.081,38</b>			

								4.466,88
							5.938,80	2.545,20
								<b>19.384,89</b>
								534,32
								954,00
		6,00	600,96	0,38			600,96	1.001,60
								574,56
			600,96					<b>3.064,48</b>
								9.349,56
								356,70
								<b>9.706,26</b>
							1.753,72	928,44
							5.156,28	572,92
								885,72
								161,70
								<b>2.548,78</b>
							438,63	1.528,72
							1.244,57	15.501,92
								12.355,98
								53.333,07
								<b>82.719,69</b>

<b>TOTAL GERAL 12ª MEDIÇÃO</b>				<b>279.239,06</b>
<b>% MEDIDO</b>				<b>12,00%</b>
<b>ACUMULADO</b>				<b>1.212.336,95</b>
<b>SALDO REMANESCENTE</b>			R\$	<b>1.113.744,43</b>

Monteiro Lobato, 09 de janeiro de 2025

*DEFINIDO  
Diagnóstico  
14.01.25*



---

Luis Gustavo de Barros  
Responsável Técnico  
CREA 5062695430

<b>PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO</b> PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180 46643482/0001-07	<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>  <b>340 / 1</b>
---	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº <b>1</b>	FICHA: <b>8002</b>	DATA: <b>14/01/2025</b>	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: <b>OBRA TOMADA</b>	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: <b>15/01/2025</b>
-------------------------------	-----------	------------	-------------------------------

NOME: <b>ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS</b>	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: <b>10786</b>
ENDEREÇO: <b>R MILTON JOSE NUNES FERNANDES</b>	<b>GUARATINGUETA</b>	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido <b>265.277,11</b>
800 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND 000 TRANSF. UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-FINALI		Desconto <b>13.961,95</b>
<b>EX</b>	<b>SOMA</b>	<b>279.239,06</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
616.360,74	279.239,06	279.239,06	337.121,68

**VALOR A SER PAGO R\$** **279.239,06**

duzentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e seis centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

8 1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	13.961,95	
		<b>TOTAL DE DESCONTOS 13.961,95</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 14/01/2025 \_\_\_\_\_ RAÍSSA MATOS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ Amaury Donizete da Silva- Secretária Municipal de Finanças

EMITIDO EM _____ DATA <u>Marcela Oliveira de Carvalho - Contadora</u>	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA <u>Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.</u>
--	---

DESPESA PAGA EM _____	<b>RECIBO</b>																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">BANCO</th> <th style="width:10%;">CONTA</th> <th style="width:10%;">CHEQUE</th> <th style="width:10%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														
_____	NOME: CNPJ/CPF:																

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**

PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07 Exercício: 2025

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 15/01/2025 **VENCI 15/01/2025** PAGTO: 15/01/2025

Credor...: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE EST. CNPJ: 14.563.488/0001-70 Cod: 10786

Endereço: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES

Cidade...: GUARATINGUETA CEP:

**Discriminação...:**

PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.

Valor **279.239,06**

(duzentos e setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove reais e seis centavos) \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 279.239,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
340	/ 1	EX 010401	10.301.0012.1009.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 279.239,06	RR\$ 0,00	RR\$ 13.961,95	RR\$ 265.277,11
TOTAL . . . . .					RR\$ 279.239,06	RR\$ 0,00	RR\$ 13.961,95	RR\$ 265.277,11

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 265.277,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

EDMAR JOSÉ DE ARAUJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	40681		RR\$ 265.277,11
TOTAL . . .			RR\$ 265.277,11

Despesa paga em 15/01/2025 Com os recursos acima discriminados

CAROLINA DE SOUSA SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: RECIBO DOCTO ANEXO

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3311516382571871  
15/01/2025 16:50:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.10  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704

AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA

CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70

VALOR: R\$ 265.277,11

DEBITO EM: 15/01/2025

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: 2.C66.0A2.000.728.47A

Transação efetuada com sucesso por: J1599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1

## Creditado

Nome PREF MUN M LOBATO \*FUNDO  
Agência 6739-3  
Conta corrente 358973-0  
Valor 13.961,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J1589313 CAROLINA DE SOUSA SILVA	15/01/2025 16:54:37
	JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO	15/01/2025 16:56:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>583</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>11/02/2025 15:48:46</b>			
			Código de Verificação * <b>64DK-X2A6</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 -- CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/02/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 13ª Medição Período: 10/01/2025 a 11/02/2025 Valor: R\$ 247.019,36  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114, inciso II, da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço <b>R\$ 247.019,36</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 247.019,36</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>12.350,97</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 247.019,36</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 234.668,39</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
<b>- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b>						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CUBA  
SECRETARÍA NACIONAL DE EXAMENES  
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

*Francisco Alemanno Henrique 10/1/19*  
*179244838-19*

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE OBRAS

**MEMORANDO 25027/2025**

**A/C: Secretaria de Finanças  
De: Secretaria de Obras**

**Ref.:** 13º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.

Prezados,

A Secretaria de Obras, vem por meio solicitar o pagamento da 13º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo N° 230852/2023, Tomada de Preço N°008/2023, no valor total de R\$247.019,36 referente a seguinte nota fiscal, n°583. Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 13 de fevereiro de 2025.

**RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS



**PLANILHA DE MEDIÇÃO**

DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESOBRIGADA

BDI = 25%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO S/P										13ª MEDIÇÃO - 07/02/2025				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE		
					B/DI	C/DI								
<b>01 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO</b>														
1.1	01.02.071	PARCELA TÉCNICA DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA SUPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUIDA ATÉ 1.500 M²	100%	un	1,00	4.253,12	5.254,15	-	-	0,00%	5.254,15	-		
1.2	01.08.021	QUANTIFICAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BITE DEMANDA DE 25 KW	100%	un	1,00	5.248,98	8.710,72	-	-	0,00%	8.710,72	-		
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE PROJETO EM FORMATO A1	100%	un	8,00	2.114,05	16.912,40	-	-	0,00%	16.912,40	-		
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	un	18,00	1.551,02	27.918,36	-	-	0,00%	27.918,36	-		
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	100%	un	12,00	600,98	7.211,76	-	-	0,00%	7.211,76	-		
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	un	9,00	738,38	6.645,42	-	-	0,00%	6.645,42	-		
1.7	01.21.019	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDADEM	100%	tr	1,00	842,13	1.177,88	-	-	0,00%	1.177,88	-		
1.8	01.21.110	SOLIDARIEDADE DO TERRENO A PERÍCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	100%	m	90,00	75,13	6.761,70	-	-	0,00%	6.761,70	-		
							<b>72.978,62</b>							
<b>02 INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>														
2.1	02.81.135	BANHEIRO GURMIÇO MODELO 31 ANDAR, COM MANUTENÇÃO COM CRONO ENDEBENS DA REDE	100%	un	9,00	627,18	5.644,62	-	-	0,00%	5.644,62	0,00		
2.2	02.82.130	LOCALIZ. DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	un	9,00	929,12	8.362,08	-	-	0,00%	8.362,08	-		
2.3	02.82.150	LOCALIZ. DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	22%	un	9,00	570,98	5.138,82	1,00	719,85	11,11%	5.858,67	2.879,40		
2.4	02.83.125	TUBO PERFORADO PARA ACHATAÇÃO DE AREAS, COM BORTÃO	100%	m	30,00	77,93	2.337,90	-	-	0,00%	2.337,90	-		
2.5	02.85.230	ANDARIM DE TUBO METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	100%	m	40,00	19,23	769,20	-	-	0,00%	769,20	-		
2.6	02.88.035	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100%	m	8,00	878,30	7.026,40	-	-	0,00%	7.026,40	-		
2.7	02.88.035	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 12 H	100%	m	380,00	5,34	2.029,20	-	-	0,00%	2.029,20	-		
2.8	02.16.230	LOCALIZAÇÃO DE OBRA E SINALIZAÇÃO	100%	m	420,00	12,00	5.040,00	-	-	0,00%	5.040,00	-		
							<b>49.889,89</b>	<b>719,85</b>				<b>2.879,40</b>		
<b>03 SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>														
3.1	03.02.027	ESCALA MANUAL EM SOLO DE 10ª CATEGORIA EM 3ª A 4ª CAMADA ATÉ 15 CM	100%	m³	18,00	26,42	475,56	-	-	0,00%	475,56	0,00		
3.2	03.11.045	REATERRO MANUAL, APLACADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	100%	m³	18,00	12,27	220,86	-	-	0,00%	220,86	0,00		
							<b>696,42</b>							
<b>04 ESCORIMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM</b>														
4.1	04.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³	1.508,00	5,83	8.771,24	-	-	0,00%	8.771,24	0,00		
4.2	04.02.080	MONTAGEM DE CIMBRAMENTO DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³	703,00	10,51	7.384,51	-	-	0,00%	7.384,51	-		
4.3	04.05.100	DRENÓ - COM PEDRA BOMBADEIRA	100%	m³	14,23	162,35	2.310,16	-	-	0,00%	2.310,16	0,00		
4.4	04.05.161	MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 150 N/M E TRANSVERSAL DE 20 N/M	100%	m²	81,00	13,33	1.080,00	-	-	0,00%	1.080,00	-		
4.5	04.08.040	BARBAÇA EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 (MM)	100%	m	16,00	21,25	340,00	-	-	0,00%	340,00	-		
							<b>14.475,81</b>							
<b>05 FORMA</b>														
5.1	05.02.025	FORMA PLANA EM COMPENSO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m³	438,74	14,14	6.200,00	-	-	0,00%	6.200,00	0,00		
							<b>6.200,00</b>							
<b>06 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL</b>														
6.1	10.01.045	ARMADURAS EM BARRAS DE AÇO CA-50 (A) Ø 11 FV = 552 NPA	100%	kg	13.824,00	8,34	115.300,96	-	-	0,00%	115.300,96	0,00		
6.2	10.01.090	ARMADURAS EM BARRAS DE AÇO CA-50 (A) Ø 11 FV = 892 NPA	100%	kg	3.473,35	11,02	38.265,47	-	-	0,00%	38.265,47	0,00		
6.3	10.02.020	ARMADURAS EM TELA SOLDADA DE AÇO	100%	kg	5.016,00	12,07	60.517,20	4.351,27	62.661,15	92,76%	75.641,28	-		
							<b>246.529,89</b>		<b>62.661,15</b>		<b>-R\$ 6.000,00</b>			
<b>07 CONCRETO, MASSA E LASTRO</b>														
7.1	11.01.205	CONCRETO USADO, FUR = 20 MPa - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	52,70	274,13	14.446,71	-	-	0,00%	14.446,71	0,00		
7.2	11.01.240	CONCRETO USADO, FUR = 25 MPa - PARA BOMBAMENTO	100%	m³	136,24	386,44	52.647,76	-	-	0,00%	52.647,76	0,00		
7.3	11.15.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB	100%	m³	308,84	80,77	24.946,87	-	-	0,00%	24.946,87	0,00		
7.4	14.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	m³	38,19	125,27	4.784,25	-	-	0,00%	4.784,25	0,00		
							<b>122.825,59</b>							
<b>08 FUNDAÇÃO PROFUNDA</b>														
8.1	12.05.015	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	tr	1,00	1.894,38	1.894,38	-	-	0,00%	1.894,38	-		
8.2	12.05.020	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	100%	m	459,00	54,03	24.901,80	408,00	27.552,24	90,67%	30.388,50	-		
							<b>32.796,18</b>	<b>27.552,24</b>			<b>-R\$ 4.833,77</b>			
<b>09 LAJE E PAREDE DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS</b>														
9.1	13.01.129	L.A.E. PRÉ-FABRICADO ALIETA - BOITA TRELÇADA ALTA CERÂMICA - LT 20 (10+10) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	100%	m²	355,92	192,33	68.462,77	-	-	0,00%	68.462,77	-		
9.2	13.01.135	L.A.E. PRÉ-FABRICADO ALIETA - VIGETA TRELÇADA ALTA CERÂMICA - LT 24 (10+14) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPa	100%	m²	478,21	187,30	89.585,84	-	-	0,00%	89.585,84	-		
							<b>158.048,61</b>							
<b>10 ALVENARIA E ELEMENTO DIVERSO</b>														
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 14 X 18 X 30 CM - CL B	100%	m³	860,50	88,27	75.958,45	-	-	0,00%	75.958,45	0,00		
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 12 X 18 X 30 CM - CL B	100%	m³	812,00	80,33	65.228,96	-	-	0,00%	65.228,96	7.101,45		
10.3	14.23.070	ORÇAMENTO PARA PAREDE ALVENARIA COM REBRUSQUE ALUMÍNIO - INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	0%	m³	21,42	485,87	10.410,30	-	-	0,00%	10.410,30	13.009,00		
10.4	14.23.310	ORÇAMENTO PARA PLACAS DE GESSO ACABAMENTO REBRUSQUE DO TUBO DE VENTILADOR, ESPESURA 125 (MM) - 107 X 107	0%	m³	87,00	97,34	8.466,58	-	-	0,00%	8.466,58	10.084,68		
							<b>171.863,29</b>				<b>-R\$ 15.987,19</b>			
<b>11 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO</b>														
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TEÇOURADA PARA TELHA PERFE. ONDULADO - VÃOS 1,83 A 1,80 M	0%	m³	355,02	102,81	36.499,76	-	-	0,00%	36.499,76	46.132,27		
							<b>44.122,27</b>				<b>-R\$ 46.132,27</b>			
<b>12 TELHAMENTO</b>														
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFURÇADO COM FIBRA DE VIDRO - PERFIL ONDULADO DE 4 MM	0%	m³	480,00	48,49	23.277,20	-	-	0,00%	23.277,20	26.942,20		
12.2	16.35.020	GOMO DE ACRÍLICO FECHADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	0%	m³	17,00	567,08	9.640,36	-	-	0,00%	9.640,36	12.842,37		
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPPA DE POLICARBONATO AL. (50 X 40 DE 16 MM)	0%	m³	20,00	240,57	4.811,40	-	-	0,00%	4.811,40	11.254,57		
12.4	16.33.050	CAIXA D'ÁGUA AFIBR. EM CHAP. G. ALUMINIZADA Nº 24 - 00218.07 M	0%	m	172,22	108,73	18.611,23	-	-	0,00%	18.611,23	15.392,09		
							<b>66.411,23</b>				<b>-R\$ 66.411,23</b>			
<b>13 REVESTIMENTO EM MASSA DO FUNDO DO LOCAL</b>														
13.1	17.01.010	M3 DE MASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA ESPALDA	0%	m³	2,55	843,94	2.152,05	-	-	0,00%	2.152,05	2.947,00		
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	0%	m²	18,45	508,10	9.371,85	-	-	0,00%	9.371,85	1.753,78		

*[Handwritten signature]*

13.3	17.62.029	CHAPISCO	48%	m²	1,225.95	4.26	5.12	10,272.20	-	-	0,00%	9.488,82	10.248,18
13.4	17.62.120	EMBOÇO COMUM	74%	m²	1,225.95	15,22	10,40	62,295.20	-	-	0,00%	46.345,82	16.219,18
13.5	17.62.229	REBOÇO	13%	m²	2,263.32	6,78	10,65	25,060.38	-	-	0,00%	18.368,08	6.661,80
												R\$	37.859,45
<b>14 18 REVESTIMENTO CERÂMICO</b>													
14.1	18.88.142	PLACA CERÂMICA ESALTADA ANTEDEBRANTE PARA ÁREA INTERIOR COM BORDA PARA O EXTERIOR GRUPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA RESISTÊNCIA QUÍMICA AGRANTADA COM ARGAMASSA COLANTE	50%	m²	537,83	117,77	147,21	78.174,37	33,79	7.917,84	10,00%	30.589,19	39.589,18
14.2	18.88.142	BORDA DE PLACA CERÂMICA ESALTADA RUSTICA PARA ÁREA INTERIOR COM BORDA PARA O EXTERIOR GRUPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA RESISTÊNCIA QUÍMICA B. ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	20%	m	306,59	4,93	5,76	1.754,24	36,01	178,43	10,00%	867,17	867,17
14.3	18.87.029	PLACA CERÂMICA NÃO ESALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESURA DE 8MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	30%	m²	14,23	143,31	174,10	13.201,44	7,42	1.329,14	10,00%	6.645,72	6.645,72
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESALTADA 29X23 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E RELIANTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL ESALTADA	30%	m²	839,48	35,51	38,83	94.411,67	53,64	8.644,17	10,00%	37.220,84	37.220,83
												R\$	79.321,80
<b>15 18 REVESTIMENTO EM PEDRA</b>													
15.1	18.81.029	PELÍCULA E/OU SOLERA EM GRANITO, ESPESURA DE 2 CM E LARGURA DE 29 CM, ACABAMENTO POLIDO	14%	m	149,19	118,12	147,49	21.571,68	50,00	7.382,50	34,22%	18.168,33	3.403,33
												R\$	3.403,33
<b>16 21 REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO</b>													
16.1	21.62.040	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESURA DE 2,2 MM, PARA TRAFEGO INTENSIVO, COM SUPERFÍCIE ABRIANTE ACILICO	10%	m²	153,83	176,82	223,27	34.187,88	-	-	0,00%	10.256,10	23.916,80
16.2	21.16.031	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESURA DE 1 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVATURA 90º, COM SUPERFÍCIE ABRIANTE ACILICO	10%	m	143,15	27,26	34,47	4.454,38	-	-	0,00%	1.400,31	3.454,07
16.3	21.18.100	PERFIL PARA ANTEDEBRANTE FOSFORESCENTE, ALTO TRAFEGO, LARGURA 5 CM	6%	m	34,50	18,15	23,83	625,59	-	-	0,00%	-	625,58
												R\$	28.196,54
<b>17 22 FORRO, BASE E FACHADA</b>													
17.1	22.62.029	FORRO EM PAINEL DE GESSO ALANTIGUADO, ESPESURA DE 12,5 MM, PISO	0%	m²	716,90	86,34	89,17	61.379,89	-	-	0,00%	-	61.870,06
												R\$	61.870,06
<b>18 23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA</b>													
18.1	23.64.389	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATEANTE METÁLICO - 80 X 190 CM	17%	un	8,90	1.236,18	1.343,21	9.271,38	2,00	3.080,46	33,33%	6.180,92	3.090,46
18.2	23.64.389	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATEANTE METÁLICO - 60 X 210 CM	37%	un	8,90	1.296,70	1.733,41	10.489,40	2,00	3.466,83	33,33%	6.933,64	3.466,82
18.3	23.64.319	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATEANTE METÁLICO - 90 X 210 CM	52%	un	8,90	1.389,27	1.742,71	39.745,07	5,00	8.748,55	29,41%	17.497,10	12.247,97
18.4	23.89.030	PAINELADOR DE PROTEÇÃO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	50%	m	30,05	133,79	137,23	5.816,88	6,00	1.837,84	26,67%	3.010,14	2.006,76
18.5	23.89.049	ARMÁRIO GABRIETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM PARTES EMBATELADAS	69%	m²	0,95	133,78	139,29	105,58	0,24	40,14	26,67%	90,30	60,28
18.6	23.89.242	PORTALBA DE CABINE SUSPensa EM MADEIRA COM BATEANTE	50%	m²	3,78	360,58	406,22	1.645,50	1,27	619,10	39,55%	1.107,85	758,28
18.7	23.89.350	PORTALBA COM BATEANTE METÁLICO - 80 X 210 CM	75%	un	4,05	742,83	426,50	2.714,58	2,00	1.857,00	50,00%	2.785,50	925,50
18.8	23.89.350	PORTALBA COM BATEANTE METÁLICO - 90 X 210 CM	47%	un	6,20	773,94	857,10	5.401,83	2,00	1.984,60	33,33%	3.869,20	1.984,60
18.9	23.89.350	PORTALBA COM BATEANTE METÁLICO - 150 X 210 CM	23%	un	12,00	1.878,98	1.274,95	15.242,40	3,00	3.824,85	25,00%	6.924,65	6.374,75
18.10	23.89.120	BATEANTE DE MADEIRA PARA PORTA	23%	un	18,35	44,23	23,30	813,54	5,00	276,80	29,59%	553,60	381,98
18.11	23.89.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	10%	m	18,20	8,82	8,82	143,88	5,14	43,79	30,42%	86,39	57,59
												R\$	31.287,85
<b>19 24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO</b>													
19.1	24.03.040	GUARDA-CORRER TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 110 X 110 CM, CAPACIDADE DE 20 KG DE FERRO COM PORTA CILÍNDRICA	100%	m	36,75	707,92	864,52	26.114,47	-	-	0,00%	26.314,47	-
19.2	24.03.100	GUARDA-CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBI (BRANCO, SOB MEDIDA)	0%	m²	1,09	1.375,18	1.344,85	1.344,85	-	-	0,00%	-	1.344,85
												R\$	1.344,85
<b>20 25 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO</b>													
20.1	25.01.050	CAIBHO EM ALUMÍNIO 180X180 COM VIDRO, LIFHA COMERCIAL	50%	m²	41,19	688,45	831,04	34.258,76	11,55	9.621,84	28,10%	17.119,38	17.119,38
20.2	25.01.030	LAMBHO EM ALUMÍNIO 180X180 SOB MEDIDA	50%	m²	29,55	761,82	862,80	26.819,48	8,23	7.261,85	-27,85%	13.044,85	13.044,84
20.3	25.01.030	CAIBHO EM ALUMÍNIO TIPO BARRACÃO COM VIDRO, LIFHA COMERCIAL	50%	m²	4,19	548,15	882,43	3.814,28	1,05	720,75	25,61%	1.407,18	1.407,18
20.4	25.02.035	PORTA DE ENTRADA DE ARRIO EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	50%	m²	18,11	870,40	1.568,00	28.721,65	5,56	6.043,84	20,07%	10.395,84	10.395,84
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBI (BRANCO, SOB MEDIDA)	50%	m²	18,95	586,26	745,26	12.939,18	4,40	3.283,28	26,19%	6.268,08	6.268,08
												R\$	48.235,52
<b>21 26 ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>													
21.1	25.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLOREDO DE 6 MM	6%	m²	1,50	450,84	523,05	792,87	-	-	0,00%	-	789,97
21.2	25.04.032	ESPELHO LARGO DE 3 MM COM MOLDE EM ALUMÍNIO	6%	m²	3,05	526,42	591,33	1.605,46	-	-	0,00%	-	1.985,49
												R\$	2.774,56
<b>22 27 ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>													
22.1	27.04.030	BATE-AMACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 205 MM	6%	m	128,90	124,92	139,92	18.658,52	-	-	0,00%	-	19.658,52
												R\$	19.658,52
<b>23 28 FERROGÊNEO COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>													
23.1	28.81.171	MOLETA PARA PORTA, COM ESFORÇO A CIMA DE 80 KG ATÉ 65 KG	0%	un	4,90	243,27	857,83	1.231,32	-	-	0,00%	-	1.231,32
												R\$	1.231,32
<b>24 26 ACESSIBILIDADE</b>													
24.1	30.61.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	0%	m	7,95	146,33	182,05	1.201,42	-	-	0,00%	-	1.306,63
24.2	30.61.029	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 830 MM	0%	un	7,95	85,99	119,87	813,80	-	-	0,00%	-	839,09
24.3	30.61.039	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 830 MM	0%	un	14,90	125,30	137,37	1.203,19	-	-	0,00%	-	2.203,18
24.4	30.61.053	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 830 X 690 MM	0%	un	7,95	283,51	333,13	2.471,01	-	-	0,00%	-	2.471,91
24.5	30.84.029	REVESTIMENTO EM BARRAÇA SINTÉTICA, COLOREDO DE 3 MM, PARA BRILHAÇÃO TÁTIL DE SÉRIE COMERCIAL - CILÍNDRICO	0%	m²	11,95	156,88	199,78	2.170,20	-	-	0,00%	-	2.170,20
24.6	30.84.030	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 43 CM	0%	m	14,00	388,47	485,93	6.915,02	-	-	0,00%	-	6.915,02
24.7	30.86.109	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGAS DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,55	176,78	213,47	426,94	-	-	0,00%	-	426,94
24.8	30.88.019	ASBESTO MISTURADO PARA BANHO EM ALUMÍNIO COM PINTURA E PISO DE 790 X 455 MM	0%	un	3,05	759,34	839,81	4.749,55	-	-	0,00%	-	4.789,55
24.9	30.88.049	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	0%	un	3,05	1.192,55	1.495,53	7.453,40	-	-	0,00%	-	7.453,40
24.10	30.88.069	BACK BORDADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 8 LITROS	0%	un	3,05	848,78	1.099,97	5.304,85	-	-	0,00%	-	5.304,85
												R\$	33.781,21
<b>25 32 IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA</b>													
25.1	32.15.049	IMPERMEABILIZAÇÃO EM JUNTA SIFONÁTICA COM MEMBRANA TP 034B, ESPESURA DE 4 MM	100%	m²	113,55	53,94	79,55	6.615,01	113,80	9.013,02	100,00%	9.013,02	0,00
25.2	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	118,95	13,79	17,23	2.012,46	-	-	0,00%	2.012,46	0,00
												R\$	0,81
<b>26 33 PINTURA</b>													
26.1	33.02.030	MASSA CURRUCALADA DE PEDRA ACRILICA	0%	m³	1.682,87	11,89	14,57	21.315,47	-	-	0,00%	-	21.315,47
26.2	33.16.030	TINTA ACRÍLICA ANTI QD E EM MASSA, INCLUIRE PREPARO	0%	m³	1.889,72	21,42	27,33	54.458,63	-	-	0,00%	-	54.458,63
26.3	33.16.030	EPÓXI EM MASSA, INCLUIRE PREPARO	0%	m³	279,23	68,21	109,28	27.842,69	-	-	0,00%	-	27.992,69

25A	21.1.2.11	ESMALTE A BASE DE AÇÚCAR MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	84,52	37,43	49,51	2.024,21	-	0,00%	-	2.024,21
<b>108.390,40</b>												
27	34	<b>PAISAGISMO E FORTIFICACAO</b>										
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORNAMENTAL COMUM	0%	m³	4,55	149,23	197,03	605,88	-	0,00%	-	850,88
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULACAO DE AREAS PARA PAISAGISMO	0%	m²	42,23	1,31	1,53	96,89	-	0,00%	-	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE ORNAMENTAIS EM PLACAS (ARREDE E CANTIDADE)	0%	m²	66,70	19,88	13,50	434,22	-	0,00%	-	934,52
27.4	34.02.020	ARBUSTO AZAL+HH= 6,0x0,5x0,5 M	0%	un	37,00	40,13	39,13	1.354,22	-	0,00%	-	1.354,22
27.5	34.02.120	ARBUSTO MURETA+HH= 0,50 M	0%	un	10,95	26,33	18,81	551,65	-	0,00%	-	555,65
27.6	34.02.130	ARBUSTO ALAMANDA+HH= 0,5x0,5x0,5 M	0%	un	2,00	29,93	27,43	24,86	-	0,00%	-	74,85
27.7	34.04.100	ARVORE ORNAMENTAL TIPO BIANDELHO+HH= 2,50 M	0%	un	2,00	60,11	111,38	327,74	-	0,00%	-	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CIRCULO+HH= 0,50x0,50 M	0%	un	13,92	41,88	32,35	693,55	-	0,00%	-	690,55
27.9	34.05.200	PLANTIO DE ARBRE EM GRADIL DE AÇO GALVANIZADO E PROFUNDA FALHA 65 X 132 MM, E PLANTIO ELETROSTATICA	0%	m²	12,95	1.274,24	2.217,46	28.913,90	-	0,00%	-	26.613,60
<b>31.330,92</b>												
28	37	<b>QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>										
28.1	37.01.100	QUADRO TELEBAS DE EMBITR DE 600 X 900 X 120 MM	100%	un	1,00	100,24	9,25,36	925,30	-	0,00%	-	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIPOLAR DE EMBITR PARA QUAJTOR 500V 1/4 BOLT-ON 2,5 A SEM CILINDROS	100%	un	4,90	1.011,94	1.293,92	5.055,88	-	0,00%	-	5.055,88
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE CUBRE 303	100%	kg	10,20	82,89	117,25	1.172,50	10,00	1.172,50	100,00%	1.172,50
28.4	37.13.030	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A	100%	un	24,00	95,87	116,63	2.875,92	24,00	2.875,92	100,00%	2.875,92
28.5	37.13.040	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 20 A ATE 100 A	100%	un	8,00	126,47	161,64	1.344,64	8,00	1.284,64	100,00%	1.284,64
28.6	37.13.050	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 30 A	0%	un	24,00	129,52	161,90	3.855,88	-	0,00%	-	3.855,60
28.7	37.13.060	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 20 A ATE 100 A	0%	un	8,00	148,28	182,25	1.112,10	-	0,00%	-	1.112,10
28.8	37.14.400	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA TRIPOLAR, ALIAMENTO OBTATIVO, LUM.FLUORESCADUR E PORTA-PLACAS ATE N=3400 A - SEM FUGIDIVEIS	100%	un	2,00	3.647,94	4.359,90	8.719,84	2,00	8.719,84	100,00%	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 45 A X 40 MA - 3 POLOS	100%	un	30,00	161,57	227,69	4.541,60	30,00	4.541,60	100,00%	4.541,60
28.10	37.24.040	DISPOSITIVO DE PROTECCAO CONTRA SURTO TIPO I, ROL. SUPORTABILIDADE 6x4 KV, UN. ATE 240V/12V, BIPOLAR, CURVA DE DENSIDADE 150/50/5 - CLASSE I	100%	un	4,00	569,04	709,95	2.800,20	4,00	2.800,20	100,00%	2.800,20
<b>32.083,30</b>												
<b>21.404,70</b>												
<b>R\$ 4.997,70</b>												
29	38	<b>TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>										
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	100%	m	680,53	12,94	13,87	15.150,60	490,00	7.578,30	50,00%	15.336,60
29.2	38.18.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	100%	m	180,59	14,27	17,93	3.200,40	84,00	1.497,72	46,67%	3.209,60
<b>18.660,06</b>												
<b>R\$ 9.176,02</b>												
30	39	<b>CONDUTOR E ENFASCAMENTO ELÉTRICO E TELEFONIA</b>										
30.1	39.02.010	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO PVC V-ROLO, ACO EM PVC 70°C	34%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00	1.442,21	5.927,47	34,24%	5.837,47
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO PVC V-ROLO, ACO EM PVC 70°C	3%	m	600,00	5,35	3,21	4.194,50	34,89	220,16	5,22%	220,16
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO PVC V-ROLO, ACO EM PVC 70°C	33%	m	330,00	7,48	9,22	3.227,00	324,75	2.889,59	92,64%	2.889,59
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO PVC V-ROLO, ACO EM PVC 70°C	0%	m	200,00	11,19	13,85	2.798,00	-	0,00%	-	2.798,00
30.5	39.04.010	CABO DE COBRE NU, TEMPERA MULE, CLASSE 2, DE 15 MM²	0%	m	18,00	29,33	25,46	354,90	-	0,00%	-	354,90
30.6	39.11.020	FIO TELEFONICO TIPO FTM PARALISACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	0%	m	408,95	3,57	3,60	1.522,80	-	0,00%	-	1.522,80
30.7	39.21.010	CABO DE COBRE FLE. DE 15 MM², ISOL. 8 3R/IV+ROLO, ACO EM PVC 80°C	11%	m	240,00	14,57	17,08	4.214,26	27,07	475,89	11,29%	475,89
30.8	39.21.020	CABO DE COBRE FLE. DE 25 MM², ISOL. 8 3R/IV+ROLO, ACO EM PVC 80°C	12%	m	150,00	30,25	33,25	3.797,50	108,28	2.794,07	72,19%	2.794,07
30.9	39.21.030	CABO DE COBRE FLE. DE 35 MM², ISOL. 8 3R/IV+ROLO, ACO EM PVC 80°C	15%	m	120,00	39,84	37,16	4.872,80	17,89	663,72	14,91%	663,72
30.10	39.21.040	CABO DE COBRE FLE. DE 50 MM², ISOL. 8 3R/IV+ROLO, ACO EM PVC 80°C	0%	m	180,00	42,41	30,53	8.034,40	-	0,00%	-	8.034,40
<b>50.894,86</b>												
<b>13.010,90</b>												
<b>R\$ 37.873,60</b>												
31	40	<b>DISTRIBUICAO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>										
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CHAPA, COM TAMPA PARA 4, 6X240X150 MM	07%	un	9,95	135,71	138,05	1.017,80	2,00	336,30	33,33%	678,60
31.2	40.04.010	TOMADA PARA TELEFONE AP. PADRAO TELEBAS COM PLACA	07%	un	8,95	22,00	24,05	184,50	2,00	56,50	33,33%	113,00
31.3	40.04.020	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	10%	un	89,00	18,99	22,87	2.054,30	-	0,00%	-	1.029,15
31.4	40.04.030	TOMADA 3P+T DE 16 A - 250 V, COMPLETA	36%	un	29,92	21,39	25,99	349,60	-	0,00%	-	269,60
31.5	40.04.040	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	un	6,95	26,12	32,15	219,90	-	0,00%	-	70,30
31.6	40.05.200	INTERRUPTOR COM 1 TELA SIMPLES E PLACA	31%	un	49,00	17,44	22,42	1.043,58	8,00	201,78	18,37%	560,50
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TELAS SIMPLES E PLACA	10%	un	4,00	35,43	31,81	437,24	-	0,00%	-	63,62
31.8	40.18.100	CONDICIONADOR DE POTENCIA 38 48 A - 2N+2F	10%	un	2,95	645,33	897,91	1.815,92	-	0,00%	-	807,91
<b>6.937,84</b>												
<b>597,58</b>												
<b>R\$ 3.244,96</b>												
32	41	<b>LUMINACAO</b>										
32.1	41.10.010	GRUZA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE LAMINAS LUMINARIAS	0%	un	3,00	495,79	397,23	1.521,60	-	0,00%	-	1.521,60
32.2	41.10.020	POSTE TELEFONICO PTO EM AÇO 80X 1010X20 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 3,92 M	0%	un	3,00	1.288,31	1.511,36	4.814,88	-	0,00%	-	4.814,88
32.3	41.11.700	LUMINARIA LED RETANGULAR PARA POTE, FLUXO LUMINOSO DE 34136 A 17475 LM, EFICIENCIA MINIMA DE 115 LM/W - POTENCIA DE 95 W/120 W	0%	un	8,00	1.692,71	1.355,89	10.927,84	-	0,00%	-	10.927,84
32.4	41.21.040	LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREGRO COM DISSIPADOR TRANSL. 4500 K, FLUXO LUMINOSO DE 3386 A 4468 LM, POTENCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	10,00	275,08	342,35	2.734,80	-	0,00%	-	2.734,80
32.5	41.21.050	LUMINARIA LED REDONDA DE EMBITR COM DISSIPADOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 305 A 1029 LM, POTENCIA DE 6 W A 12 W	0%	un	88,00	128,42	180,52	10.315,36	-	0,00%	-	10.315,36
32.6	41.21.060	LUMINARIA LED REDONDA DE SOBREGRO COM DISSIPADOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1400 A 2568 LM, POTENCIA DE 13 W A 19 W	0%	un	69,00	214,07	237,56	16.011,60	-	0,00%	-	16.011,60
<b>52.108,79</b>												
<b>R\$ 52.108,79</b>												
33	42	<b>APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS</b>										
33.1	42.02.040	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5500W / 220V COM REGULACAO DE TEMPERATURA	0%	un	9,95	26,96	433,12	3.285,60	-	0,00%	-	3.285,60
33.2	42.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,90	182,07	227,29	455,16	-	0,00%	-	455,16
33.3	42.05.010	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 180 M³/H	0%	un	1,95	350,11	444,96	444,96	-	0,00%	-	444,96
33.4	42.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE, COM CAPACIDADE DE 15.000 BTU/H	17%	un	3,90	1.350,05	7.980,81	23.024,63	-	0,00%	-	15.367,62
33.5	42.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H	100%	un	1,90	10.424,44	12.076,16	43.078,16	1,00	13.078,10	100,00%	13.078,10
33.6	42.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE, COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	32%	un	12,00	2.718,73	2.398,41	40.790,92	3,00	16.992,05	41,67%	37.382,51
<b>83.126,17</b>												
<b>30.070,15</b>												
<b>R\$ 14.266,94</b>												
34	44	<b>APARELHOS E MATERIAIS HIDRÁULICOS</b>										
34.1	44.01.030	BACIA SEMI-MADEIRA DE LOUCA SEM TAMPA - 6 LITROS	0%	un	9,00	219,62	274,77	1.871,85	-	0,00%	-	1.871,85
34.2	44.01.110	ELEVATOR DE LOUCA COM COLUNA	0%	un	8,90	218,41	275,51	2.148,08	-	0,00%	-	2.148,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUCA DE EMBITR OVAL	0%	un	9,90	90,21	128,63	747,78	-	0,00%	-	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUCA COM COLUNA DE 30 LITROS	0%	un	3,90	498,09	737,79	2.274,75	-	0,00%	-	2.274,75
34.5	44.02.020	TAMPONADA EM BRANCO, COM FRONTAL E BARRAS DE 2 CM, ACABAMENTO PILEDO	0%	m²	13,82	590,74	736,42	10.278,90	-	0,00%	-	10.278,90
34.6	44.03.030	DEPENDER DE PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA BOLA DE 150 X 100 X 100 MM	0%	un	10,90	98,21	67,34	873,96	-	0,00%	-	873,96
34.7	44.03.100	DEPENDER TOALHEIRA EM ABS PARA PÓLHAS	0%	un	10,90	56,23	79,53	1.324,10	-	0,00%	-	1.324,10
34.8	44.03.400	TORNEIRA CURTA SEM BACA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO CRUADO, DN 3/4"	0%	un	4,00	34,39	43,23	172,92	-	0,00%	-	172,92
34.9	44.03.500	TORNEIRA DE NEGA PARA PIA COM BICO VELOZ E ABREJOR EM LATAO FUNDIDO CRUADO	0%	un	8,90	158,62	199,77	1.149,02	-	0,00%	-	1.149,02
34.10	44.03.600	TORNEIRA DE NEGA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDRAULICO, EM LATAO CRUADO, DN 1/2" OU 3/8"	0%	un	13,90	116,44	144,17	1.674,21	-	0,00%	-	1.674,21
34.11	44.04.000	CUBA EM AÇO INOXÍVEL, SIMPLES DE 450X340X100MM	0%	un	9,90	301,94	252,10	1.512,60	-	0,00%	-	1.512,60
<b>23.884,07</b>												
<b>R\$ 33.594,07</b>												
35	46	<b>TUBULACAO E CONDUTORES PARA LÍQUIDOS E GASES</b>										
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RIGIDO SUDAMEL MARRON, DN= 25 MM, (M) INCLUSIVE CONEXOES	90%	m	190,00	3						

35.2	48.02.010	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LEMBA ESCOTADO SERIE NORMAL, DN= 49 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	30%	m	12,50	26,32	33,15	327,80	3,60	110,24	30,00%	318,24	79,56
35.4	48.02.050	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VÍBULA E ANEL DE BORRACHA LEMBA ESCOTADO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	30%	m	50,00	34,03	42,53	2.551,80	18,00	765,54	30,00%	2.941,44	510,36
35.5	48.02.200	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VÍBULA E ANEL DE BORRACHA LEMBA ESCOTADO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	30%	m	128,00	52,84	35,11	7.033,20	36,00	2.379,96	30,00%	6.345,56	1.596,64
35.6	48.02.054	TUBO G ALVIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	30%	m	9,00	10,85	111,65	999,28	4,80	533,09	30,00%	533,09	133,27
35.7	48.08.010	TUBO G ALVIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	30%	m	30,00	60,27	124,08	4.445,88	20,80	3.573,50	30,00%	3.573,50	893,38
35.8	48.92.270	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VÍBULA E ANEL DE BORRACHA LEMBA ESCOTADO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	30%	m	130,00	56,53	70,70	8.484,20	12,00	848,40	30,00%	6.787,20	1.696,80
													7.406,03
<b>36 47 VALVULAS E APARELHOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE PARA LÍQUIDOS E GASES</b>													
36.1	47.01.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATAÇ FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	165,95	133,50	534,20	-	-	0,00%	-	534,20
36.2	47.01.210	VALVULA DE ESPERA MONOBLOCO EM LATAÇ, PASSAGEM PLENA, ALINHAMENTO COM 1/2" VÍBULA, DN= 2"	0%	un	4,00	180,80	218,30	954,68	-	-	0,00%	-	954,68
36.3	47.01.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATAÇ FUNDIDO CROMADO COM 1/2" VÍBULA, DN= 3/4" - LEMBA ESPECÍAL	30%	un	16,00	60,12	198,19	1.902,56	-	-	0,00%	600,96	1.001,60
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATAÇ FUNDIDO CROMADO COM 1/2" VÍBULA, DN= 3/4" - LEMBA ESPECÍAL	0%	un	6,00	78,31	45,70	574,56	-	-	0,00%	-	574,56
													3.069,44
<b>37 38 RESERVATÓRIOS E TANQUES PARA LÍQUIDOS E GASES</b>													
37.1	48.62.200	RESERVATÓRIO EM POLIÉTERO COM TAMPA DE ENCAIXA - CAPACIDADE DE 5.025 LITROS	0%	un	3,00	2.483,27	3.115,52	9.044,56	-	-	0,00%	-	9.044,56
37.2	48.63.020	TÓRREDE BOLA DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,00	353,75	-	-	0,00%	-	353,75
													8.706,26
<b>38 48 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSÓRIOS HIDRÁULICO</b>													
38.1	48.61.030	CAIXA DE ENLAXE DE PVC RIGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	35%	un	28,00	82,51	133,16	2.662,16	-	-	0,00%	1.753,72	928,44
38.2	48.03.020	CAIXA DE DORÇURA EM ALUMÍNIO, 600 X 600 X 100 MM	30%	un	28,00	239,47	289,44	5.729,28	-	-	0,00%	5.156,28	572,92
38.3	48.03.030	CAIXA DE DORÇURA EM PVC COM TAMPA RETENÇÃO - CAPACIDADE 16L	0%	un	3,00	354,28	442,89	883,72	-	-	0,00%	-	883,72
38.4	48.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,04	19,17	191,70	-	-	0,00%	-	161,70
													9.469,78
<b>39 54 PAVIMENTAÇÃO E PASSOS</b>													
39.1	54.81.010	RESULTADO DE COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,35	1.647,35	-	-	0,00%	438,63	1.528,72
39.2	54.81.210	BASE DE BPA 100MM	7%	m²	76,35	124,78	219,43	16.744,48	-	-	0,00%	1.244,57	15.501,92
39.3	54.81.400	REBTURA DE CADA 15 CM INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO	0%	m²	511,00	16,43	24,18	12.533,98	-	-	0,00%	-	12.533,98
39.4	54.84.330	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTE DE CONC. 5 MPa, ESPESURA 8 CM, TIPO 08 RAQUETE, RETICULAR, BETUNADO E 14 FACES, COM RELEVO EM AREIA	0%	m²	511,00	63,33	104,37	53.333,37	-	-	0,00%	-	53.333,37
													84.422,89
<b>TOTAL</b>							<b>2.326.081,38</b>						<b>R\$ 80.719,69</b>
								<b>TOTAL GERAL 13ª MEDIÇÃO</b>					<b>247.019,26</b>
								<b>% MEDIO</b>					<b>10,62%</b>
								<b>ACUMULADO</b>					<b>1.459.350,30</b>
								<b>SALDO REMANESCENTE</b>					<b>R\$ 866.725,07</b>

Monteiro Lobato, 09 de janeiro de 2025.

Luiz Gustavo de Barros  
Responsável Técnico  
CREA 5062995430



# ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá - SP



# PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

DATA: 11/02/2025

RELATÓRIO Nº:  
13/2023

CONTRATO: 097/2023

CONFERIDO:  
Fiscal do contrato

AUTOR:  
Luís Gustavo de Barros - Eng. Civil

50 70 225050

CREA: SP-506269543

<p>DATA: 11/02/2025</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO</b></p>	<p align="right"><b>FOLHA: 2 / 6</b></p>
-----------------------------	--	--

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1: Requadro das janelas para instalação de peitoril e contramarco

<p><b>Autor:</b></p> <p align="center">   <b>Luís Gustavo de Barros</b>          CREA: 5062695430       </p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p>
---	---

DATA:  
11/02/2025

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 3 / 6

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO**

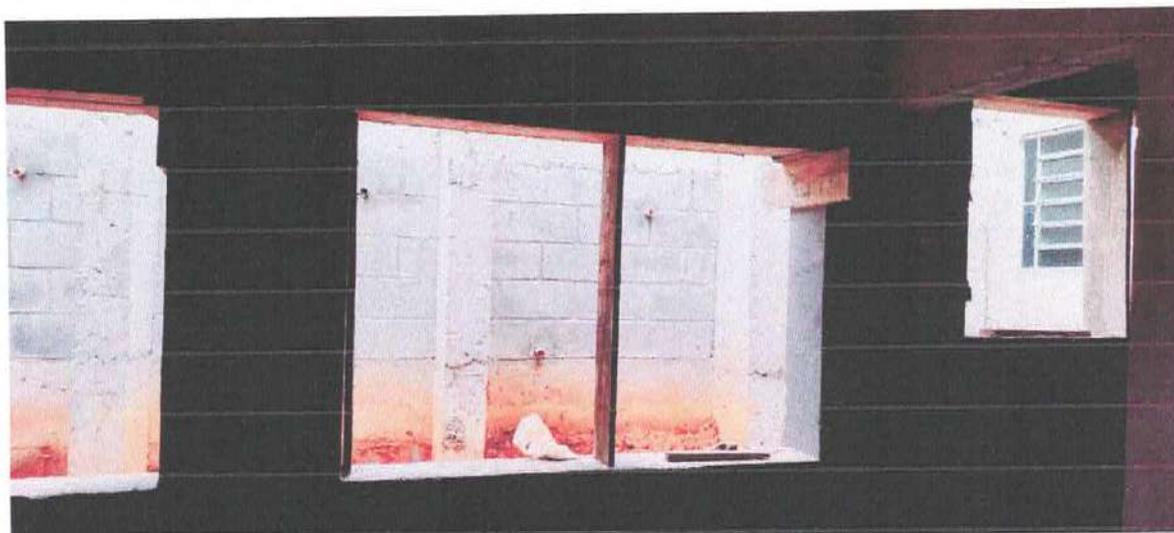


Foto 2: Requadro das janelas para instalação de peitoril e contramarco

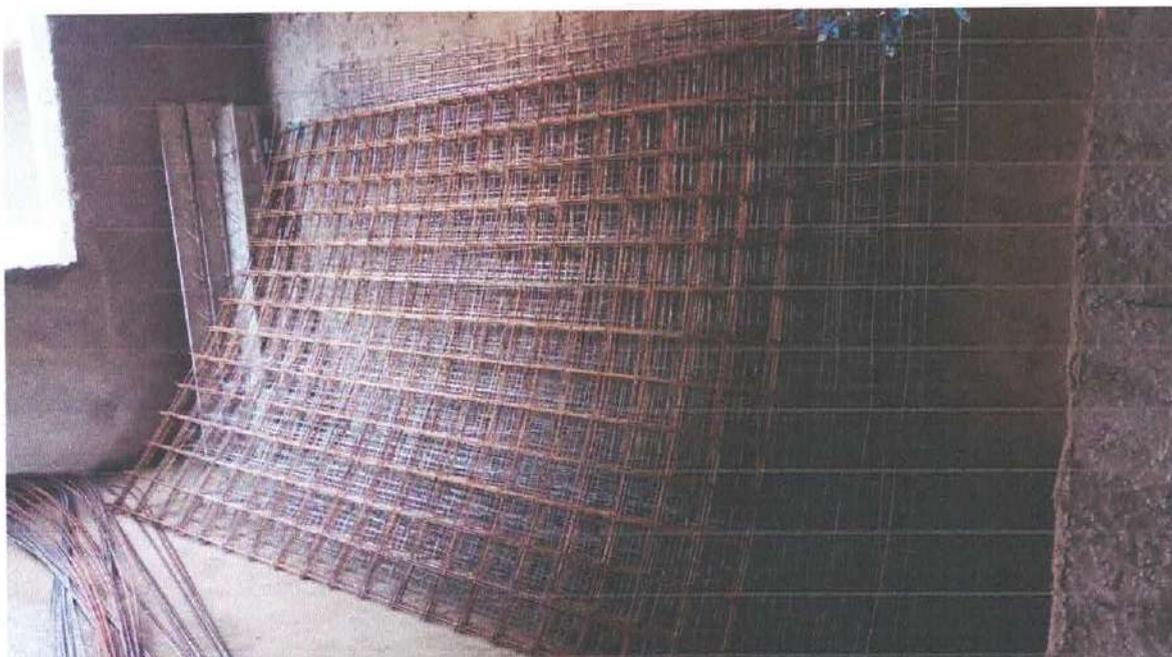


Foto 3: Malha pop para a laje do 2º Pavimento

**Autor:**

  
**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

**Conferido:**

FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUÇÃO DO NOVO REFETÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL

FOLHA: 4 / 6

DATA:  
11/02/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 13ª MEDIÇÃO



Foto 4 e 5: Assentamento do revestimento cerâmico no 1º Pavimento

Autor:

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

DATA: 11/02/2025	CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL  RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO	FOLHA: 5 / 6
---------------------	---	--------------



Foto 6: Assentamento de revestimento cerâmico e preparação das tomadas e interruptores

Autor:   Luís Gustavo de Barros CREA: 5062695430	Conferido:   FISCAL DO CONTRATO
---	---

DATA: 11/02/2025	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 13ª MEDIÇÃO</b>	<b>FOLHA: 6 / 6</b>
---------------------	---	---------------------



Foto 7: Ar condicionado de 12000BTU/H, 18000BTU/H e de 36000BTU/H

<b>Autor:</b>   <b>Luis Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  <b>FISCAL DO CONTRATO</b>
---	--



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.16  
6739306739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : TRANSF ESPECIAIS-3531704  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 7983-9 - GUARATINGUETA, AV JOAO PESSOA  
CONTA: 12.005-1

FAVORECIDO: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUT  
CPF/CNPJ: 14.563.488/0001-70  
VALOR: R\$ 234.668,39  
DEBITO EM: 14/02/2025

=====

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: F.D01.FFC.3BA.3FE.328

---

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:01  
673906739 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRANSF ESPECIAIS-3531704  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 4.068-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2025
NR. DOCUMENTO	556.739.000.358.973
VALOR TOTAL	12.350,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUN M LOBATO \*FUNDO  
AGENCIA: 6739-3 CONTA: 358.973-0  
NR. DOCUMENTO 556.739.000.004.068

=====

NR. AUTENTICACAO	6.724.12D.D91.1DC.590
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>597</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>30/04/2025 11:22:57</b>				
		Código de Verificação * <b>5F0W-8IE7</b>				
		Série <b>NE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>14.563.488/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>13554601</b> Nome/Razão Social: <b>ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS - EIRELI</b> Endereço: <b>RUA MILTON JOSÉ NUNES FERNANDES 2217 - **** - CHÁCARAS SANTA MARIA I - CEP: 12522450</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>fiscal@admequipamentos.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b> CPF/CNPJ: <b>46.643.482/0001-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Outros Praça Deputado A.S.Cunha Bueno 180 - - CENTRO - CEP: 12250000</b> Município: <b>MONTEIRO LOBATO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>turismo@monteirolobato.sp.gov.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>71120001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>07.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/04/2025, EM MONTEIRO LOBATO - SP</b>						
Nº LICITAÇÃO: 059/2023 CONTRATO Nº 230852/2023 Nº TOMADA DE PREÇO: 008/2023 OBJETO: Contratação de Empresa para execução da unidade de pronto atendimento no centro de saúde DR. JOÃO AURICCHIO 15ª Medição Período: 08/03/2025 a 10/04/2025 Valor: R\$ 90.102,32  Retenção de INSS (Inciso III do artigo 7º da IN RFB nº 2.021/2021), não se aplica à retenção previdenciária conforme previsto no artigo 114 inciso II. da IN RFB nº 2.110/2022.  341 - BANCO ITAÚ - AG: 7983 - C/C: 12005-1						
Valor do Serviço <b>R\$ 90.102,32</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 90.102,32</b>	Alíquota (%) <b>5,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>4.505,12</b>	
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90.102,32</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 85.597,20</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
<b>- Retenção no Município de MONTEIRO LOBATO - SP pelo Tomador: MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO</b>						

\*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA  
Engenheiro Civil - Crea: 5070225050  
Secretário de Obras



**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE OBRAS

**MEMORANDO SEC.OBRAS 25076/2025**

**A/C: Secretaria de Finanças**

**De: Secretaria de Obras**

**Ref.:** 15º Medição - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO.


Prezada;

A Secretaria Obras do município de Monteiro Lobato -SP, vem através deste, solicitar o pagamento da 15º Medição, Contratação De Empresa Para Execução Da Unidade De Pronto Atendimento No Centro De Saúde Dr. João Auricchio, do referido Processo Nº 230852/2023, Tomada de Preço Nº008/2023. No valor de **R\$90.102,32** referente a Nota Fiscal **nº597-E** e no valor de **R\$33.277,76** referente a Nota Fiscal **nº598-E**. Com o valor total da 15º Medição de **R\$123.380,08**.

Segue em anexo, Planilha Orçamentária da Medição, Relatório Fotográfico, Diário de Obras e demais documentos fiscais.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Monteiro Lobato, 5 de maio de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA  
Eng. Civil - CREA SP 5070225050  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI**

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217, Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP

PLANILHA DE MEDIÇÃO								
BDI = 25%			DATA BASE: CDHU 187 AGOSTO/2022 - DESONERADA					
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA LIPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
					S/ BDI	C/ BDI		
1	01	<b>SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO</b>						
1.1	01.02.071	PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E RECOMENDAÇÕES GERAIS, PARA EMPREENDIMENTOS COM ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 1.000 M²	100%	un	1,00	4.203,32	5.254,15	5.254,15
1.2	01.08.021	ELABORAÇÃO DE PROJ. DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE E. ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM BT E DEMANDA ATÉ 75 KVA	100%	un	1,00	5.368,58	6.710,72	6.710,72
1.3	01.17.031	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A1	100%	un	6,00	2.114,85	2.643,56	15.861,36
1.4	01.17.051	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1	100%	un	10,00	1.551,02	1.938,77	19.387,70
1.5	01.17.071	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1	100%	un	12,00	665,86	832,32	9.987,84
1.6	01.17.111	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1	100%	un	6,00	739,39	924,23	5.545,38
1.7	01.21.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM	100%	tx	1,00	942,15	1.177,68	1.177,68
1.8	01.21.110	SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M)	100%	m	90,00	75,15	93,93	8.453,70
								<b>72.378,53</b>
2	02	<b>INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>						
2.1	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	100%	un.mês	9,00	627,19	783,98	7.055,82
2.2	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	100%	un.mês	9,00	923,12	1.153,90	10.385,10
2.3	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	78%	un.mês	9,00	575,88	719,85	6.478,65
2.4	02.03.120	TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO	100%	m²	80,00	77,05	96,31	7.704,80
2.5	02.05.202	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	100%	m.mês	40,50	19,29	24,11	976,46
2.6	02.06.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	100%	m²	6,00	678,00	847,50	5.085,00
2.7	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ 1 KM	100%	m²	260,00	5,34	6,67	1.734,20
2.8	02.10.020	LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO	100%	m³	428,00	12,06	15,07	6.449,96
								<b>45.869,99</b>
3	06	<b>SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL</b>						
3.1	06.02.020	ESCAV. MANUAL EM SOLO DE 1º/2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	100%	m³	10,00	39,47	49,33	493,30
3.2	06.11.040	REATERRO MANUAL APOIADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	100%	m³	10,00	12,27	15,33	153,30
								<b>646,60</b>
4	08	<b>ESCORAMENTO, CONTENÇÃO E DRENAGEM</b>						
4.1	08.02.050	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³.mês	1.586,00	5,86	7,32	11.463,12
4.2	08.02.060	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	100%	m³	783,00	10,01	12,51	9.795,33
4.3	08.05.100	DRENO COM PEDRA BRITADA	100%	m³	16,20	102,53	128,16	2.076,19

15ª MEDIÇÃO - 10/04/2025				
QUANT. MEDIDA	VALOR MEDIDO	% MEDIDO	ACUMULADO MEDIDO	SALDO REMANESCENTE
	-	0,00%	5.254,15	-
	-	0,00%	6.710,72	-
	-	0,00%	15.861,36	-
	-	0,00%	19.387,70	-
	-	0,00%	9.987,84	-
	-	0,00%	5.545,38	-
	-	0,00%	1.177,68	-
	-	0,00%	8.453,70	-
	-			R\$ -
	-	0,00%	7.055,82	0,00
	-	0,00%	10.385,10	-
1,00	719,85	11,11%	5.038,95	1.439,70
	-	0,00%	7.704,80	-
	-	0,00%	976,46	-
	-	0,00%	5.085,00	-
	-	0,00%	1.734,20	-
	-	0,00%	6.449,96	-
	719,85			R\$ 1.439,70
	-	0,00%	493,30	0,00
	-	0,00%	153,30	-
	-			R\$ 0,00
	-	0,00%	11.463,12	0,00
	-	0,00%	9.795,33	-
	-	0,00%	2.076,19	0,00

4.4	08.05.180	MANTA GEOTÉXTEL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRANSVERSAL DE 9KN/M	100%	m²	81,00	12,93	16,16	1.308,96
4.5	08.06.040	BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM	100%	m	10,00	21,02	26,27	262,70
<b>24.906,30</b>								
<b>5</b>	<b>09</b>	<b>FORMA</b>						
5.1	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	100%	m²	480,74	141,41	176,76	84.975,60
<b>84.975,60</b>								
<b>6</b>	<b>10</b>	<b>ARMADURA E CORDALHA ESTRUTURAL</b>						
6.1	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	100%	kg	13.824,00	9,34	11,67	161.326,08
6.2	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	100%	kg	2.073,60	11,02	13,77	28.553,47
6.3	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	100%	kg	5.016,00	12,07	15,08	75.641,28
<b>265.520,83</b>								
<b>7</b>	<b>11</b>	<b>CONCRETO, MASSA E LASTRO</b>						
7.1	11.01.260	CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO	100%	m³	62,70	374,13	467,66	29.322,28
7.2	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	100%	m³	138,24	388,49	485,61	67.130,73
7.3	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMB.	100%	m³	200,94	80,77	100,96	20.286,90
7.4	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	100%	m³	39,19	125,27	156,58	8.136,37
<b>122.876,28</b>								
<b>8</b>	<b>12</b>	<b>FUNDAÇÃO PROFUNDA</b>						
8.1	12.05.010	TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA	100%	tx	1,00	1.515,51	1.894,38	1.894,38
8.2	12.05.030	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T	100%	m	450,00	54,03	67,53	30.388,50
<b>32.282,88</b>								
<b>9</b>	<b>13</b>	<b>LAJE E PAINEL DE FECHAMENTO PRÉ-FABRICADOS</b>						
9.1	13.01.170	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADALAJOTA CERÂMICA - LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	355,52	152,65	190,81	67.836,77
9.2	13.01.190	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELÇADALAJOTA CERÂMICA - LT 24 (20+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	100%	m²	476,21	167,30	209,12	99.585,04
<b>167.421,81</b>								
<b>10</b>	<b>14</b>	<b>ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR</b>						
10.1	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	800,50	66,27	82,83	66.305,41
10.2	14.11.231	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM - CL B	100%	m³	812,00	80,93	101,16	82.141,02
10.3	14.30.070	DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCL. FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA	50%	m²	21,42	465,87	607,33	13.009,00
10.4	14.30.310	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST	50%	m²	87,70	91,54	114,42	10.034,83
<b>171.480,96</b>								
<b>11</b>	<b>15</b>	<b>ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMÍNIO E CONCRETO</b>						
11.1	15.01.140	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 13,01 A 16,00 M	100%	m²	355,52	103,81	129,76	46.132,27
<b>46.132,27</b>								
<b>12</b>	<b>16</b>	<b>TELHAMENTO</b>						
12.1	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 NM	100%	m²	460,00	46,86	58,57	26.942,20
12.2	16.30.020	DÔMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	0%	m²	17,50	587,08	733,85	12.842,37
12.3	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	0%	m²	36,90	243,57	304,46	11.234,57
12.4	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	100%	m	112,22	109,73	137,16	15.392,09

-	0,00%	1.308,96	-
-	0,00%	262,70	-
-		-R\$	0,00
-	0,00%	84.975,60	0,00
-		R\$	0,00
-	0,00%	161.326,08	-
-	0,00%	28.553,47	-
-	0,00%	75.641,28	-
-		R\$	-
-	0,00%	29.322,28	-
-	0,00%	67.130,73	-
-	0,00%	20.286,90	-
-	0,00%	6.136,37	-
-		R\$	-
-	0,00%	1.894,38	-
-	0,00%	30.388,50	-
-		R\$	-
-	0,00%	67.836,77	-
-	0,00%	99.585,04	-
-		R\$	-
-	0,00%	66.305,42	-
-	0,00%	82.141,92	-
-	0,00%	6.504,50	5.504,50
-	0,00%	5.017,32	5.017,31
-		R\$	11.521,81
-	0,00%	46.132,27	-
-		R\$	-
460,00	26.942,20	100,00%	26.942,20
-	0,00%	-	12.842,37
-	0,00%	-	11.234,57
112,22	15.392,10	100,00%	15.392,10
-	-	-	0,01

*M*

66.411,23								42.334,30				R\$ 24.076,93				
<b>13</b>	<b>17</b>	<b>REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL</b>														
13.1	17.01.010	ARGAMASSA DE PROTEÇÃO COM ARGILA EXPANDIDA	0%	m²	2,50	943,04	1.178,80	2.947,00								
13.2	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	100%	m²	18,40	508,35	635,43	11.691,91								
13.3	17.02.020	CHAPISCO	100%	m²	3.225,00	4,90	8,12	19.737,00								
13.4	17.02.120	EMBOÇO COMUM	100%	m²	3.225,00	15,52	19,40	62.565,00								
13.5	17.02.220	REBOCO	100%	m²	2.288,62	8,76	10,95	25.060,38								
								<b>122.001,29</b>								
<b>14</b>	<b>18</b>	<b>REVESTIMENTO CERAMICO</b>														
14.1	18.08.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	90%	m²	537,86	117,77	147,21	79.178,37								
14.2	18.08.182	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA RÚSTICA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BLLB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE	70%	m	300,06	4,63	5,78	1.734,34								
14.3	18.07.020	PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA DE 9MM, USO NÃO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIAL	90%	m²	74,20	143,31	179,13	13.291,44								
14.4	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	90%	m²	936,38	55,06	68,82	64.441,67								
								<b>168.645,82</b>								
<b>15</b>	<b>19</b>	<b>REVESTIMENTO EM PEDRA</b>														
15.1	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	90%	m	146,10	118,12	147,65	21.571,86								
								<b>21.571,66</b>								
<b>16</b>	<b>21</b>	<b>REVESTIMENTO SINTÉTICO E METÁLICO</b>														
16.1	21.02.060	REVESTIMENTO VINÍLICO, ESPESSURA DE 3,2 MM, PARA TRÁFEGO INTENSO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m²	153,03	178,62	223,27	34.167,00								
16.2	21.10.081	RODAPÉ PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO	30%	m	143,15	27,58	34,47	4.934,38								
16.3	21.20.302	FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE FOSFORECENTE, ALTO TRÁFEGO, LARGURA DE 5CM	0%	m	34,50	19,15	23,93	825,58								
								<b>39.926,96</b>								
<b>17</b>	<b>22</b>	<b>FORRO, BRISE E FACHADA</b>														
17.1	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	10%	m²	718,00	68,94	86,17	61.870,06								
								<b>61.870,06</b>								
<b>18</b>	<b>23</b>	<b>ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA</b>														
18.1	23.04.580	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 160 CM	83%	un	6,00	1.236,19	1.545,23	9.271,38								
18.2	23.04.600	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	83%	un	6,00	1.386,73	1.733,41	10.400,46								
18.3	23.04.610	PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 90 X 210 CM	71%	un	17,00	1.399,77	1.749,71	29.745,07								
18.4	23.08.030	FAIXA/BATEDOR DE PROTEÇÃO EM MADEIRA DE 20 X 5 CM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO	70%	m	30,00	133,79	167,23	5.016,90								
18.5	23.08.040	ARMÁRIO/ GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS	60%	m²	0,90	133,79	167,23	150,50								
18.6	23.08.242	PORTA LISA DE CORRER SUSPensa EM MADEIRA COM BATENTE	60%	m²	3,78	390,60	488,25	1.845,58								
18.7	23.09.550	PORTA LISA COM BATENTE METÁLICO - 80 X 210 CM	75%	un	4,00	742,80	928,50	3.714,00								
								<b>107,57</b>								
								<b>15.835,67</b>								
								<b>20,00%</b>								
								<b>71.260,24</b>								
								<b>7.918,13</b>								
								<b>60,01</b>								
								<b>346,87</b>								
								<b>20,00%</b>								
								<b>1.214,04</b>								
								<b>520,30</b>								
								<b>14,84</b>								
								<b>2.658,29</b>								
								<b>20,00%</b>								
								<b>11.962,30</b>								
								<b>1.329,14</b>								
								<b>187,28</b>								
								<b>12.888,33</b>								
								<b>20,00%</b>								
								<b>58.038,38</b>								
								<b>6.403,29</b>								
								<b>31.729,17</b>								
								<b>R\$ 16.170,85</b>								
								<b>8,77</b>								
								<b>1.294,30</b>								
								<b>6,00%</b>								
								<b>19.462,63</b>								
								<b>2.109,03</b>								
								<b>1.294,30</b>								
								<b>R\$ 2.109,03</b>								
								<b>-</b>								
								<b>0,00%</b>								
								<b>10.250,10</b>								
								<b>23.916,90</b>								
								<b>-</b>								
								<b>0,00%</b>								
								<b>1.480,31</b>								
								<b>3.454,07</b>								
								<b>-</b>								
								<b>0,00%</b>								
								<b>-</b>								
								<b>825,58</b>								
								<b>R\$ 28.196,54</b>								
								<b>-</b>								
								<b>0,00%</b>								
								<b>6.204,24</b>								
								<b>55.665,82</b>								
								<b>R\$ 55.665,82</b>								
								<b>1,00</b>								
								<b>1.545,23</b>								
								<b>16,67%</b>								
								<b>7.726,15</b>								
								<b>1.545,23</b>								
								<b>1,00</b>								
								<b>1.733,41</b>								
								<b>16,67%</b>								
								<b>8.667,05</b>								
								<b>1.733,41</b>								
								<b>2,00</b>								
								<b>3.499,42</b>								
								<b>11,76%</b>								
								<b>20.996,52</b>								
								<b>8.748,55</b>								
								<b>3,00</b>								
								<b>501,69</b>								
								<b>10,00%</b>								
								<b>3.511,83</b>								
								<b>1.505,07</b>								
								<b>-</b>								
								<b>0,00%</b>								
								<b>90,30</b>								
								<b>60,20</b>								
								<b>-</b>								
								<b>0,00%</b>								
								<b>1.107,35</b>								
								<b>738,23</b>								
								<b>-</b>								
								<b>0,00%</b>								
								<b>2.785,50</b>								
								<b>928,50</b>								

18.8	23.09.580	PORTA LISA COM BATEMETALICO - 90 X 210 CM	83%	un	6,00	773,84	967,30	5.803,80					
18.9	23.09.590	PORTA LISA COM BATEMETALICO -160 X 210 CM	75%	un	12,00	1.019,96	1.274,95	15.299,40					
18.10	23.20.100	BATEMTE DE MADEIRA PARA PORTA	71%	un	16,90	44,29	55,36	935,58					
18.11	23.20.120	GUARNIÇÃO DE MADEIRA	72%	m	16,90	6,92	8,52	143,98					
									82.326,65				
19	24	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO</b>											
19.1	24.03.040	GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"	100%	m	29,75	707,62	884,52	26.314,47					
19.2	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0%	m²	1,00	1.075,16	1.343,95	1.343,95					
									27.658,42				
20	25	<b>ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO</b>											
20.1	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	29%	m²	41,10	686,45	833,06	34.238,78					
20.2	25.01.060	CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA	78%	m²	29,55	706,32	882,90	26.089,69					
20.3	25.01.090	CAIXILHO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	75%	m²	4,10	549,15	686,43	2.814,38					
20.4	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMINIO, SOB MEDIDA	80%	m²	19,11	870,40	1.088,00	20.791,68					
20.5	25.02.042	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA	80%	m²	18,80	596,96	746,20	12.536,16					
									96.470,65				
21	26	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM VIDRO</b>											
21.1	26.01.142	VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM	0%	m²	1,50	420,84	526,05	789,07					
21.2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMINIO	0%	m²	3,00	529,47	661,83	1.985,49					
									2.774,56				
22	27	<b>ESQUADRIA E ELEMENTO EM MATERIAL ESPECIAL</b>											
22.1	27.04.070	BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM	0%	m	126,00	124,82	156,02	19.658,52					
									19.658,52				
23	28	<b>FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS</b>											
23.1	26.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESPORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	0%	un	4,00	246,27	307,83	1.231,32					
									1.231,32				
24	30	<b>ACESSIBILIDADE</b>											
24.1	30.01.010	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2"	86%	m	7,00	149,33	186,66	1.306,62					
24.2	30.01.020	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM	86%	un	7,00	95,90	119,87	839,09					
24.3	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM	79%	un	14,00	125,90	157,37	2.203,18					
24.4	30.01.050	BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM	86%	un	7,00	282,51	353,13	2.471,91					
24.5	30.04.020	REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO	67%	m²	11,50	150,96	188,70	2.170,05					
24.6	30.04.080	REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM	64%	m	14,00	389,47	486,83	6.815,62					
24.7	30.06.100	SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO	0%	un	2,00	170,78	213,47	426,94					
24.8	30.08.030	ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA EPÓXI DE 700 X 450 MM	80%	un	5,00	766,33	957,91	4.789,55					
24.9	30.08.040	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	80%	un	5,00	1.192,55	1.490,68	7.453,40					
24.10	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 8 LITROS	80%	un	5,00	848,78	1.060,97	5.304,85					
									33.781,21				
25	32	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E JUNTA</b>											
									1,00	967,30	16,67%	4.836,50	967,30
									2,00	2.549,90	16,67%	11.474,55	3.824,85
									2,00	110,72	11,83%	664,32	271,26
									2,00	17,04	11,83%	103,43	40,55
										10.924,71			R\$ 20.363,14
										-	0,00%	26.314,47	-
										-	0,00%	-	1.343,95
										-			R\$ 1.343,95
										-	0,00%	9.852,08	24.386,68
										-	0,00%	20.306,70	5.782,99
									1,03	703,59	25,00%	2.110,77	703,59
									3,82	4.158,34	20,00%	16.637,70	4.153,98
									3,36	2.507,23	20,00%	10.028,93	2.507,23
										7.369,16			R\$ 37.534,47
										-	0,00%	-	789,07
										-	0,00%	-	1.985,49
										-			R\$ 2.774,56
										-	0,00%	-	19.658,52
										-			R\$ 19.658,52
										-	0,00%	-	1.231,32
										-			R\$ 1.231,32
									2,00	373,32	28,57%	1.119,96	186,66
									2,00	239,74	28,57%	719,22	119,87
									4,00	629,48	28,57%	1.731,07	472,11
									2,00	706,26	28,57%	2.118,78	353,13
									2,00	377,40	17,39%	1.462,43	707,63
									2,00	973,66	14,29%	4.381,47	2.434,15
										-	0,00%	-	426,94
									1,00	957,91	20,00%	3.831,64	957,91
									1,00	1.490,68	20,00%	5.962,72	1.490,68
									1,00	1.060,97	20,00%	4.243,88	1.060,97
										6.809,42			R\$ 8.210,05

RP

25.1	32.15.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO II-B, ESPESSURA DE 4 MM	100%	m²	113,30	63,64	79,55	9.013,01
25.2	32.15.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	100%	m²	116,80	13,79	17,23	2.012,46
								11.025,47
<b>26</b>	<b>33</b>	<b>PINTURA</b>						
26.1	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	0%	m²	1.462,97	11,66	14,57	21.315,47
26.2	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	1.989,72	21,90	27,37	54.458,63
26.3	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	279,20	80,21	100,26	27.992,09
26.4	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	0%	m²	64,62	32,49	40,61	2.624,21
								106.390,40
<b>27</b>	<b>34</b>	<b>PAISAGISMO E FECHAMENTOS</b>						
27.1	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	0%	m³	4,55	149,63	167,03	850,98
27.2	34.01.020	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO	0%	m²	42,26	1,31	1,63	68,88
27.3	34.02.100	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	0%	m²	68,70	10,88	13,60	934,32
27.4	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	27,00	40,13	50,16	1.354,32
27.5	34.03.120	ARBUSTO MORÊIA - H= 0,50 M	0%	un	15,00	29,53	38,91	553,65
27.6	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	2,00	29,95	37,43	74,86
27.7	34.04.130	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ AMARELO - H= 2,00 M	0%	un	2,00	69,11	111,38	222,76
27.8	34.03.150	ARBUSTO CURCULIGO - H= 0,60 A 0,80 M	0%	un	13,00	41,88	52,35	680,55
27.9	34.05.290	PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, MALHA 55 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA	0%	m²	12,00	1.774,24	2.217,80	26.613,60
								31.353,92
<b>28</b>	<b>37</b>	<b>QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>						
28.1	37.01.160	QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM	100%	un	1,00	500,24	625,30	625,30
28.2	37.03.240	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 58 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES	100%	un	4,00	1.011,14	1.263,92	5.055,68
28.3	37.10.010	BARRAMENTO DE COBRE NU	100%	kg	10,00	93,80	117,25	1.172,50
28.4	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	100%	un	24,00	95,67	119,83	2.875,92
28.5	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	100%	un	8,00	129,47	161,83	1.294,64
28.6	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	100%	un	24,00	129,52	161,90	3.885,60
28.7	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	100%	un	6,00	148,28	185,35	1.112,10
28.8	37.14.440	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM PROLONGADOR E PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-2-400 A - SEM FUSÍVEIS	100%	un	2,00	3.487,94	4.359,92	8.719,84
28.9	37.17.070	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS	100%	un	20,00	181,67	227,08	4.541,60
28.10	37.24.042	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1	100%	un	4,00	560,04	700,05	2.800,20
								32.083,38
<b>29</b>	<b>38</b>	<b>TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA</b>						
29.1	38.19.210	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 25 MM	100%	m	980,00	12,54	15,67	15.356,60
29.2	38.19.220	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DN 32 MM	100%	m	180,00	14,27	17,83	3.209,40
								18.566,00
<b>30</b>	<b>39</b>	<b>CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA</b>						
30.1	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	72%	m	4.200,00	3,29	4,11	17.262,00
30.2	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	65%	m	660,00	5,05	6,31	4.164,60
30.3	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	93%	m	350,00	7,38	9,22	3.227,00
30.4	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	65%	m	200,00	11,16	13,95	2.790,00
30.5	39.04.070	CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM²	0%	m	10,00	28,39	35,48	354,80

-	0,00%	9.013,02	-	0,00
-	0,00%	2.012,46	-	0,00
-			R\$	0,01
-	0,00%	-	-	21.315,47
-	0,00%	-	-	54.458,63
-	0,00%	-	-	27.992,09
-	0,00%	-	-	2.624,21
-			R\$	106.390,40
-	0,00%	-	-	850,98
-	0,00%	-	-	68,88
-	0,00%	-	-	934,32
-	0,00%	-	-	1.354,32
-	0,00%	-	-	553,65
-	0,00%	-	-	74,86
-	0,00%	-	-	222,76
-	0,00%	-	-	680,55
-	0,00%	-	-	26.613,60
-			R\$	31.353,92
-	0,00%	625,30	-	-
-	0,00%	5.055,68	-	-
-	0,00%	1.172,50	-	-
-	0,00%	2.875,92	-	-
-	0,00%	1.294,64	-	-
-	0,00%	3.885,60	-	0,00
-	0,00%	1.112,10	-	-
-	0,00%	8.719,84	-	-
-	0,00%	4.541,60	-	-
-	0,00%	2.800,20	-	-
-			R\$	0,00
-	0,00%	15.356,60	-	0,00
-	0,00%	3.209,40	-	0,00
-			R\$	0,00
-	0,00%	12.503,47	-	4.758,53
396,00	2.498,76	60,00%	2.718,92	1.445,68
-	-	0,00%	2.989,59	237,42
30,00	418,50	15,00%	1.813,50	976,50
-	-	0,00%	-	354,80

Handwritten signature or mark.

30.6	39.11.090	FIO TELEFÔNICO TIPO F1-80, PARA LIGAÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS	0%	m	400,00	3,07	3,83	1.532,00
30.7	39.21.060	CABO DE COBRE FLEX. DE 16 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	78%	m	240,00	14,07	17,58	4.219,20
30.8	39.21.070	CABO DE COBRE FLEX. DE 25 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	72%	m	150,00	20,20	25,25	3.787,50
30.9	39.21.080	CABO DE COBRE FLEX. DE 35 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	60%	m	120,00	29,88	37,10	4.452,00
30.10	39.21.090	CABO DE COBRE FLEX. DE 50 MM², ISOL. 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	60%	m	180,00	40,43	50,53	9.095,40
<b>50.884,50</b>								
<b>31</b>	<b>40</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA</b>						
31.1	40.02.100	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAF. 400X400X150 MM	67%	un	6,00	135,72	169,65	1.017,90
31.2	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	67%	cj	6,00	22,60	28,25	169,50
31.3	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	90,00	18,30	22,87	2.058,30
31.4	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	50%	cj	20,00	21,59	26,98	539,60
31.5	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	33%	cj	6,00	28,12	35,15	210,90
31.6	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	51%	cj	49,00	17,94	22,42	1.098,58
31.7	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	50%	cj	4,00	25,45	31,81	127,24
31.8	40.10.106	CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A40 A - 2NA+2NF	50%	un	2,00	648,33	807,91	1.615,82
<b>6.837,84</b>								
<b>32</b>	<b>41</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>						
32.1	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	0%	un	3,00	405,79	507,23	1.521,69
32.2	41.10.430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M	0%	un	3,00	1.289,33	1.611,68	4.834,98
32.3	41.11.703	LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14160 A 17475 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 118 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W/120 W	0%	un	8,00	1.092,71	1.365,88	10.927,04
32.4	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSL., 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W	0%	un	23,00	273,88	342,35	7.874,05
32.5	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	0%	un	68,00	128,42	160,52	10.915,36
32.6	41.31.087	LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBR. COM DIFUSOR RECLUADO TRANSL. O, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1800 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 18 W	0%	un	60,00	214,05	267,58	16.053,60
<b>52.126,72</b>								
<b>33</b>	<b>43</b>	<b>APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.</b>						
33.1	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	0%	un	5,00	382,50	453,12	2.265,60
33.2	43.04.020	TORNEIRA ELÉTRICA	0%	un	2,00	182,07	227,58	455,16
33.3	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190MP/H	0%	un	1,00	359,17	448,96	448,96
33.4	43.07.300	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H	100%	cj	3,00	6.159,05	7.688,81	23.096,43
33.5	43.07.320	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H	100%	cj	1,00	10.482,48	13.078,10	13.078,10
33.6	43.07.330	AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H	100%	cj	12,00	2.718,73	3.398,41	40.780,92
<b>80.125,17</b>								
<b>34</b>	<b>44</b>	<b>APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS</b>						
34.1	44.01.050	BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 8 LITROS	40%	un	5,00	219,82	274,77	1.373,85
34.2	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	25%	un	8,00	216,41	270,51	2.164,08
34.3	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	33%	un	6,00	99,71	124,83	747,78
34.4	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	33%	un	3,00	606,20	757,75	2.273,25
34.5	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	50%	m²	13,92	590,74	738,42	10.278,80
34.6	44.03.050	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR	0%	un	10,00	69,91	87,38	873,80

			0,00%	-	1.532,00
36,00	632,88	15,00%	3.218,37	1.000,83	
		0,00%	2.734,07	1.053,43	
54,00	2.003,40	45,00%	2.667,12	1.784,88	
18,00	909,54	10,00%	5.457,24	3.638,16	
	6.463,08			<b>R\$ 16.782,22</b>	
		0,00%	678,60	339,30	
		0,00%	113,00	56,50	
		0,00%	1.029,15	1.029,15	
		0,00%	269,80	269,80	
		0,00%	70,30	140,60	
		0,00%	560,50	538,08	
		0,00%	63,62	63,62	
		0,00%	807,91	807,91	
				<b>R\$ 3.244,96</b>	
		0,00%	-	1.521,69	
		0,00%	-	4.834,98	
		0,00%	-	10.927,04	
		0,00%	-	7.874,05	
		0,00%	-	10.915,36	
		0,00%	-	16.053,60	
				<b>R\$ 52.126,72</b>	
		0,00%	-	2.265,60	
		0,00%	-	455,16	
		0,00%	-	448,96	
		0,00%	23.096,43	0,00	
		0,00%	13.078,10	-	
		0,00%	40.780,92	-	
				<b>R\$ 3.169,72</b>	
2,00	549,54	40,00%	549,54	824,31	
2,00	541,02	25,00%	541,02	1.623,06	
2,00	249,26	33,33%	249,26	498,52	
1,00	757,75	33,33%	757,75	1.515,50	
6,96	5.139,40	50,00%	5.139,40	5.139,40	
		0,00%	-	873,80	

*Handwritten signature or mark.*

34.7	44.03.100	DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS	0%	un	16,00	58,21	70,28	1.124,16
34.8	44.03.440	TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4"	0%	un	4,00	34,59	43,23	172,92
34.9	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	100%	un	6,00	159,82	199,77	1.198,82
34.10	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" OU 3/4"	69%	un	13,00	115,34	144,17	1.874,21
34.11	44.06.300	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM	50%	un	6,00	201,88	252,10	1.512,80
						23.594,07		
<b>35</b>	<b>46</b>	<b>TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.</b>						
35.1	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	180,00	22,26	27,82	5.007,60
35.2	46.01.050	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARRON, DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	150,00	40,12	50,15	7.522,50
35.3	46.02.010	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	12,00	26,52	33,15	397,80
35.4	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	60,00	34,03	42,53	2.551,80
35.5	46.02.060	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	52,89	66,11	7.933,20
35.6	46.08.006	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	6,00	88,85	111,06	668,36
35.7	46.08.010	TUBO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	38,00	99,27	124,08	4.466,88
35.8	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	80%	m	120,00	56,56	70,70	8.484,00
						37.030,14		
<b>36</b>	<b>47</b>	<b>VALVULAS E APARELHOS DE MEDICAO E CONTROLE PARA LIQUIDOS E GASES</b>						
36.1	47.01.050	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"	0%	un	4,00	106,87	133,58	534,32
36.2	47.01.210	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	0%	un	4,00	190,80	238,50	954,00
36.3	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	38%	un	16,00	80,13	100,16	1.602,56
36.4	47.02.110	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	0%	un	8,00	78,61	95,76	574,56
						3.665,44		
<b>37</b>	<b>48</b>	<b>RESERVATORIO E TANQUE PARA LIQUIDOS E GASES</b>						
37.1	48.02.206	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	33%	un	3,00	2.493,22	3.116,52	9.349,56
37.2	48.05.020	TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"	0%	un	3,00	95,12	118,90	356,70
						9.706,26		
<b>38</b>	<b>49</b>	<b>CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO</b>						
38.1	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	65%	un	26,00	82,53	103,16	2.682,16
38.2	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	90%	un	20,00	229,17	286,46	5.729,20
38.3	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 L	0%	un	2,00	354,29	442,86	885,72
38.4	49.06.010	GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4"	0%	un	10,00	12,94	16,17	161,70
						9.458,78		
<b>39</b>	<b>54</b>	<b>PAVIMENTACAO E PASSEIO</b>						
39.1	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	22%	m²	511,00	3,08	3,85	1.967,35
39.2	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	7%	m²	76,65	174,79	218,48	16.746,49
39.3	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	0%	m²	511,00	19,35	24,18	12.355,98

	-	0,00%	-	1.124,16
	-	0,00%	-	172,92
6,00	1.198,62	100,00%	1.198,62	-
9,00	1.297,53	69,23%	1.297,53	576,68
3,00	756,30	50,00%	756,30	756,30
	10.489,42			R\$ 13.104,65
	-	0,00%	4.006,08	1.001,52
	-	0,00%	6.018,00	1.504,50
	-	0,00%	318,24	79,56
	-	0,00%	2.041,44	510,36
	-	0,00%	6.346,56	1.586,64
	-	0,00%	533,09	133,27
	-	0,00%	3.573,50	893,38
	-	0,00%	6.787,20	1.696,80
	-			R\$ 7.406,03
	-	0,00%	-	534,32
	-	0,00%	-	954,00
	-	0,00%	600,96	1.001,60
	-	0,00%	-	574,56
	-			R\$ 3.064,48
	-	0,00%	3.116,52	6.233,04
	-	0,00%	-	356,70
	-			R\$ 6.589,74
	-	0,00%	1.753,72	928,44
	-	0,00%	5.156,28	572,92
	-	0,00%	-	885,72
	-	0,00%	-	161,70
	-			R\$ 2.548,78
	-	0,00%	438,63	1.528,72
	-	0,00%	1.244,57	15.501,92
	-	0,00%	-	12.355,98

M

39.4	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONG. 35 MPa, ESPESURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJE EM AREIA	0%	m²	511,00	83,50	104,37	53.333,07
								84.402,89
<b>TOTAL</b>							<b>2.326.081,38</b>	

				53.333,07
	-	0,00%	-	
	-			R\$ 82.719,69

TOTAL GERAL 15ª MEDIÇÃO				123.380,08
-------------------------	--	--	--	------------

% MEDIDO				5,30%
----------	--	--	--	-------

ACUMULADO				1.764.375,29
-----------	--	--	--	--------------

SALDO REMANESCENTE				R\$ 561.706,08
--------------------	--	--	--	----------------

Monteiro Lobato, 10 de abril de 2025



Documento assinado digitalmente  
**LUIS GUSTAVO DE BARROS**  
 Data: 30/04/2025 13:09:56-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Luís Gustavo de Barros  
 Responsável Técnico  
 CREA 5062695430

**RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA**  
 Engenheiro Civil - Crea: 5070225050  
 Secretário de Obras



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	31/03/2025		
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo	
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva <input type="checkbox"/> Com chuva <input type="checkbox"/> Improdutivo	
<b>Observações:</b>			

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REATERRO DO CORREDOR EXTERNO
2	ALVENARIA DA CAIXA DE ESGOTO DO PRÉDIO EXISTENTE
3	MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DO PRÉDIO EXISTENTE
4	EMBOÇO COM ARGAMASSA BARITADA NO RAIOS X
5	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
6	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
7	FECHAMENTO DE ALVENARIA
8	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA NA PLATIBANDA DO TELHADO
9	ASSENTAMENTO DE BLOCO NO FECHAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA
10	REQUADRO EXTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
INÍCIO:	10/11/2023	TERMINO	10/08/2024	
DATA:	03/03/2025			
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
Observações:				

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA COM ALVENARIA NO 1º PAV 3,36M <sup>2</sup>
2	CHAPISCO NO 2ºPAV 87,58M <sup>2</sup>
3	DEMOLIÇÃO PARA ABERTURA DE PORTA NO 1º PAV
4	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL
5	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL
6	MONTAGEM DE HIDRÁULICA ÁGUA FRIA E ESGOTO INTERNO NO 1º PAV
7	REQUADRO NO VÃO DE PORTA NO 1º PAV
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO		ANDAIME	32	
ENCARREGADO		ROMPEDOR	0	
PEDREIRO		BETONEIRA	1	
AJUDANTE		COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO		SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
TOTAL	0	TOTAL	53	



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	28/03/2025		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	REATERRO DO CORREDOR EXTERNO
2	MONTAGEM DE FORMA E CONCRETAGEM DA CANALETA DE ÁGUA PLUVIAL
3	MONTAGEM DAS FORMAS E CONCRETAGEM DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL
4	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV
5	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA
6	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA NA PLATIBANDA DO TELHADO
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	5	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	





## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	25/03/2025			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	ESCAVAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA RAMPA DO CORREDOR EXTERNO			
2	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL			
3	REGULARIZAÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL			
4	EMBOÇO EXTERNO DO 1º PAV			
5	CONTRAPISO NA ÁREA DA CAIXA D'ÁGUA			
6	EMBOÇO NA ÁREA DA ESCADA			
7	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DO 2º PAV			
8	EMBOÇO NO 2º PAV			
9	REQUADRO EXTERNO DAS JANELAS DO 1º PAV			
10	EMBOÇO NA ÁREA DOS DEPÓSITO DE RESÍDUOS BIOLÓGICO E QUÍMICOS			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>PESSOAL</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>
<b>FUNÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MODELO</b>	<b>QUANT.</b>	
ENGENHEIRA	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	5	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	













### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	18/03/2025		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA
4	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2ºPAV
5	EMBOÇO NO 2º PAV
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	17/03/2025			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA O SEGUNDO ANDAR
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV
6	CONTRAPISO NO 1ºPAV
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA**

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	14/03/2025		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DO CABO NÚ DE COBRE DO SPDA, INSTALAÇÃO DE HASTE E REATERRO
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA,
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO SEGUNDO PAVIMENTO
6	MOBILIZAÇÃO DOS BLOCOS PARA SEGUNDA LAJE
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA 80,55M <sup>2</sup>
8	EMBOÇO DO 2º PAV
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	13/03/2025		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	PREPARAÇÃO DO SOLO PARA CONCRETAGEM DO CORREDOR EXTERNO
2	ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DO CABO NÚ DE COBRE DO SPDA, INSTALAÇÃO DE HASTE E REATERRO
3	MUDANÇAS DOS SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA,
4	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO/ INSTALAÇÃO DE CX DE LUZ/ MUDANÇA DE PONTO DE HIDRÁULICA E ESGOTO)
5	MONTAGEM DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E HIDRÁULICA DO 2º PAV
6	FURACÃO PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE AÇO DA ESTRUTURA DA PLATIBANDA
7	ASSENTAMENTO DA ALVENARIA DA PLATIBANDA 71,51M <sup>2</sup>
8	EMBOÇO DO 2º PAV
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	9	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	12/03/2025		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES	
1	EMBOÇO 58,98M <sup>2</sup>
2	CHAPISCO 31,04M <sup>2</sup>
3	DESFORMA DAS VIGAS DO 2º PAV
4	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
5	REATERRO DAS VALAS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
6	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA
7	MONTAGEM DO ESGOTO DO 2º PAV
8	MUDANÇAS SOLICITADAS PELO CLIENTE (CAIXAS DE TOMADAS, PAREDE, HIDRÁULICA E ESGOTO)
9	ACABAMENTO INTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	9	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	

Luis Gustavo de Barros - Eng. Civil  
CREA - 5062695430

ENGENHEIRO FISCAL



## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	11/03/2025			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	EMBOÇO 36,35M <sup>2</sup>
2	CHAPISCO 29,44M <sup>2</sup>
3	DESFORMA DAS VIGAS DO 2º PAV
4	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
5	REATERRO DAS VALAS DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
6	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA
7	MONTAGEM DO ESGOTO DO 2º PAV
8	MUDANÇAS SOLICITADAS PELO CLIENTE (CAIXAS DE TOMADAS, PAREDE, HIDRÁULICA E ESGOTO)
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	8	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16	
AJUDANTE DE ELÉTRICA	1	SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.

**ENDEREÇO:** RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO

**INÍCIO:** 10/11/2023      **TERMINO:** 10/08/2024

**DATA:** 10/03/2025

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS	MANHÃ	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo

Observações:

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES

1	DESMONTAGEM DAS ESCORAS DO 2º PAV
2	DESMONTAGEM DAS FORMAS DO 2º PAV
3	PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
4	ESCAVAÇÃO E PASSAGEM DE CABO NÚ DE COBRE DO SPDA
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
ELETRICISTA	1	PISO ANDAIME	16	
AJUDANTE DE ELÉTRICA	1	SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	07/03/2025		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	CHAPISCO NO 2º PAV 137,52M²
2	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
3	ACABAMENTO INTERNO NAS JANELAS DO 1º PAV
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	7	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO		
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024
<b>DATA:</b>	06/03/2025		

<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES**

1	CHAPISCO NO 2º PAV 132,06M <sup>2</sup>
2	ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL
3	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 6,28M <sup>2</sup>
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PESSOAL		EQUIPAMENTOS		OBSERVAÇÕES:
FUNÇÃO	QUANT.	MODELO	QUANT.	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	1	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	6	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	4	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	





## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DR.			
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA ANTONIO ALVES MAGALHÃES, 12250.000 - MONTEIRO LOBATO			
<b>INÍCIO:</b>	10/11/2023	<b>TERMINO</b>	10/08/2024	
<b>DATA:</b>	04/03/2025			
<b>CONDIÇÕES CLIMÁTICAS</b>	<b>MANHÃ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
	<b>TARDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sem chuva	<input type="checkbox"/> Com chuva	<input type="checkbox"/> Improdutivo
<b>Observações:</b>				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS / OCORRÊNCIAS / RECLAMAÇÕES / VISITAS / OBSERVAÇÕES</b>				
1	CHAPISCO NO 2º PAV 90,26 M²			
2	ALVENARIA DAS CAIXAS DE ÁGUA PLUVIAL			
3	PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL			
4	REATERRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL			
5	REVESTIMENTO CERÂMICO DO 1º PAV 8,33M²			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>PESSOAL</b>		<b>EQUIPAMENTOS</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>
<b>FUNÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>	<b>MODELO</b>	<b>QUANT.</b>	
ENGENHEIRO	0	ANDAIME	32	
ENCARREGADO	0	ROMPEDOR	0	
PEDREIRO	3	BETONEIRA	1	
AJUDANTE	3	COMPACTADOR	0	
CARPINTEIRO	1	SERRA CIRCULAR	1	
		PISO ANDAIME	16	
		SERRA MÁRMORE	1	
		ESMERILHADEIRA	1	
		FURADEIRA	1	
		FURADEIRA DE IMPACTO	0	
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	







# ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS - EIRELI

CNPJ.: nº 14.563.488/0001-70 -I.E. nº 332.225.640.110

Rua Milton José Nunes Fernandes, 2217,  
Bairro Polo Industrial II, Guaratinguetá – SP



# PREFEITURA DE MONTEIRO LOBATO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**  
EXECUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO CENTRO DE  
SAÚDE DR. JOÃO AURICCHIO

**DATA:** 10/04/2025

**RELATÓRIO Nº:**  
15/2023

**CONFERIDO:**

Fiscal do contrato

**AUTOR:**

**CONTRATO:** 097/2023

Lúis Gustavo de Barros – Eng. Civil

CREA: SP-5062695430

<p>DATA: 10/04/2025</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO</b></p>	<p align="center"><b>FOLHA: 2 / 8</b></p>
-----------------------------	--	---

## 1. INTRODUÇÃO

### 1.1. OBJETIVO

Realizar a construção de um novo centro de saúde Dr. João Auricchio, afim de conferir serviços realizados nas áreas de intervenção para realização de medição.

### 1.2. LOCALIZAÇÃO

A obra está localizada Rua Antônio Alves Magalhães, 20, Centro, CEP 12250-000, Monteiro Lobato – SP

## 2. FOTOS



Foto 1: Chapisco e taliscas das paredes externas

<p><b>Autor:</b></p> <p align="center"><b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430</p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p>
---	---

<p>DATA: 10/04/2025</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO</b></p>	<p align="right">FOLHA: 3 / 8</p>
-----------------------------	--	-----------------------------------



Foto 2: Reboco das paredes externas

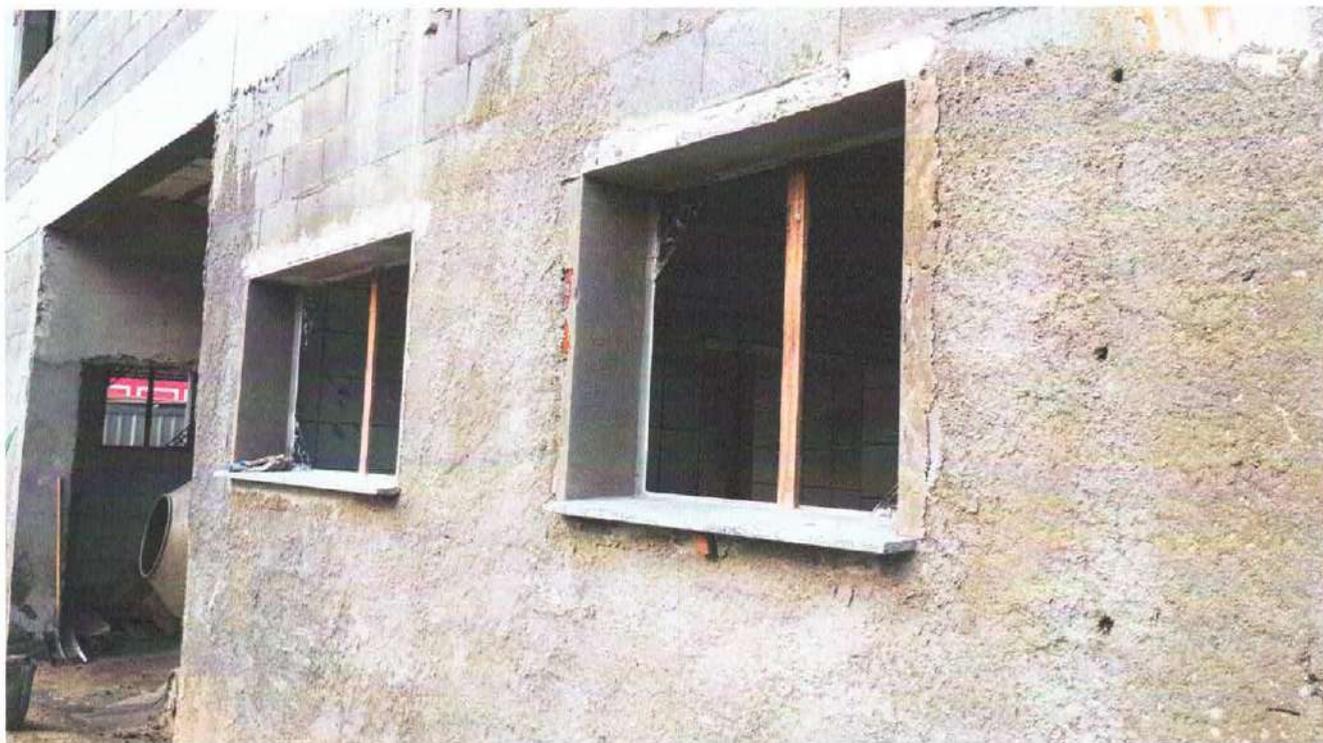


Foto 3: Assentamento de peitoril, requadro das janelas do primeiro pavimento

<p><b>Autor:</b></p> <p align="center"><b>Luis Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430</p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p align="center">FISCAL DO CONTRATO</p>
---	---

DATA:  
10/04/2025

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

FOLHA: 4 / 8

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO**



Foto 4: Contrapiso para a instalação dos pisos porcelanato



Foto 5: Assentamento de revestimento cerâmico

**Autor:**

**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

**Conferido:**

FISCAL DO CONTRATO

<p>DATA: 10/04/2025</p>	<p>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO</b></p>	<p>FOLHA: 5 / 8</p>
-----------------------------	---	---------------------



Foto 6: Pisos porcelanato



Foto 7: Bacias sanitárias, tanque e pias

<p><b>Autor:</b></p> <p><b>Luís Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430</p>	<p><b>Conferido:</b></p> <p>FISCAL DO CONTRATO</p>
--	--

DATA:  
10/04/2025

**CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL,  
BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL**

**FOLHA: 6 / 8**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO**



Foto 8: Instalação de quadro e disjuntores.



Foto 9: Instalação hidráulicas e elétricas.

**Autor:**

**Lúis Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

**Conferido:**

**FISCAL DO CONTRATO**

DATA: 10/04/2025	<b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>  <b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO</b>	<b>FOLHA: 7 / 8</b>
---------------------	---	---------------------



Foto 10: Instalação de infraestruturas elétricas.

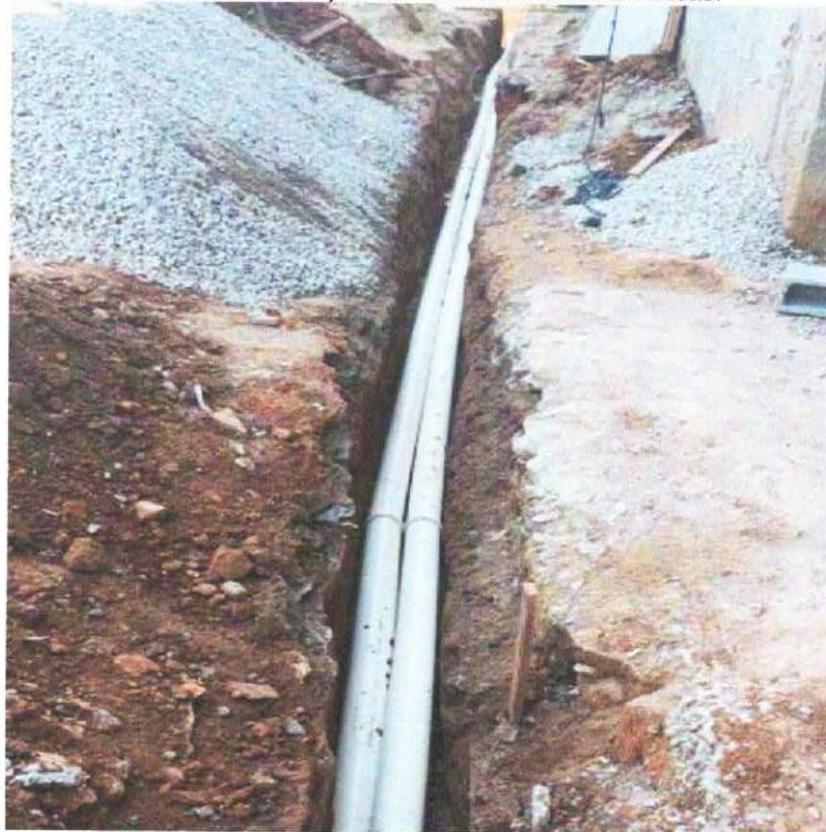


Foto 11: Instalação de infraestruturas hidráulicas.

<b>Autor:</b>  <b>Luis Gustavo de Barros</b> CREA: 5062695430	<b>Conferido:</b>  FISCAL DO CONTRATO
--	---

<p>DATA: 10/04/2025</p>	<p align="center"><b>CONSTRUÇÃO DO NOVO REFEITÓRIO DO PAÇO MUNICIPAL, BANHEIRO ACESSÍVEL E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – 15ª MEDIÇÃO</b></p>	<p align="right">FOLHA: 8 / 8</p>
-----------------------------	--	-----------------------------------



Foto 12: Instalação de piso cerâmico.



Foto 13: Instalação de piso cerâmico.

Documento assinado digitalmente



**LUIS GUSTAVO DE BARROS**  
Data: 30/04/2025 13:09:56-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Autor:

**Luís Gustavo de Barros**  
CREA: 5062695430

Conferido:

FISCAL DO CONTRATO

**RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA**  
Engenheiro Civil - Crea: 5070225050  
Secretário de Obras



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA**  
**CNPJ: 14.563.488/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:08:48 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **C718.26BB.E418.4796**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2025/000004119313

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CRIMINAIS** contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº **14.563.488/0001-70**.


Certidão emitida em: 10/04/2025, às 11:55:42 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **43273400F1F5161D**.
- b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- e) Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- f) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.
- g) **As execuções criminais constarão apenas na certidão do 1º grau.**

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Certidão nº: 20250406/2025

Expedição: 09/04/2025, às 15:32:10

Validade: 06/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.563.488/0001-70, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS**

**CERTIDÃO Nº: 339284**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/04/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS**, CNPJ: 14.563.488/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de abril de 2025.

**PEDIDO Nº:**

0085572049





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66819551

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/04/2025 15:21:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 14.563.488

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 66819551

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/04/2025 15:21:49

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040949093-64  
Data e hora da emissão 28/04/2025 09:32:35  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS  
LTDA

**CNPJ:** 14.563.488/0001-70

**CERTIDÃO EMITIDA** em 10/04/2025, às 13:19:05

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 07/04/2025, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **Q1NobiZAVLaOFmM**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 07/04/2025. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 07/04/2025 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).



## CERTIDÃO DE AÇÃO TRABALHISTA EM TRAMITAÇÃO PROCESSOS FÍSICOS

### Dados Pesquisados:

CNPJ: 14.563.488/0001-70

Nome: ADM FABRICAÇÃO

Certidão nº 248248 / 2025

**CERTIFICA-SE** que em pesquisa aos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento e Informações Processuais de Processos Físicos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até 09/04/2025, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural ou jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

Certifica-se, ainda, que esta pesquisa abrange apenas os processos físicos, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais eletrônicos (PJe).

### IMPORTANTE

- a. A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pelo recebedor em <https://www.trtsp.jus.br/valida-certidao> em até 90 (noventa) dias após a sua expedição;
- b. A informação do nº do CPF/CNPJ e do nome indicado acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão;



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA FEDERAL  
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO  
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL  
Abrangência - Tribunal Regional Federal da 3ª Região  
N. 2025/000004119221

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **ADM FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA** ou CNPJ nº 14.563.488/0001-70.

Certidão emitida em: 10/04/2025, às 11:54:06 (data e hora de Brasília).

**Observações:**

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **A13F1788B9829C1C**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJE – Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/capital e jurisdição nos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Serviço de Dívida Ativa  
Rua Aluísio José de Castro, nº 147 - Chácaras Selles – Guaratinguetá - SP - 12.505-470

Certidão Fiscal **NEGATIVA** de débitos de Qualquer Natureza

Certidão nº 248/2025  
Processo nº 3033//2025

A Fazenda do Município de Guaratinguetá, através de seu órgão competente, “**C E R T I F I C A**” a pedido da pessoa interessada, que de acordo com os assentamentos existentes nas seções de Cadastro Imobiliário, Cadastro Fiscal, Fiscalização Tributária e Dívida Ativa, **não consta débitos** referente a IPTU, Contribuição de Melhoria e referidas taxas, bem como Taxa de Licença de Funcionamento e I.S.S.Q.N., em nome de **ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA**, situada (o) Rua Milton José Nunes Fernandes, nº 2217 - Polo Industrial II - Guaratinguetá (SP), inscrito no **CNPJ 14.563.488/0001-70**, com inscrição municipal **13-5546/01/ISS**. Sendo que não consta imóvel cadastrado no município no CNPJ da firma acima citada

**CERTIFICA-SE** ainda que “**NADA DEVE**”, ficando ressalvado o direito da Fazenda Municipal de Guaratinguetá cobrar qualquer importância que lhe for devida, posteriormente verificada.

É o que consta nos registros e livros existentes e, por ser verdade, firmamos a presente.

Certidão válida pelo período de **90 dias**.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.563.488/0001-70  
**Razão Social:** A DE M MENDES MANUTENCAO EIRELI  
**Endereço:** ROD ARISTEU VIEIRA VILELA 18 / ATERRADO / LORENA / SP / 12610-490

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/04/2025 a 15/05/2025

**Certificação Número:** 2025041604121877731544

Informação obtida em 16/04/2025 08:23:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**PREFEITURA MUN. DE MONTEIRO LOBATO**PÇ DEP. A. S. CUNHA BUENO, 180  
46643482/0001-07

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

340 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>3</b>	FICHA: 8002	DATA: 05/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OBRA TOMADA	230852/23	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2025
------------------------	-----------	------------	------------------------

NOME: ADM FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	14.563.488/0001-70	CÓDIGO: 10786
ENDEREÇO: R MILTON JOSE NUNES FERNANDES	GUARATINGUETA	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	PELA DESPESA EMPENHADA COM OBRA NO CENTRO DE SAÚDE.	Liquido <b>85.597,20</b> Desconto <b>4.505,12</b>
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
00 Recursos Ordinários		
800 TRANSF. UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL IND		
000 TRANSF. UNIÃO DEC. EMENDA PARL IND-FINAL		
<b>EX</b>	<b>SOMA</b>	<b>90.102,32</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 04 4.4.90.51.91 10.301.0012.1009.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OBRAS E INSTALAÇÕES Investimentos na Saúde

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
616.360,74	616.360,74	90.102,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**90.102,32**

noventa mil, cento e dois reais e trinta e dois centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

8	1114.51.1.1.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	4.505,12	
			<b>TOTAL DE DESCONTOS 4.505,12</b>

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/05/2025

*Raissa Marcos*

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

Carolina de Sousa Silva - Secretária de Finanças

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA                      Marcela Oliveira de Carvalho - ContadoraDATA                      Edmar José de Araujo - Prefeito Mun.

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_



## Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651  
08/04/2025 13:11:22

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	13.961,95 D	
				15/01 16:56 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
15/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	265.277,11 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279.239,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651  
08/04/2025 13:19:28

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	747.885,63			566.245,594796		
15/01/2025	RESGATE	279.239,06			210.717,121398	1,325184485	355.528,473398
	Aplicação 03/10/2023	279.239,06			210.717,121398		
31/01/2025	SALDO ATUAL	473.043,04			355.528,473398		355.528,473398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747.885,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	279.239,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.396,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.396,47
SALDO ATUAL =	473.043,04

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651  
08/04/2025 13:11:29

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	12.350,97 D	
				14/02 15:39 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
14/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	234.668,39 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.019,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651  
08/04/2025 13:19:41

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	473.043,04			355.528,473398		
14/02/2025	RESGATE	247.019,36			184.969,041297	1,335463266	170.559,432101
	Aplicação 03/10/2023	247.019,36			184.969,041297		
28/02/2025	SALDO ATUAL	228.613,84			170.559,432101		170.559,432101

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473.043,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247.019,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.590,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.590,16
SALDO ATUAL =	228.613,84

### Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

### Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310813031006651  
08/04/2025 13:11:37

### Cliente

---

Agência 6739-3  
Conta 4068-1  
Período solicitado 03 / 2025

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310813031006651  
08/04/2025 13:19:57

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência MARCO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	228.613,84			170.559,432101		
31/03/2025	SALDO ATUAL	230.271,72			170.559,432101		170.559,432101

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.613,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.657,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.657,88
SALDO ATUAL =	230.271,72

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

### Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310816348746721  
08/05/2025 16:41:16

### Cliente

---

Agência 6739-3  
Conta 4068-1  
Período solicitado 04 / 2025

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310816348746721  
08/05/2025 16:42:13

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência ABRIL/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	230.271,72			170.559,432101		
30/04/2025	SALDO ATUAL	232.132,55			170.559,432101		170.559,432101

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.271,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.860,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.860,83
SALDO ATUAL =	232.132,55

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JE668466 EDMAR JOSE DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3380916425160841  
09/06/2025 16:46:35

### Cliente - Conta atual

Agência 6739-3  
Conta corrente 4068-1TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		6739	99015	470 Transferência enviada	556.739.000.358.973	4.505,12 D	
				06/05 14:52 PREF MUN M LOBATO *FUNDO			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	85.597,20 D	
				341 7983 014563488000170 ADM FABRICACA			
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.102,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380916425160841  
09/06/2025 16:47:30

### Cliente

Agência 6739-3  
Conta 4068-1 TRANSF ESPECIAIS-3531704  
Mês/ano referência MAIO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	232.132,55			170.559,432101		
06/05/2025	RESGATE	90.102,32			66.122,798272	1,362651345	104.436,633829
	Aplicação 03/10/2023	90.102,32			66.122,798272		
30/05/2025	SALDO ATUAL	143.386,99			104.436,633829		104.436,633829

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.132,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.102,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.356,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.356,76
SALDO ATUAL =	143.386,99

### Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

### Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI599313 CAROLINA DE SOUSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
